

札幌市監査委員 藤 江 正 祥
同 窪 田 もとむ
同 武 市 憲 一
同 本 郷 俊 史

定期監査等の結果に関する報告の提出について

地方自治法第199条第1項、第2項、第4項及び第7項に基づき、下記の部等を対象として監査を行ったので、同条第9項の規定により、その監査の結果に関する報告を別紙のとおり提出します。

記

監査の対象

1 定期監査等（事務監査）

財政局 税政部 中央市税事務所
市民文化局 市民生活部
文化局
保健福祉局 総務部
監査指導室
保健所
建設局 総務部
みどりの推進部
教育委員会 中央図書館
市立学校

2 定期監査等（工事監査）

下水道河川局 事業推進部(河川担当部以外)
都市局 市街地整備部
豊平区 土木部
清田区 土木部
南区 土木部

3 出資団体等監査

札幌市森林組合
公益財団法人札幌市芸術文化財団
公益財団法人札幌市公園緑化協会
株式会社札幌振興公社
公益財団法人第8回札幌アジア冬季競技大会組織委員会
公益財団法人パシフィック・ミュージック・フェスティバル組織委員会
公園緑化協会・中島公園コンソーシアム
公園緑化協会・川下公園コンソーシアム
月寒公園パークライフコンソーシアム
公園緑化協会・ていねグリーンコンソーシアム
札幌駅周辺自転車等駐車場利用推進グループ
株式会社コンサドーレ
公益財団法人札幌交響楽団
さっぽろ雪まつり実行委員会
公益財団法人北海道科学技術総合振興センター

定 期 監 查

(工事監査)

平成 29 年度定期監査（工事）報告書

監査の範囲

平成28年4月1日から平成29年3月31日までに完成した土木、建築、設備工事等及び平成29年4月1日から平成29年9月30日までに契約した土木、建築、設備工事等並びに平成28年10月1日から平成29年9月30日までに完了した道路維持除雪業務に係る工事設計、工事監理及び工事事務（必要に応じて他の年度の執行分も対象とする。）

監査の方法

前記監査範囲のうちから、別表に掲げる工事等を抽出し、関係法令等に基づき適正かつ適切に執行されているかを主眼とし、経済性、効率性、有効性の観点にも留意しつつ、関係書類や実地の検査及び関係職員からの説明聴取により実施した。

また、特に「工事の品質管理」を取り上げ、重点的な監査を行った。

監査の期間

平成29年7月7日から同年12月14日まで

監査の結果

おおむね良好と認められたが、対象となった工事のうち、一部について注意、改善及び検討を要する事項がみられた。

第1 重点項目「工事の品質管理」に係る指摘事項

1 無収縮モルタルの品質管理を確実にすべきもの

【下水道河川局事業推進部】

「下水道管きょ工事仕様書」では、マンホール鉄蓋調整部又は上絞部ブロックの間に使用する無収縮モルタルの配合が定められており、これによりがたい場合は同等以上の品質、効果のある配合をもって工事監督員の承諾を受けることと定められている。

しかし、監査した土木工事のマンホール鉄蓋調整部に用いる無収縮モルタル(*)の施工において、配合が確認できない事例がみられた。

発注者は、工事に係る仕様書に示された品質管理を行うように受注者を指導し、工事における品質確保が適正に行われるよう努められたい。

(*) 無収縮モルタル：施工後、乾燥時に体積が減少しないモルタル

(*) マンホールの各部分の名称については図1参照

2 主任技術者の品質管理に係る職務を指導すべきもの

【下水道河川局事業推進部】

建設業法では、主任技術者(*)は、当該建設工事の施工計画の作成、工程管理、品質管理その他の技術上の管理を誠実に行わなければならないと定められている。

しかし、監査した工事において、施工管理記録及び試験成績書を主任技術者が確認した記録のない事例がみられた。

発注者は、主任技術者が品質管理に係る職務を適切に行うよう指導し、工事の品質管理の向上に努められたい。

(*) 主任技術者：建設業者が、元請下請、契約金額に関係なく、全ての工事現場に必ず配置しなければならない技術者。なお、発注者から直接工事を請け負い、かつ4,000万円以上（建築一式工事の場合は6,000万円以上）を下請契約して施工する建設業者は、「主任技術者」に代えて「監理技術者」を配置しなければならない。

第2 指摘事項

1 工事設計

(1) 適正な設計書の作成と、チェック等を確実にすべきもの

【下水道河川局事業推進部、都市局市街地整備部】

監査した工事等の設計、積算において、以下のとおり関係基準等の確認不足及び検算、審査等が不十分なことに起因する適正を欠いた事例がみられた。

工事等の設計に当たっては、積算基準や要領等の周知を徹底し、研修等により担当職員の設計技術の向上を図るとともに、検算・審査・決裁等の各段階においてチェック機能を強化し、適正な設計となるよう組織を挙げて徹底されたい。

【下水道河川局事業推進部】

ア 「札幌市土木工事積算要領及び資料」では、設計変更時において新たに追加した工種の単価適用月日については、措置必要事項報告書(*)の起案時点とすることと定めているが、単価適用月を当初設計伺いの起案日としているもの

【都市局市街地整備部】

イ 「国土交通省 土木工事標準積算基準（共通編）」では、施工地域・工

事場所を考慮した共通仮設費率(*)及び現場管理費率(*)の補正を行うこととされており、施工地域・工事場所区分が2つ以上となる場合、補正值の大きい方を適用することと定められているが、補正值の小さい地方部を選択しているもの

【下水道河川局事業推進部】

ウ 「札幌市公共建築機械設備工事積算要領」等では、前払金(*)支出を行わない場合、一般管理費等率(*)を補正することを規定しているが、補正していなかったもの

【下水道河川局事業推進部】

エ 工事価格積算時に参考とした見積書が紛失していたもの

(*) 措置必要事項報告書：発注者（工事監督員）は、工事の施行に当たり、設計図書と実地とを調査し疑義が生じたとき、または工程、工法、工期等を変更する必要があると認められるとき等に、直ちにその事実を記載した措置必要事項報告書により上司に報告し、その措置について指示を受けなければならない。

(*) 共通仮設費率、現場管理費率、一般管理費等率：図2参照

(*) 前払金：工事等の着手に際して、必要な労働力、資材等を確保するために多額の資金が必要となることから、一定の設計金額及び工期を超える場合に契約の相手方から請求があったとき発注者から受注者へ支払うもの

2 工事監理

(1) 車両系建設機械の作業を安全に実施すべきもの

【都市局市街地整備部】

労働安全衛生規則では、事業者は車両系建設機械(*)を用いて作業を行なうときは運転中の車両系建設機械に接触することにより労働者に危険が生ずるおそれのある箇所に、労働者を立ち入らせてはならない。ただし、誘導者を配置し、その者に当該車両系建設機械を誘導させるときは、この限りではないと定められている。

しかし、監査した土木工事において、誘導者を配置せずに、車両系建設機械に接触するおそれのある箇所に労働者を配置している事例がみられた。

工事の施工に当たっては、受注者に安全管理の徹底を図るとともに、労働安全に係る法令等の順守を強く指導し、適正な施工に努められたい。

(*) 車両系建設機械：動力を用いて、かつ、不特定の場所に自走できる建設機械（パワーショベル、ブルドーザー等）

(*) 車両系の不適切な作業の事例については図3参照

(2) 道路維持除雪業務の写真を確認すべきもの

【豊平区土木部】

「札幌市道路維持除雪業務委託仕様書」では、受託者は施工管理基準の写真管理に基づき撮影し、適切な管理のもと保管し検査時に提出しなければならないと定めている。

しかし、監査した道路維持除雪業務の写真の中に、過年度の業務において撮影した写真を使用している事例がみられた。

発注者は、受託者から提出された写真が適切に撮影されているか確認し、受託者の指導を徹底されたい。

(*) 道路維持作業除雪業務の不適切な写真の事例については図4参照

(3) 工事協議内容の記録を整備すべきもの

【下水道河川局事業推進部】

「公共建築工事標準仕様書」では、監督職員の指示した事項及び協議した結果について記録を整備することと定めているが、今回監査した工事におい

て、指示等の記録が整備されていない事例がみられた。

現場において監督職員より口頭で指示等が行われた場合であっても、責任の所在を明確にするため、書面による記録を残すよう努められたい。

(4) 建設副産物の関係書類を適正に提出すべきもの

【下水道河川局事業推進部】

工事に伴い発生する建設副産物(*)については、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」等に基づき、適正な管理をしなければならないが、「札幌市下水処理施設修繕工事共通仕様書」において提出することと定めている産業廃棄物処理委託契約書（写し）が提出されていない事例がみられた。

建設副産物の処理については、関係書類の提出、提示を受け、適正な処理を確認していくことが必要であり、関係法令等に基づいた建設副産物の処理を行うように受注者の指導に努められたい。

(*) 建設副産物：建設工事に伴い副次的に得られるすべての物品をいい、建設発生土、並びにコンクリート塊、アスファルト・コンクリート塊、建設発生木材及び建設汚泥等の建設廃棄物を指す。

(5) 非飛散性アスベスト廃棄物の保管を適切にすべきもの

【下水道河川局事業推進部】

環境省「石綿含有廃棄物等処理マニュアル」では、非飛散性アスベスト(*)廃棄物の現場での保管について、他の物が混入するおそれのないように仕切りを設けるなど必要な措置を講じるよう定めている。

しかし、今回監査した工事において、非飛散性アスベスト廃棄物を入れた容器と、その他の廃棄物を入れた同種の容器が同じ場所に保管されており、区別が付きにくい事例がみられた。

発注者は、非飛散性アスベスト廃棄物の保管方法について、撤去方法等と同様に処理計画の中で事前に確認するとともに、適切な保管を行うよう受注者への指導に努められたい。

(*) 非飛散性アスベスト：アスベストとセメントやけい酸カルシウム等を一体に成形した板等のアスベスト含有建材。そのままでは飛散性はないが、建築解体等に伴って発生した廃棄物は、破砕等により表面や破断面からアスベストが飛散して、健康や環境に影響を及ぼすおそれがある。

(*) 非飛散性アスベスト廃棄物の適切な保管の事例については図5参照

第3 意見

1 コンクリートの施工管理について

【清田区土木部】

落石防護柵設置工事において設置されたコンクリート擁壁を実地確認した結果、コンクリート表面のモルタルの大部分が剥落している事例がみられた。

コンクリート擁壁の品質確保のため、コンクリート表面の適切な施工管理を受注者へ指導し、工事における品質が適正に確保されるよう要望する。

2 小額工事における支給材料の引渡しについて

【下水道河川局事業推進部】

今回監査した小額工事(*)において、支給材料の引渡しが工事書類等で確認できない事例がみられた。

工事で支給材料を引き渡す場合、「札幌市建設工事請負契約約款」では、受注者は、支給材料の引渡しを受けたときは、発注者に受領書を提出しなければならないと定めている。

一方、小額工事の場合は「札幌市小額工事請負契約約款」又は「請書」等によるが、これらには支給材料について定めがない。

しかし、小額工事といえども、支給材料の引渡しが確実に行われたことを明らかにすることは重要であり、書類等により記録を残すよう要望する。


(*) 小額工事：設計金額が250万円以下の工事

3 小額工事の事務処理について

【下水道河川局事業推進部】

今回監査した下水道施設の小額工事において、設計審査員及び工事検査員に内部規程で定める職員以外の者が指名されていた事例がみられた。


小額工事の事務処理は内部規程に基づいて適正に行われるべきであり、部内職員に周知徹底されることを要望する。

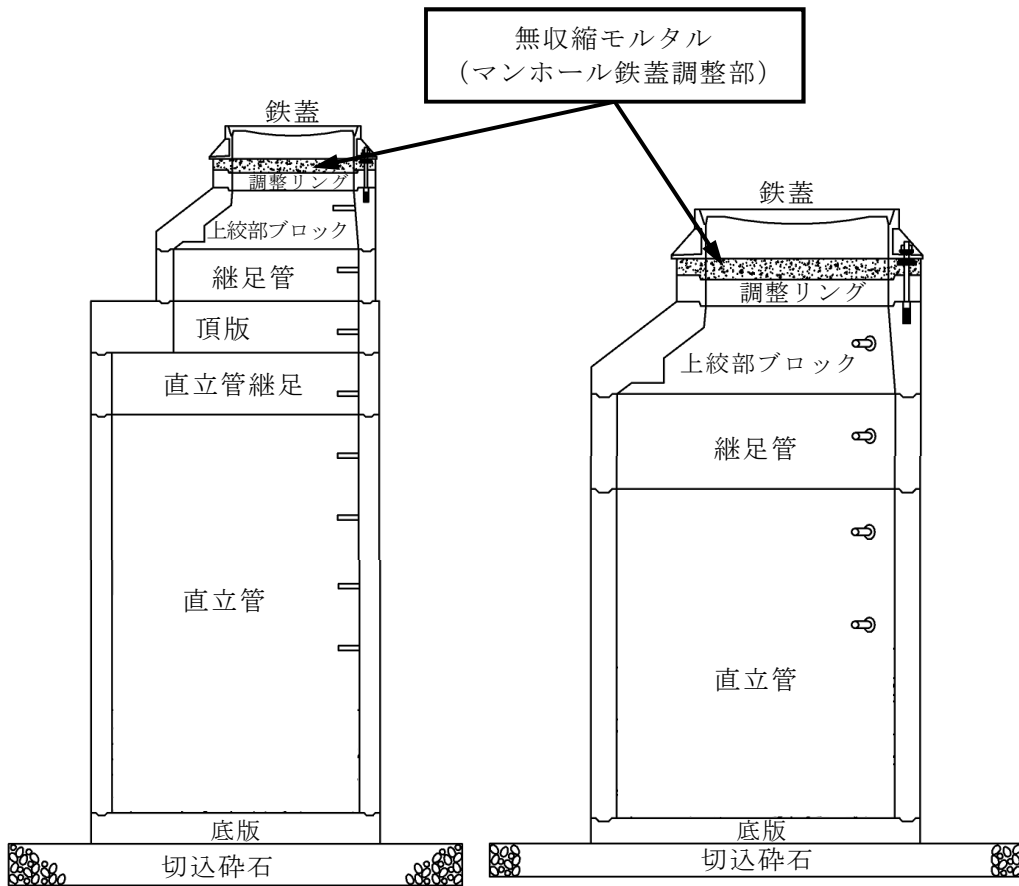

< 2, 3, 4号型 >

< 1号型 >

図1 マンホールの各部分の名称 (例：組立式マンホール)

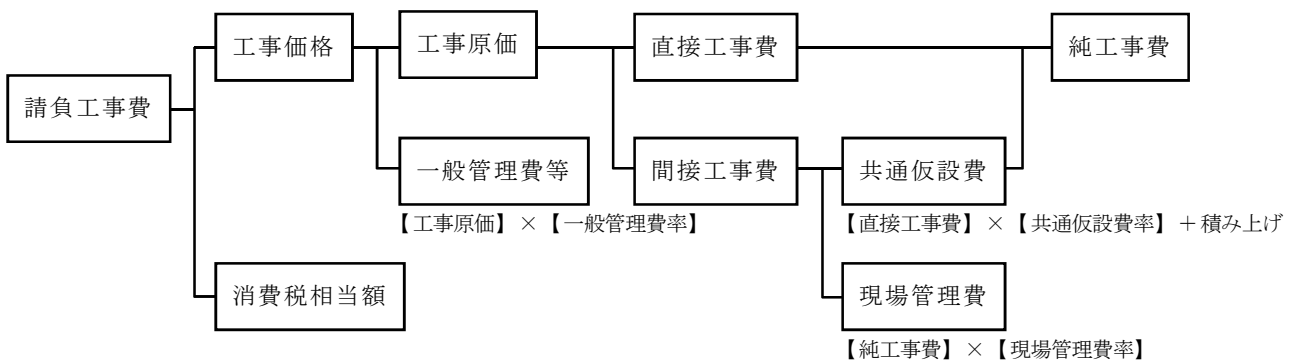

共通仮設費率：工事を行う際に必要な運搬費、準備費、安全等の共通的な経費を算出する際に用いる率
 現場管理費率：工事を行う際に必要な品質管理費、安全管理など工事監理を実施するための経費を算出する際に用いる率
 一般管理費等率：工事施工にあたる企業の継続運営に必要な費用を算出する際に用いる率

図2 工事費の構成 (例：土木工事)



図3 車両系建設機械の不適切な作業の事例



図4 道路維持作業除雪業務の不適切な写真の事例



図5 非飛散性アスベスト廃棄物の適切な保管の事例

下水道河川局 事業推進部（河川担当部以外）

別表

（土木工事）

番号	工 事（業務）名	契約金額(円)	工 期	契約方法
1	手稲区西宮の沢4条4丁目柵工事	3,014,280	28.08.15 ～ 28.10.23	一般
2	新川水再生プラザテニスコート整備修繕工事	483,840	28.04.21 ～ 28.04.28	随契
3	創成川水再生プラザ場内通路修繕工事	496,800	28.08.05 ～ 28.10.03	随契
4	茨戸東部中継ポンプ場構内舗装ほか修繕工事	259,200	28.11.01 ～ 28.12.16	随契
5	北区屯田1条2丁目下水道管路施設用地柵修繕工事	1,620,000	28.08.26 ～ 28.10.31	随契
6	清田区北野4条4丁目ほか1か所下水道管理用地柵修繕工事	1,900,800	28.09.30 ～ 28.11.28	随契
7	豊平区西岡1条3丁目下水道管理用地柵修繕工事	1,944,000	28.11.07 ～ 28.12.16	随契
8	新川水再生プラザ管廊部ほか改修工事	36,950,040	28.07.04 ～ 28.12.15	一般
9	豊平川水再生プラザ汚泥前処理施設ほか場内整備工事	72,294,120	28.06.13 ～ 29.01.25	一般
10	防災・安全交付金交付金事業 西部スラッジセンター現況測量	2,572,560	28.09.09 ～ 28.11.07	一般
11	防災・安全交付金事業 豊平川東汚泥圧送管（川北2327番地ほか）新設工事	240,153,120	27.07.28 ～ 29.03.24	一般
12	市債務負担行為 手稲処理区稲穂1条1丁目下水道新設工事	11,581,920	28.03.14 ～ 28.07.11	一般
13	市債務負担行為 新川処理区南2条西7丁目下水道新設工事	27,495,720	28.03.22 ～ 28.08.18	一般
14	市債務負担行為 手稲処理区新琴似・屯田通（新琴似9条10丁目ほか）ほか1線下水道新設工事	49,290,120	28.03.29 ～ 28.09.24	一般
15	市債務負担行為 茨戸処理区東雁来第2土地区画整理地内（東雁来13条4丁目）下水道新設工事	36,645,480	28.03.22 ～ 28.10.17	一般

番号	工 事 (業 務) 名	契約金額(円)	工 期	契約方法
16	市債務負担行為 茨戸処理区東雁来第2土地区画整理地内(東雁来10条4丁目)下水道新設工事	40,177,080	28.03.29 ～ 28.10.24	一般
17	市債務負担行為 厚別処理区厚別北地区(厚別北4条2丁目ほか)下水道新設工事	186,780,600	28.03.29 ～ 29.01.22	一般
18	市債務負担行為 厚別処理区平岡3条6丁目ほか下水道新設工事	33,173,280	28.03.14 ～ 28.08.15	一般
19	市債務負担行為 厚別処理区厚別西1条5丁目ほか下水道新設工事	43,200,000	28.03.22 ～ 28.10.27	一般
20	伏古川処理区苗穂駅連絡通(北3条東5丁目ほか)下水道新設工事	126,919,440	28.04.25 ～ 29.02.18	一般
21	豊平川処理区菊水上町4条2丁目下水道新設工事	15,003,360	28.04.18 ～ 28.07.16	一般
22	豊平川処理区国道36号(豊平3条13丁目)下水道新設工事	29,028,240	28.05.09 ～ 28.09.05	一般
23	社会資本整備総合交付金事業 茨戸処理区東雁来第2土地区画整理地内(東雁来12条3丁目)下水道新設工事	270,450,360	28.04.18 ～ 29.01.12	随契
24	防災・安全交付金事業 茨戸水再生プラザ東汚泥圧送管(篠路町拓北243番地ほか)新設工事	179,566,200	28.05.16 ～ 29.02.09	一般
25	拓北処理区篠路町拓北243番地ほか下水道新設工事	24,321,600	28.05.16 ～ 29.02.09	一般
26	防災・安全交付金事業 新川処理区南14条西18丁目ほか7線下水道新設工事	85,718,520	28.05.20 ～ 28.12.18	一般
27	防災・安全交付金事業 新川処理区南3条西3丁目地区ほか6線下水道新設工事	96,985,080	28.05.23 ～ 28.11.18	一般
28	防災・安全交付金事業 新川処理区南6条西15丁目地区ほか5線下水道新設工事	117,270,720	28.05.23 ～ 29.01.17	一般
29	防災・安全交付金事業 創成川処理区北5条東3丁目地区ほか5線下水道新設工事	98,497,080	28.05.30 ～ 28.11.25	一般
30	社会資本整備総合交付金事業 茨戸処理区東雁来第2土地区画整理地内(東雁来13条2丁目ほか)下水道新設工事	30,702,240	28.06.06 ～ 28.12.02	一般
31	防災・安全交付金事業 創成川処理区南16条西6丁目地区ほか1線下水道新設工事	76,848,480	28.06.20 ～ 29.01.15	一般

番号	工 事 (業 務) 名	契約金額(円)	工 期	契約方法
32	豊平川処理区 I-05000 (中の島2条7丁目ほか) 下水道新設工事	269,929,800	28.06.20 ～ 29.03.24	一般
33	新川処理区北2条西21丁目下水道新設工事	4,743,360	28.07.04 ～ 29.08.29	一般
34	防災・安全交付金事業 東部処理区真駒内曙町4丁目ほか8線下水道新設工事	41,864,040	28.06.27 ～ 29.01.22	一般
35	社会資本整備総合交付金事業 茨戸処理区東雁来第2土地区画整理地内(東雁来14条2丁目) 下水道新設工事	30,188,160	28.07.11 ～ 28.11.07	一般
36	防災・安全交付金事業 新川処理区北5条西29丁目地区ほか6線下水道新設工事	56,474,280	28.07.11 ～ 29.01.06	一般
37	防災・安全交付金事業 豊平川処理区豊平1条10丁目ほか2線下水道新設工事	33,597,720	28.07.11 ～ 28.11.07	一般
38	新川処理区北ノ沢1744番地ほか下水道新設工事	38,031,120	28.08.01 ～ 29.03.24	一般
39	豊平川処理区北郷4条3丁目ほか1線下水道新設工事	7,548,120	28.07.26 ～ 28.11.22	一般
40	新川処理区南沢3条2丁目下水道新設工事	16,667,640	28.07.26 ～ 28.10.23	一般
41	防災・安全交付金事業 豊平川処理区菊水9条1丁目ほか下水道新設工事	19,877,400	28.07.26 ～ 28.12.06	一般
42	手稲処理区前田2条10丁目下水道新設工事	16,176,240	28.07.26 ～ 28.10.23	一般
43	厚別処理区厚別西地区(厚別西1条4丁目ほか) 下水道新設工事	75,531,960	28.08.08 ～ 29.02.03	一般
44	厚別処理区厚別北3条5丁目下水道新設工事	91,321,560	28.08.08 ～ 29.02.03	一般
45	東部処理区澄川4条9丁目ほか1線下水道新設工事	18,029,520	28.08.15 ～ 28.12.19	一般
46	新川処理区八軒5条西10丁目ほか1線下水道新設工事	18,456,120	28.10.03 ～ 28.12.31	一般
47	厚別処理区小野幌ニュータウン第1号樋門護岸工事	33,972,480	28.10.31 ～ 29.03.27	一般

番号	工 事 (業 務) 名	契約金額(円)	工 期	契約方法
48	伏古川処理区Ⅱ-01200及びⅡ-01220 (東苗穂4条1丁目ほか) 地質調査	4,788,261	28.05.27 ～ 28.08.24	一般
49	豊平川処理区北郷5条4丁目ほか下水道管渠実施設計	14,054,536	28.08.12 ～ 29.03.19	一般
50	伏古川処理区Ⅱ-01200及びⅡ-01220 (東苗穂4条1丁目ほか) 下水道管渠実施設計	14,014,080	28.09.02 ～ 29.03.24	一般
51	防災・安全交付金事業 東区北20条東1丁目ほか下水道管路施設耐震修正設計	12,831,271	28.10.07 ～ 29.03.10	一般
52	厚別処理区厚別町山本1063番地ほか1線下水道管渠実施設計	12,762,204	28.10.21 ～ 29.03.24	一般
53	市債務負担行為 厚別処理区川下地区(川下1条4丁目ほか) 下水道新設工事	45,725,040	29.01.17 ～ 29.09.13	一般
54	防災・安全交付金事業 茨戸水再生プラザ東汚泥圧送管(あいの里5条3丁目東) 新設工事	52,947,000	29.02.27 ～ 29.08.01	一般
55	防災・安全交付金事業 伏古川処理区Ⅱ-02400(苗穂町2丁目) 下水道新設工事	101,672,280	29.03.28 ～ 29.09.20	一般
56	市債務負担行為 東部処理区澄川24号線(澄川5条3丁目ほか) 下水道新設工事	19,147,320	29.03.21 ～ 29.07.18	一般
57	防災・安全交付金事業 東西連絡汚泥圧送管(東苗穂4条2丁目ほか) 新設工事	43,721,640	29.03.28 ～ 29.08.24	一般
58	市債務負担行為 東部処理区西岡4条2丁目ほか下水道新設工事	11,228,760	29.03.21 ～ 29.07.18	一般
59	市債務負担行為 創成川処理区西5丁目・樽川通(北23条西4丁目) ほか下水道新設工事	11,900,520	29.03.21 ～ 29.09.18	一般
60	市債務負担行為 創成川処理区北5条東5丁目ほか下水道新設工事	26,586,360	29.03.28 ～ 29.07.25	一般
61	市債務負担行為 新川処理区南19条西12丁目ほか下水道新設工事	25,085,160	29.03.21 ～ 29.08.17	一般
62	防災・安全交付金事業 伏古川処理区Ⅱ-01300(東苗穂2条2丁目ほか) 地質調査	7,611,840	29.06.02 ～ 29.08.30	一般

(建築工事)

番号	工 事 (業 務) 名	契約金額(円)	工 期	契約方法
1	創成川水再生プラザ水質管理棟女子更衣室天井修繕工事	489,240	28.09.28 ～ 28.11.26	随契
2	豊平川水再生プラザ第1処理施設反応タンク2系上屋改修工事監理	2,851,200	28.05.26 ～ 28.12.22	随契
3	茨戸水再生プラザ管理棟外部ほか改修工事監理	2,322,000	28.05.26 ～ 28.12.16	随契
4	伏古川水再生プラザ管理棟外部ほか改修工事監理	2,246,400	28.06.10 ～ 28.12.19	随契
5	定山溪水再生プラザ管理棟屋上防水ほか改修工事实施設計	2,702,157	28.10.21 ～ 29.03.21	一般
6	茨戸水再生プラザ水処理棟外部ほか改修工事实施設計	4,932,360	28.10.21 ～ 29.03.21	一般
7	社会資本整備総合交付金事業 茨戸水再生プラザ最終沈殿池3系覆蓋新設工事	150,843,600	28.06.20 ～ 29.01.20	一般
8	社会資本整備総合交付金事業 新川水再生プラザ第1処理施設最終沈殿池4系覆蓋新設工事	176,661,000	28.05.23 ～ 28.12.20	一般
9	茨戸水再生プラザ最初沈殿池点検蓋改修工事	23,716,800	28.10.24 ～ 29.02.20	一般
10	茨戸水再生プラザ管理棟外部ほか改修工事	77,837,760	28.05.30 ～ 28.12.05	一般
11	伏古川水再生プラザ管理棟外部ほか改修工事	74,293,200	28.06.13 ～ 28.12.05	一般
12	豊平川水再生プラザ第1処理施設反応タンク2系上屋改修工事	179,411,760	28.05.30 ～ 29.01.20	一般
13	創成川水再生プラザ第1処理施設高段ポンプ室間仕切り修繕工事	432,000	28.07.01 ～ 28.08.29	随契
14	創成川水再生プラザ第1処理施設本館渡り廊下ドア修繕工事	475,200	28.08.30 ～ 28.10.28	随契
15	伏古川水再生プラザ低段搬入口ドア修繕工事	343,440	28.06.03 ～ 28.07.27	随契

番号	工 事 (業 務) 名	契約金額(円)	工 期	契約方法
16	伏古川水再生プラザ階段室天井修繕工事	388,800	28.11.18 ～ 29.01.31	随契
17	拓北水再生プラザ反応タンク止水修繕工事	194,400	28.11.18 ～ 29.01.31	随契
18	茨戸水再生プラザ車庫棟シャッターほか修繕工事	442,800	28.11.18 ～ 28.12.22	随契
19	伏古川雨水ポンプ場ホッパー室シャッター修繕工事	270,000	28.12.22 ～ 29.01.31	随契
20	茨戸水再生プラザシャッター用リモコン移設工事	48,600	28.05.17 ～ 28.06.30	随契
21	定山溪水再生プラザ管理棟ルーフトレンほか修繕工事	421,200	28.07.21 ～ 28.09.14	随契
22	定山溪中継ポンプ場ポンプ室搬入口覆蓋修繕工事	248,400	28.06.02 ～ 28.08.10	随契
23	厚別水再生プラザ汚水調整池ホッパー室用シャッター修繕工事	378,000	29.03.09 ～ 29.03.30	随契
24	新川水再生プラザ第2処理施設次亜塩タンク室扉修繕工事	226,800	28.07.01 ～ 28.08.29	随契
25	新川水再生プラザ流雪施設搬入口オーバードア修繕工事	237,600	29.01.13 ～ 29.03.10	随契
26	手稲水再生プラザIろ過施設建築修繕工事	1,620,000	28.08.26 ～ 28.11.30	随契
27	手稲水再生プラザ操作室通用口庇修繕工事	275,400	29.03.09 ～ 29.03.28	随契
28	創成川水再生プラザ水質管理棟女子更衣室ほか修繕工事	329,400	29.08.04 ～ 29.10.02	随契
29	社会資本整備総合交付金事業 新川水再生プラザ第1処理施設最終沈殿池1系覆盖新設工事	187,003,080	29.05.22 ～ 29.12.20	一般
30	豊平川水再生プラザ第1処理施設反応タンク3系上屋改修工事	187,118,640	29.05.22 ～ 30.01.15	一般
31	定山溪水再生プラザ管理棟屋上防水ほか改修工事	55,994,760	29.05.29 ～ 29.11.30	一般

番号	工 事 (業 務) 名	契約金額(円)	工 期	契約方法
32	茨戸中部中継ポンプ場外部ほか改修工事	42,897,908	29.07.31 ～ 30.01.15	一般
33	社会資本整備総合交付金事業 茨戸水再生プラザ最終沈殿池4系覆蓋新設工事	154,632,240	29.06.19 ～ 30.01.19	一般
34	防災・安全交付金事業 手稲中継ポンプ場内部改修工事	114,372,000	29.08.07 ～ 30.03.15	一般
35	茨戸水再生プラザほか施設給湯ボイラ用煙突改修工事	40,359,600	29.08.21 ～ 29.11.30	一般
36	豊平川水再生プラザ第1処理施設反応タンク3系上屋改修工事監理	2,872,800	29.05.19 ～ 当該工事 の受渡日	随契
37	定山溪水再生プラザ管理棟屋上防水ほか改修工事監理	1,709,640	29.05.26 ～ 当該工事 の受渡日	随契
38	茨戸中部中継ポンプ場外部ほか改修工事監理	1,321,920	29.07.28 ～ 当該工事 の受渡日	随契
39	手稲中継ポンプ場内部改修工事監理	3,402,000	29.08.03 ～ 当該工事 の受渡日	随契
40	伏古川水再生プラザ沈砂池ほか機械設備工事監理	2,484,000	29.07.13 ～ 当該工事 の受渡日	随契
41	創成川水再生プラザ第1処理施設本館渡り廊下屋上修繕工事	324,000	29.08.28 ～ 29.10.26	随契
42	創成川水再生プラザ第1処理施設4・5系最終沈殿池屋上修繕工事	270,000	29.09.22 ～ 29.11.20	随契
43	厚別水再生プラザ自家発消音器塗裝修繕工事	1,060,560	29.08.04 ～ 29.10.31	随契
44	豊平川水再生プラザ濃縮槽屋上修繕工事	194,400	29.08.31 ～ 29.10.31	随契
45	新川水再生プラザ第2処理施設最終沈殿池覆蓋修繕工事	378,000	29.09.25 ～ 29.12.22	随契

(設備工事)

番号	工 事 (業 務) 名	契約金額(円)	工 期	契約方法
1	手稲水再生プラザ弱電設備ほか修繕工事实施設計	1,699,870	28.12.16 ～ 29.03.21	一般

番号	工 事 (業 務) 名	契約金額(円)	工 期	契約方法
2	茨戸水再生プラザ管理棟空調設備ほか修繕工事实施設計	1,574,631	28.12.26 ～ 29.03.28	一般
3	手稲中継ポンプ場No.1低段汚水ポンプほか修繕工事	116,802,000	28.04.18 ～ 29.03.15	随契
4	手稲水再生プラザ2系終沈汚泥掻寄機ほか修繕工事	119,571,120	28.05.09 ～ 29.03.03	一般
5	厚別川雨水ポンプ場受変電設備ほか修繕工事	77,760,000	28.06.06 ～ 29.02.24	一般
6	東部水再生プラザ無停電電源設備修繕工事	66,247,200	28.06.06 ～ 29.03.15	一般
7	創成川水再生プラザ高度処理施設原水ポンプ用電動機ほか修繕工事	60,480,000	28.06.13 ～ 29.03.15	一般
8	茨戸水再生プラザ給水給湯配管ほか修繕工事	27,848,880	28.06.20 ～ 29.01.16	一般
9	厚別水再生プラザ汚水調整池可動堰ほか修繕工事	24,212,520	28.06.27 ～ 29.02.24	一般
10	手稲水再生プラザブロワ用電動機ほか修繕工事	58,590,000	28.07.04 ～ 29.03.15	一般
11	厚別川雨水ポンプ場No.1雨水ポンプ用エンジンほか修繕工事	35,254,440	28.07.04 ～ 29.02.24	随契
12	新川水再生プラザ第1処理施設終沈汚泥引抜ポンプほか修繕工事	44,152,560	28.07.04 ～ 29.03.15	随契
13	創成川水再生プラザ第1処理施設No.1終沈汚泥掻寄機修繕工事	64,681,200	28.08.01 ～ 29.02.15	一般
14	新川水再生プラザ第1処理施設4系反応タンク散気装置修繕工事	51,329,160	28.08.01 ～ 29.03.15	一般
15	手稲中継ポンプ場雨水ポンプ用ガスタービン修繕工事	108,058,320	28.08.01 ～ 29.03.15	随契
16	新川水再生プラザ第1処理施設4系終沈汚泥掻寄機修繕工事	84,600,720	28.08.29 ～ 29.03.15	一般
17	創成川水再生プラザ雨水ポンプ施設沈砂トラフコンベヤ修繕工事	32,250,960	28.09.12 ～ 29.03.15	一般

番号	工 事 (業 務) 名	契約金額(円)	工 期	契約方法
18	新川水再生プラザ第1処理施設汚水ポンプ用電動機ほか修繕工事	29,160,000	28.09.12 ～ 29.03.15	一般
19	厚別水再生プラザNo.4細目除塵機ほか修繕工事	46,762,920	28.09.20 ～ 29.03.15	一般
20	茨戸中部中継ポンプ場自家発用エンジンほか修繕工事	112,820,040	28.10.18 ～ 29.03.15	随契
21	防災・安全交付金事業 西部スラッジセンター焼却施設改築実施設計	56,221,560	28.04.22 ～ 29.03.10	一般
22	防災・安全交付金事業 手稲中継ポンプ場制御設備改築ほか実施設計	26,941,680	28.09.09 ～ 29.03.21	一般
23	防災・安全交付金事業 豊平川水再生プラザ第1処理施設沈砂池設備改築ほか実施設計	61,813,707	28.06.24 ～ 29.03.21	一般
24	防災・安全交付金事業 豊平川水再生プラザ汚泥処理機械設備ほか実施設計	30,532,781	28.08.05 ～ 29.03.10	一般
25	防災・安全交付金事業 新川水再生プラザ第2処理施設動力制御設備工事	1,948,186,080	27.01.13 ～ 29.03.15	一般
26	防災・安全交付金事業 定山溪水再生プラザ動力制御設備工事	661,644,720	27.06.29 ～ 29.03.15	一般
27	防災・安全交付金事業 豊平川水再生プラザ汚泥前処理電気設備工事	162,093,960	28.03.14 ～ 29.03.15	一般
28	社会資本整備総合交付金事業 茨戸水再生プラザ電気設備工事	62,467,200	28.09.20 ～ 29.03.22	一般
29	創成川水再生プラザほか電気設備工事	45,811,440	28.10.31 ～ 29.03.15	一般
30	防災・安全交付金事業 新川水再生プラザ汚泥処理機械設備工事	313,529,883	27.09.14 ～ 29.03.10	一般
31	防災・安全交付金事業 新川水再生プラザ第2処理施設汚水ポンプ機械設備工事	170,251,200	27.11.17 ～ 29.01.30	一般
32	防災・安全交付金事業 豊平川水再生プラザ汚泥前処理機械設備工事	386,738,280	28.01.25 ～ 29.03.15	一般
33	社会資本整備総合交付金事業 茨戸水再生プラザ最終沈殿池機械設備工事	47,520,000	28.07.19 ～ 29.03.10	一般

番号	工 事 (業 務) 名	契約金額(円)	工 期	契約方法
34	創成川水再生プラザ第2処理施設ポンプ室等建築機械設備工事	151,974,360	28.08.01 ～ 29.03.15	一般
35	厚別川雨水ポンプ場ポンプ室建築機械設備工事	93,300,120	28.09.12 ～ 29.03.15	一般
36	創成川水再生プラザ受配電施設消石灰貯留サイロ室火報修繕工事	217,080	28.09.16 ～ 28.12.14	随契
37	茨戸水再生プラザテレビ共聴設備修繕工事	494,640	28.07.29 ～ 28.09.15	随契
38	創成川水再生プラザ第2処理施設混合汚泥配管修繕工事	486,000	28.07.04 ～ 28.09.01	随契
39	創成川水再生プラザ第2処理施設反応タンク1系排水管修繕工事	486,000	29.02.15 ～ 29.03.28	随契
40	伏古川水再生プラザ低段汚水ポンプ電動機ブラシ引揚装置修繕工事	1,944,000	28.07.01 ～ 28.09.27	随契
41	茨戸中部中継ポンプ場監視用光ケーブル修繕工事	734,400	29.02.24 ～ 29.03.15	随契
42	厚別水再生プラザボイラー修繕工事	363,960	28.06.30 ～ 28.08.09	随契
43	定山溪水再生プラザ沈砂池粗目スクリーン覆蓋修繕工事	496,800	28.09.01 ～ 28.10.19	随契
44	厚別水再生プラザ終沈No.4-2メインコレクタ修繕工事	421,200	28.09.15 ～ 28.10.31	随契
45	厚別水再生プラザ汚泥前処理施設傾斜コンベヤ修繕工事	453,600	28.12.15 ～ 29.02.27	随契
46	豊平川水再生プラザ工作室換気設備修繕工事	2,052,000	29.02.03 ～ 29.03.28	随契
47	米里中継ポンプ場放流樋門用エンジン修繕工事	469,800	28.04.21 ～ 28.07.26	随契
48	豊平川中継ポンプ場放流樋門減速機修繕工事	326,160	28.08.25 ～ 28.10.28	随契
49	野津幌川雨水ポンプ場エンジン冷却水配管修繕工事	494,640	28.12.22 ～ 29.03.23	随契

番号	工 事 (業 務) 名	契約金額(円)	工 期	契約方法
50	豊平川水再生プラザ汚泥棟 1 階通路照明修繕工事	475,200	28.05.26 ～ 28.06.24	随契
51	豊平川水再生プラザ水質計器修繕工事	491,400	29.01.12 ～ 29.03.31	随契
52	豊平川水再生プラザ工作室電気設備修繕工事	410,400	29.03.09 ～ 29.03.29	随契
53	米里中継ポンプ場No. 1 電動雨水ポンプ盤修繕工事	280,800	28.04.28 ～ 28.07.19	随契
54	新川水再生プラザ第 1 処理施設本館No. 2給湯暖房ボイラー修繕工事	131,760	29.02.02 ～ 29.02.28	随契
55	新川水再生プラザ第 2 処理施設終沈 1 系覆蓋親綱修繕工事	494,640	28.06.16 ～ 28.07.22	随契
56	手稲沈砂洗浄センターNo. 1-2洗砂分離機整流筒修繕工事	491,400	28.08.05 ～ 28.10.14	随契
57	手稲水再生プラザ封水配管修繕工事	486,000	28.11.29 ～ 29.01.20	随契
58	手稲水再生プラザ封水配管修繕工事 (その 2)	486,000	29.02.14 ～ 29.03.15	随契
59	手稲水再生プラザ汚水ポンプ封水配管修繕工事	1,220,400	29.03.10 ～ 29.03.24	随契
60	手稲中継ポンプ場低段雨水除塵機修繕工事	1,836,000	29.02.03 ～ 29.03.17	随契
61	茨戸中部中継ポンプ場自家発用エンジン修繕工事	3,402,000	29.04.17 ～ 29.06.15	随契
62	手稲水再生プラザNo. 2 汚水ポンプほか修繕工事	93,960,000	29.05.22 ～ 30.03.15	随契
63	新川水再生プラザ第 1 処理施設 1 系反応タンク散気板装置ほか修繕工事	61,290,000	29.08.07 ～ 30.03.15	一般
64	豊平川中継ポンプ場受変電設備ほか修繕工事	86,400,000	29.09.04 ～ 30.03.15	一般
65	新川水再生プラザ第 1 処理施設 1 系終沈汚泥掻寄機修繕工事	78,489,000	29.09.11 ～ 30.03.15	一般

番号	工 事 (業 務) 名	契約金額(円)	工 期	契約方法
66	防災・安全交付金事業 茨戸水再生プラザ自家発電設備工事	561,600,000	29.07.03 ～ 31.03.22	一般
67	防災・安全交付金事業 豊平川水再生プラザ汚泥処理電気設備工事	75,170,160	29.07.10 ～ 30.03.15	一般
68	手稲水再生プラザ電気設備工事	77,662,800	29.08.21 ～ 30.03.15	一般
69	防災・安全交付金事業 西部スラッジセンター新1系焼却施設焼却機械設備新設工事	4,428,000,000	29.08.21 ～ 33.03.15	一般
70	防災・安全交付金事業 伏古川雨水ポンプ場沈砂池機械設備工事	162,000,000	29.09.26 ～ 30.03.15	一般
71	創成川水再生プラザ雨水ポンプ施設伏古受泥配管修繕工事	453,600	29.08.16 ～ 29.10.12	随契
72	豊平川水再生プラザ特高受電設備引込口修繕工事	387,720	29.08.03 ～ 29.09.27	随契
73	厚別水再生プラザ消泡水ポンプ用配管修繕工事	194,400	29.08.03 ～ 29.09.11	随契
74	新川水再生プラザ第1処理施設2系返送汚泥配管修繕工事	1,458,000	29.06.23 ～ 29.08.30	随契
75	茨戸西部中継ポンプ場No.4沈砂掻揚機給油配管修繕工事	1,404,000	29.07.13 ～ 29.09.15	随契

都市局 市街地整備部

別表

(土木工事)

番号	工 事 (業 務) 名	契約金額(円)	工 期	契約方法
1	東雁来第2地区171街区ほか載荷盛土撤去工事	82,531,440	28.04.18 ～ 28.09.14	一般
2	東雁来第2地区ライラック通ほか1線道路縦断管新設工事	87,311,520	28.05.16 ～ 28.12.21	一般
3	東雁来第2地区雁穂みのり通道路縦断管新設工事	67,614,480	28.05.23 ～ 28.11.18	一般
4	社会資本整備総合交付金事業 東雁来第2地区区画2号線雁来川10号橋(上部工)新設工事	84,970,080	28.06.06 ～ 28.12.02	一般

番号	工 事 (業 務) 名	契約金額(円)	工 期	契約方法
5	東雁来第2地区135街区擁壁新設工事	24,437,160	28.06.13 ～ 28.11.09	一般
6	東雁来第2地区223街区ほか緑地造成工事	22,709,160	28.07.19 ～ 28.10.26	一般
7	東雁来第2地区区画23号線ほか7線道路修正設計	2,497,896	28.08.12 ～ 28.12.09	一般
8	社会資本整備総合交付金事業 東雁来第2地区区画34号線ほか1線道路新設工事	74,715,480	29.04.24 ～ 29.09.30	一般
9	東雁来第2地区区画23号線ほか3線道路新設工事	42,204,240	29.05.15 ～ 29.09.11	一般
10	東雁来第2地区区画180号線ほか3線道路新設工事	45,567,360	29.05.15 ～ 29.09.21	一般

(建築工事)

番号	工 事 (業 務) 名	契約金額(円)	工 期	契約方法
1	市営住宅二十四軒団地敷地高低差測量業務	864,000	28.07.15 ～ 28.09.13	随契
2	市営住宅光星団地4号棟ゴミステーション改修等工事	494,640	28.10.18 ～ 28.11.11	随契

豊平区 土木部

別表

(土木工事)

番号	工 事 (業 務) 名	契約金額(円)	工 期	契約方法
1	市債務負担行為 東月寒3号線(月寒東2条18丁目3号線～東月寒6号線間)舗装改良工事	40,495,680	28.02.22 ～ 28.08.09	一般
2	市債務負担行為 東月寒1号線(北野東月寒連絡線～白石連絡線間)舗装路面改良工事	29,541,240	28.02.22 ～ 28.07.20	一般
3	豊平区道路区画線塗装工事	26,843,400	28.03.22 ～ 28.06.30	一般
4	美園5丁目中通2号線(美園5条線～美園4条線間)ほか1線生活道路整備工事	21,919,680	28.07.11 ～ 28.10.28	一般
5	豊平4条5丁目3号線(豊平3条中通1号線～豊平4条線間)生活道路整備工事	4,926,960	28.09.12 ～ 28.11.20	一般

番号	工 事 (業 務) 名	契約金額(円)	工 期	契約方法
6	美園8丁目線（豊平月寒2条線～美園1条中通線間ほか）道路補修工事	14,466,600	28.08.29 ～ 28.01.10	一般
7	東札幌中の島線（美園月寒裏通線～国道36号間）舗装路面改良工事	28,557,360	28.09.12 ～ 29.01.09	一般
8	平岸ばら公園ほか2公園改修工事	5,431,320	28.09.12 ～ 28.12.10	一般
9	平岸あさがお公園ほか2公園改修工事	9,315,000	28.10.03 ～ 29.01.30	一般
10	西岡公園改修工事	9,916,560	29.01.30 ～ 29.03.28	一般
11	月寒川緑地造成工事	9,201,600	28.10.03 ～ 28.12.31	一般
12	展望台横12号線（展望台横11号線～西岡横線間）ほか1線路線測量	2,547,525	28.06.03 ～ 28.08.21	一般
13	月寒7丁目西1号線（国道36号～月寒西1条7丁目545番6地先間）ほか2線路線測量	2,633,882	28.07.25 ～ 28.10.12	一般
14	平岸1条10丁目1号線（平岸1条線～精進川沿東線間）ほか4線路線測量	2,941,639	28.08.26 ～ 28.11.13	一般
15	月寒西岡線（西野真駒内清田線～石山西岡線間）道路実施設計	8,072,712	28.10.17 ～ 29.03.20	一般
16	豊平区内道路標識等設置工事	1,101,600	28.06.22 ～ 28.08.04	一般
17	豊平区内道路標識等設置工事（その2）	1,393,200	28.09.08 ～ 28.10.20	随契
18	豊平区東地区道路維持除雪業務	952,599,960	28.10.01 ～ 29.09.30	随契
19	豊平区内道路標識等設置工事	2,451,600	29.06.09 ～ 29.07.23	一般
20	市債務負担行為 道道西野真駒内清田線（西岡横線～西岡4条11丁目2号線間）舗装路面改良工事	29,978,640	29.02.20 ～ 29.07.19	随契
21	市債務負担行為 福住76号線（福住73号線～福住71号線間）生活道路整備工事	19,908,720	29.03.06 ～ 29.08.10	一般

番号	工 事 (業 務) 名	契約金額(円)	工 期	契約方法
22	美園1丁目線(美園月寒裏通線～美園6・7条中通線間)ほか2線生活道路整備工事	21,513,600	29.05.22 ～ 29.09.18	一般

清田区 土木部

別表

(土木工事)

番号	工 事 (業 務) 名	契約金額(円)	工 期	契約方法
1	市債務負担行為 吉田川沿6号線(吉田川沿3号線～吉田川沿18号線間)ほか2線生活道路整備工事	35,483,400	28.01.19 ～ 28.08.15	一般
2	市債務負担行為 清田団地44号線(清田団地2号線～清田団地54号線間)ほか1線舗装路面改良工事	17,229,240	28.02.22 ～ 28.07.10	一般
3	里塚日の丸団地2号線(里塚132号線～里塚日の丸団地6号線間)ほか1線生活道路整備工事	17,504,640	28.05.30 ～ 28.09.06	一般
4	真栄団地27号線(真栄団地21号線～真栄団地3号線間)ほか1線生活道路整備工事	34,157,160	28.06.27 ～ 28.11.03	一般
5	北野71号線(北野5条5丁目1号線～北野宅造3号線間)ほか1線生活道路整備工事	13,670,640	28.07.19 ～ 28.10.06	一般
6	里塚172号線(里塚175号線～里塚177号線間)生活道路改良工事	11,827,080	28.08.01 ～ 28.10.19	一般
7	清田団地73号線(清田団地68号線～清田団地69号線間)生活道路整備工事	17,524,080	28.08.01 ～ 28.10.29	一般
8	道道真駒内御料札幌線(有明307-3地先～有明307-1地先間)落石防護柵設置工事	12,304,440	28.08.15 ～ 28.12.12	一般
9	里塚緑ヶ丘ながぐつ公園新規造成工事	9,915,268	28.08.29 ～ 28.10.27	一般
10	北野6号線(北野里塚線～道道真駒内御料札幌線間)ほか1線路線測量	3,718,258	28.10.07 ～ 28.12.25	一般
11	里塚136号線(里塚108号線～里塚110号線間)ほか2線路線測量	2,005,319	28.10.07 ～ 28.12.15	一般
12	清田区管内街路灯塗装工事	2,354,400	28.07.19 ～ 28.09.22	一般
13	田の中橋照明設備設置工事	2,138,400	28.11.30 ～ 29.01.08	随契

番号	工 事 (業 務) 名	契約金額(円)	工 期	契約方法
14	市債務負担行為 北住公北野南線（北野5・7条5丁目線～北野平岡線間）舗装路面改良工事	21,546,000	29.02.06 ～ 29.06.25	随契
15	北野平岡線（北野5条4丁目23-2地先～道道真駒内御料札幌線間）舗装路面改良工事	44,692,560	29.04.17 ～ 29.08.24	一般
16	真栄団地15号線（平岡里塚線～国道36号間）舗装改良工事	34,464,960	29.05.22 ～ 29.09.08	一般
17	清田区管内街路灯塗装工事	2,322,000	29.07.24 ～ 29.08.24	一般
18	清田区南地区道路維持除雪業務	808,722,360	28.10.01 ～ 29.09.30	随契

南区 土木部

別表

(土木工事)

番号	工 事 (業 務) 名	契約金額(円)	工 期	契約方法
1	市債務負担行為 澄川1条3丁目5号線（澄川1条3丁目4号線～澄川1条3・4丁目線間）ほか1線生活道路整備工事	23,305,320	28.01.25 ～ 28.08.11	一般
2	真駒内住宅団地線（道道西野真駒内清田線～真駒内上町7号線間）道路改良ほか工事	57,097,440	28.05.23 ～ 28.12.08	一般
3	川沿12条4丁目1号線（南の沢線～川沿12条4丁目2号線間）ほか1線生活道路整備工事	30,156,840	28.07.11 ～ 28.11.07	一般
4	川沿4条4丁目4号線（川沿藻岩神社通線～川沿町西線間）道路整備工事	27,382,320	28.08.15 ～ 28.12.02	一般
5	川沿9条2丁目（一般国道230号線～川沿9条線間）路線測量	2,126,343	28.06.03 ～ 28.08.11	一般
6	常盤2条1丁目6号線（常盤54号線～常盤56号線間）ほか4線路線測量	3,806,552	28.07.29 ～ 28.10.26	一般
7	藤野野の沢19号線（藤野野の沢9号線～藤野野の沢7号線間）ほか2線路線測量	3,576,588	28.07.29 ～ 28.10.16	一般
8	芸術の森2号線市設街路灯塗装工事	1,620,000	28.09.12 ～ 28.10.31	随契
9	澄川厚別滝連絡線（真駒内275番地）ほか11箇所道路標識設置工事	2,052,000	28.10.25 ～ 28.12.13	随契

番号	工 事 (業 務) 名	契約金額(円)	工 期	契約方法
10	柏ヶ丘中央公園ほか1公園整備工事	18,877,320	28.11.07 ～ 29.02.04	一般
11	南沢スワン公園ほか2公園整備工事	10,594,800	28.11.14 ～ 29.01.12	一般
12	安全・安心な緑道再整備実施設計	9,839,496	28.08.12 ～ 29.03.19	一般
13	社会資本整備総合交付金事業 川沿みどり公園ほか1公園再整備実施設計	3,700,809	28.11.04 ～ 29.03.23	一般
14	市債務負担行為 道道真駒内御料札幌線（常盤真駒内線～真駒内滝野線間）舗装路面改良工事	36,694,080	29.02.13 ～ 29.09.10	一般
15	市債務負担行為 藤野6条6丁目11号線（藤野6条6丁目551番46地先～藤野6条6丁目8号線間）生活道路整備工事	7,792,200	29.02.13 ～ 29.08.11	一般
16	市債務負担行為 川沿4条3丁目1号線（川沿3丁目1号線～観光道路連絡線間）生活道路整備工事	14,545,440	29.02.06 ～ 29.08.04	一般
17	川沿北ノ沢連絡線（川沿1条4丁目5号線～川沿1条3丁目1714番17地先間）道路整備工事	84,187,080	29.05.01 ～ 29.11.16	一般
18	南区南地区道路維持除雪業務	817,122,600	29.10.01 ～ 29.09.30	一般

注：本表における契約方法の標記については、下記のとおり省略している。

- ・一般競争入札 ⇒ 一般
- ・指名競争入札 ⇒ 指名
- ・随意契約 ⇒ 随契
