


北海道新幹線(新函館北斗・札幌間)工事進捗状況

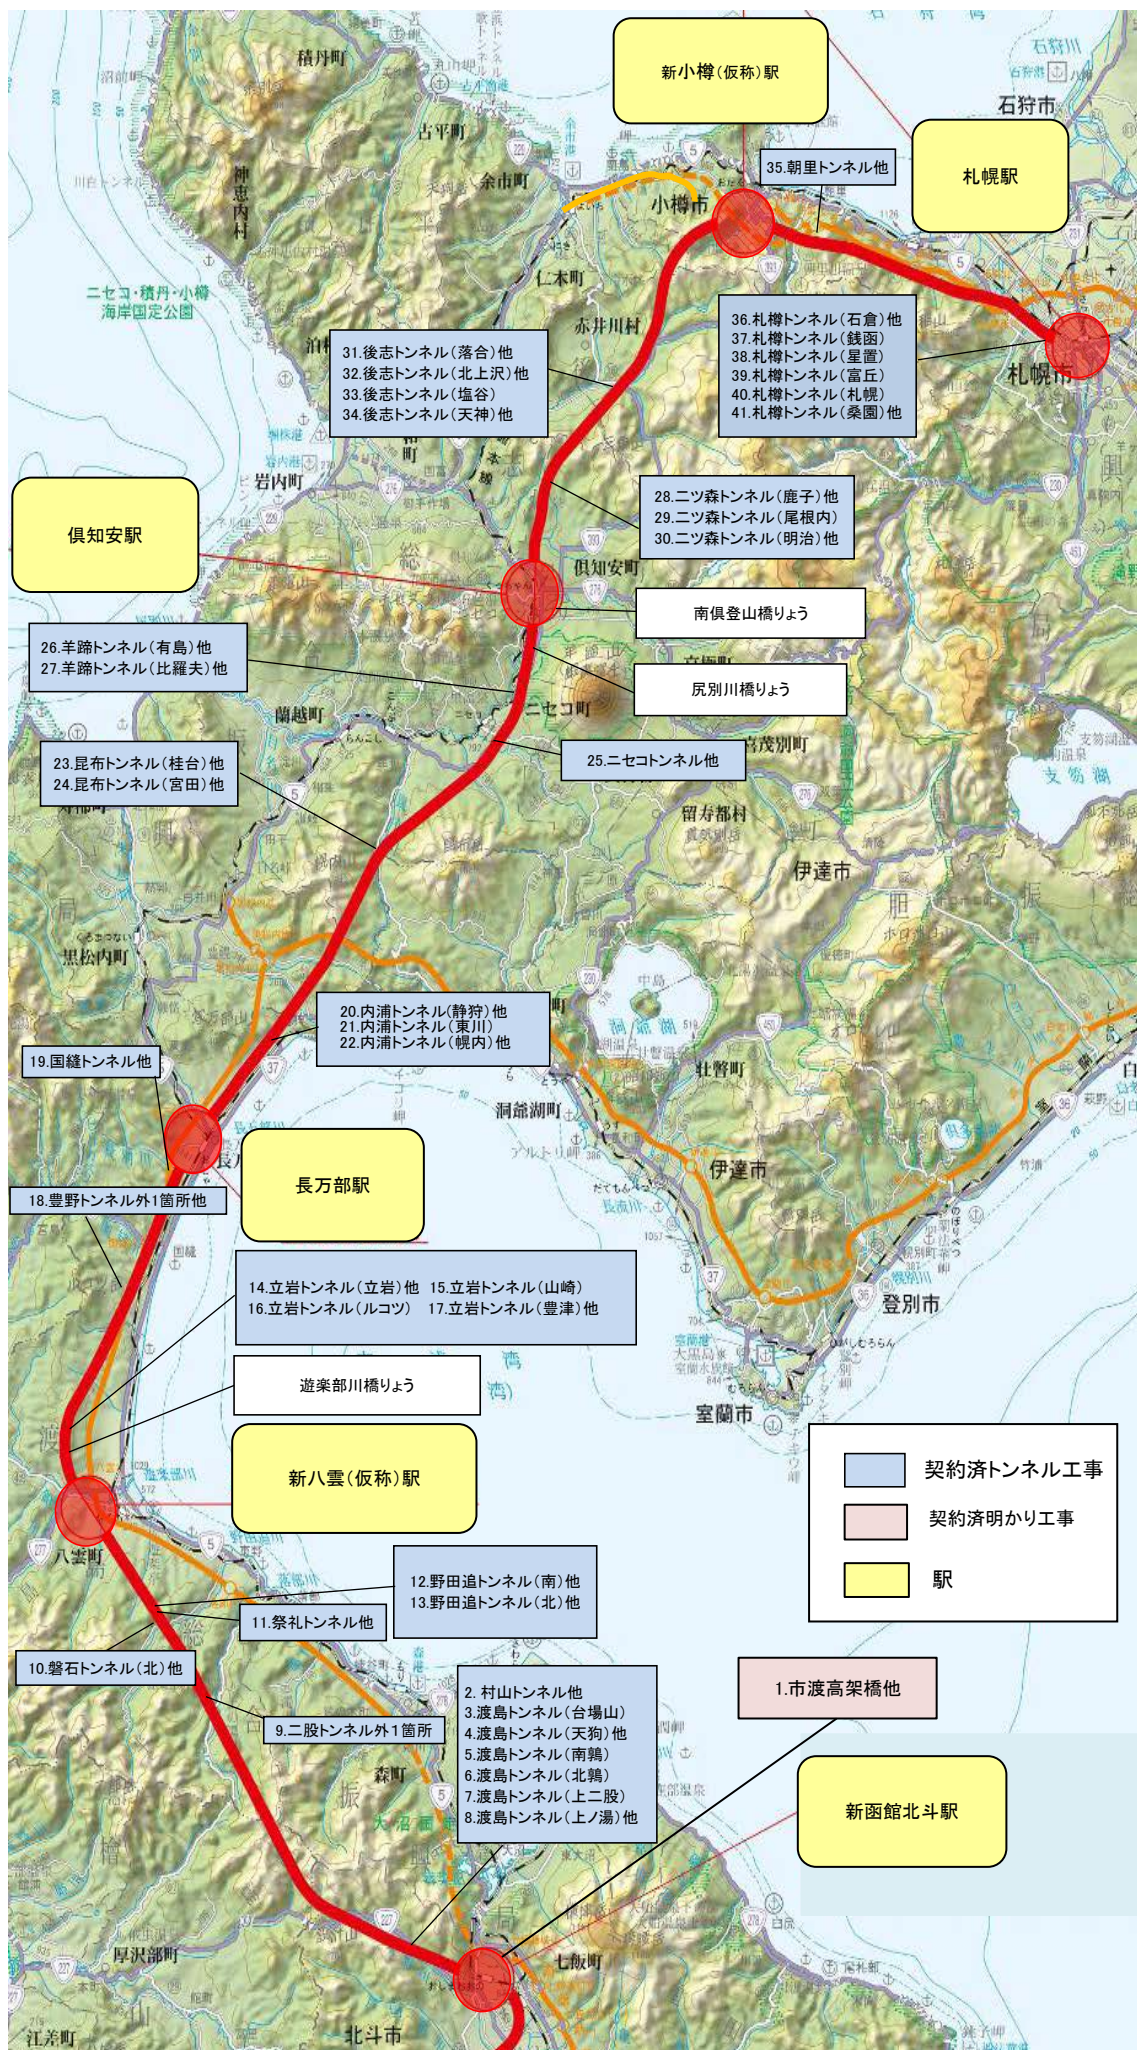

トンネル工事進捗状況

No	工区名	トンネル延長	掘削延長	掘削率	覆工	備考
2	村山トンネル他	5,365m	5,365m	100%	5,365m	計画変更により渡島トンネルと一本化
3	渡島トンネル(台場山)	3,500m	1,008m	29%	0m	
4	渡島トンネル(天狗)他	4,600m	2,262m	49%	1,386m	
5	渡島トンネル(南鶉)	4,400m	507m	12%	0m	
6	渡島トンネル(北鶉)	5,000m	3,456m	69%	2,068m	
7	渡島トンネル(上二股)	4,540m	959m	21%	0m	
8	渡島トンネル(上ノ湯)他	5,265m	2,306m	44%	987m	
9	二股トンネル外1箇所	3,115m	1,523m	49%	633m	磐石トンネル(南)を含む
10	磐石トンネル(北)他	3,150m	982m	31%	0m	
11	祭礼トンネル他	1,980m	1,967m	99%	874m	磐石トンネルと一本化 ※3
12	野田追トンネル(南)他	3,675m	3,273m	89%	2,003m	
13	野田追トンネル(北)他	4,490m	3,992m	89%	2,888m	
14	立岩トンネル(立岩)他	5,015m	5,015m	100%	4,124m	
15	立岩トンネル(山崎)	4,960m	2,150m	43%	935m	
16	立岩トンネル(ルコツ)	5,000m	3,909m	78%	3,004m	
17	立岩トンネル(豊津)他	2,065m	1,047m	51%	0m	
18	豊野トンネル外1箇所他	2,105m	1,070m	51%	214m	幌内トンネルを含む
19	国縫トンネル他	1,340m	914m	68%	0m	
20	内浦トンネル(静狩)他	5,570m	2,470m	44%	1,455m	
21	内浦トンネル(東川)	5,000m	1,114m	22%	12m	
22	内浦トンネル(幌内)他	5,000m	3,705m	74%	2,318m	
23	昆布トンネル(桂台)他	4,800m	4,800m	100%	4,764m	
24	昆布トンネル(宮田)他	5,710m	5,710m	100%	5,538m	宮田トンネルを含む
25	ニセコトンネル他	2,270m	2,250m	99%	1,383m	※3
26	羊蹄トンネル(有島)他	4,181m	136m	3%	0m	
27	羊蹄トンネル(比羅夫)他	5,569m	3,404m	61%	2,135m	
28	ニツ森トンネル(鹿子)他	4,780m	4,780m	100%	4,732m	
29	ニツ森トンネル(尾根内)	4,615m	2,604m	56%	1,452m	
30	ニツ森トンネル(明治)他	3,255m	0m	0%	0m	
31	後志トンネル(落合)他	4,865m	4,803m	99%	3,912m	
32	後志トンネル(北上沢)他	4,600m	4,600m	100%	4,021m	
33	後志トンネル(塩谷)	4,050m	1,228m	30%	288m	
34	後志トンネル(天神)他	4,460m	905m	20%	168m	
35	朝里トンネル他	4,325m	2,802m	65%	1,257m	
36	札樽トンネル(石倉)他	4,504m	702m	16%	0m	
37	札樽トンネル(銭函)	4,000m	0m	0%	0m	
38	札樽トンネル(星置)	4,400m	0m	0%	0m	斜坑掘削中 0m/570m
39	札樽トンネル(富丘)	4,500m	0m	0%	0m	斜坑掘削中 358m/900m
40	札樽トンネル(札幌)	8,412m	55m	1%	0m	
41	札樽トンネル(桑園)他	737m	0m	0%	0m	
合計		169,168m	87,772m	-	57,914m	※1

明かり工事進捗状況

No	工区名	延長	備考
1	市渡高架橋他	461m	準備中

進捗率

路盤	延長	契約率	掘削率※2
	211.9km	81%	52%

●工事状況

- 本坑掘削完了 8工区
- 本坑掘削中 27工区
- 作業坑掘削中 2工区
- 準備中 4工区
- 計 41工区

※1: 単位未満四捨五入のため合計は必ずしも一致しない。
 ※2: 掘削率はトンネル実延長169,168mに対する掘削済延長の比率
 ※3: 掘削率が100%未達の理由は、明かり巻き未施工のため。地山部の掘削は完了。


2.村山トンネル他 坑口状況



19.国縫トンネル他 坑内状況



21.内浦トンネル(東川) 本坑状況

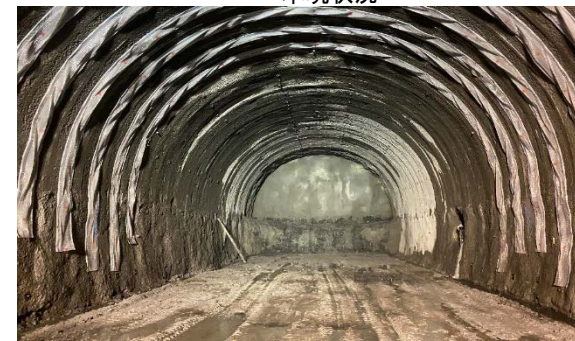

28.ニツ森トンネル(鹿子)他 覆工完了状況



34.後志トンネル(天神) FILM状況

