


# 北海道新幹線(新函館北斗・札幌間)工事進捗状況

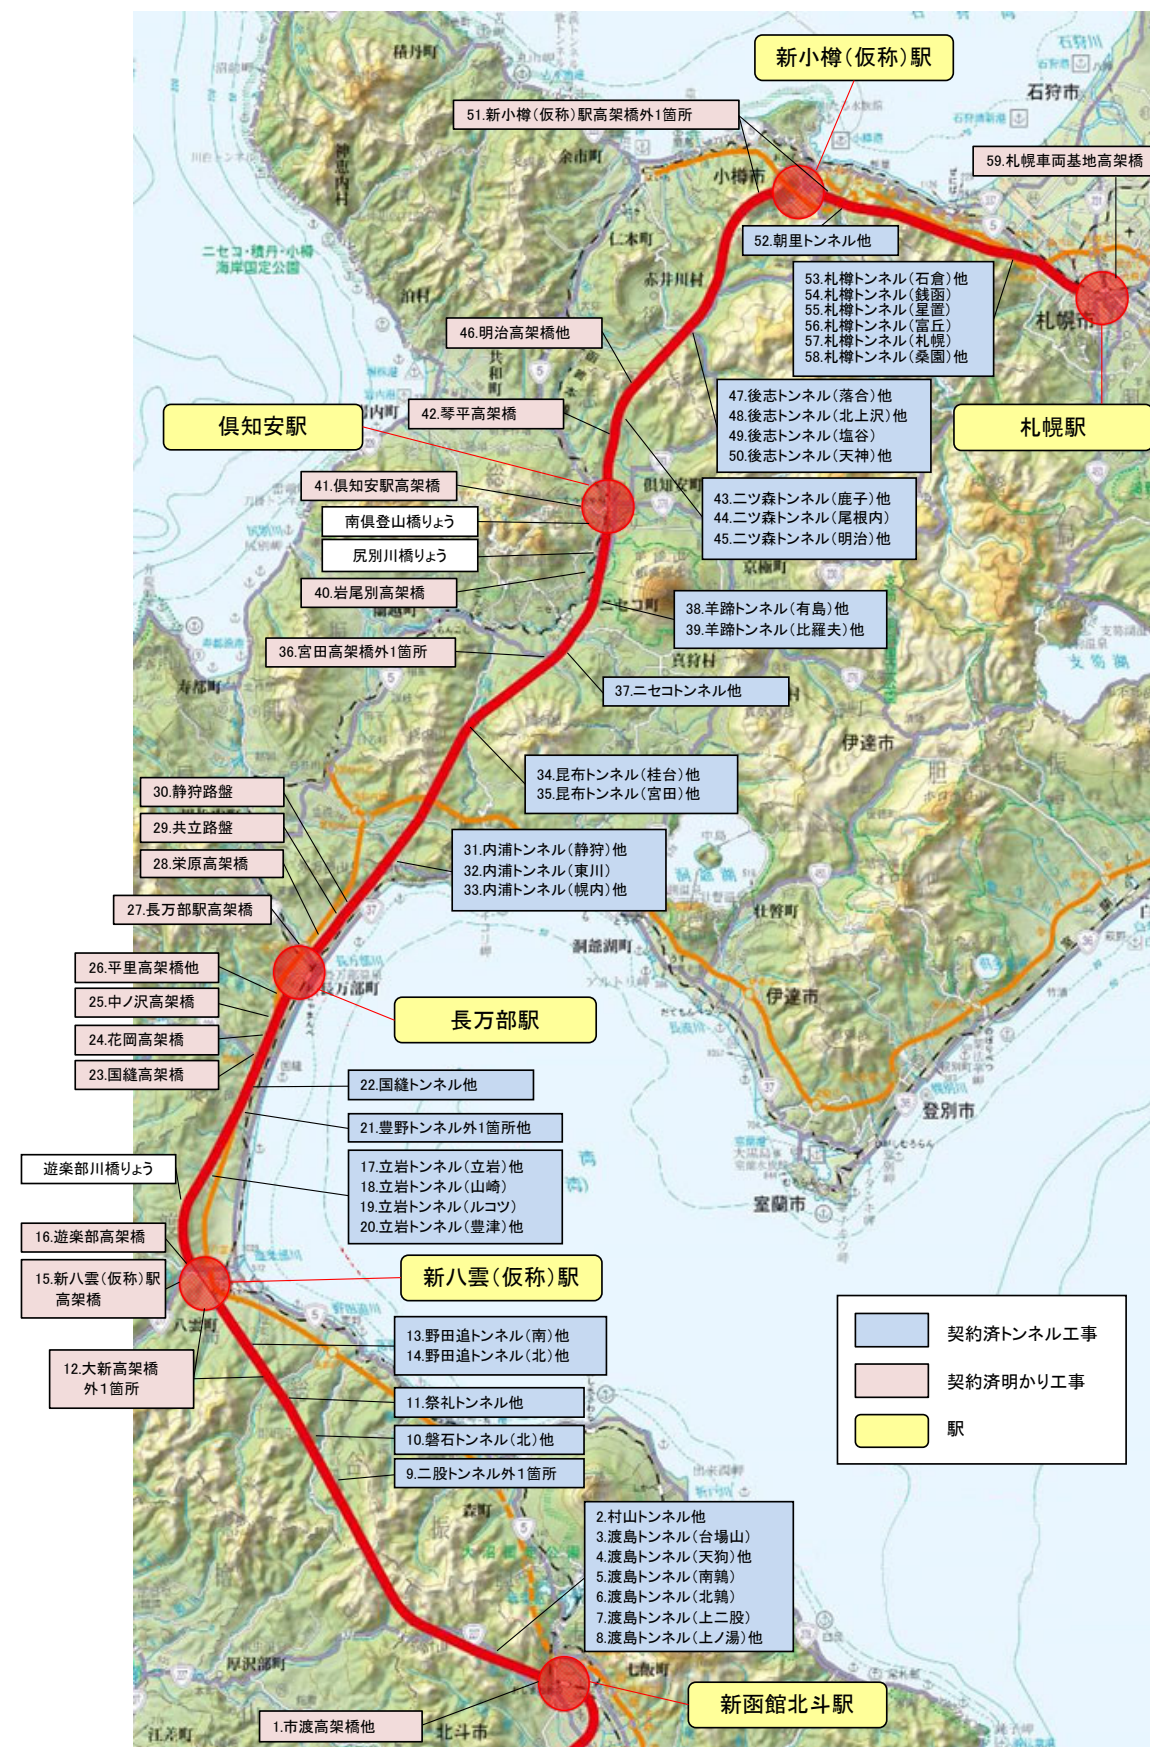

進捗率

路盤	延長	契約率	掘削率※2
	211.9km	99%	70%

● 工事状況

- 本坑掘削完了 **12工区**
- 本坑掘削中 **28工区**
- 明かり工事施工中 **11工区**
- 準備中 **8工区**
- 計 **59工区**

※1: 単位未満四捨五入のため合計は必ずしも一致しない。  
 ※2: 掘削率はトンネル実延長168,926mに対する掘削済延長の比率

## トンネル工事進捗状況

No	工区名	トンネル延長	掘削延長	掘削率	覆工	備考
2	村山トンネル他	5,365m	5,365m	100%	5,365m	計画変更により渡島トンネルと一本化
3	渡島トンネル(台場山)	3,500m	1,208m	35%	263m	
4	渡島トンネル(天狗)他	4,600m	3,213m	70%	1,764m	
5	渡島トンネル(南鶴)	4,400m	1,072m	24%	0m	
6	渡島トンネル(北鶴)	5,000m	4,680m	94%	3,416m	
7	渡島トンネル(上ノ湯)	4,540m	3,088m	68%	0m	
8	渡島トンネル(上ノ湯)他	5,310m	3,324m	63%	2,678m	
9	二股トンネル外1箇所	3,100m	2,686m	87%	2,004m	磐石トンネル(南)を含む
10	磐石トンネル(北)他	3,150m	2,528m	80%	1,508m	
11	祭礼トンネル他	1,975m	1,975m	100%	1,836m	磐石トンネルと一本化 ※3
13	野田追トンネル(南)他	3,775m	3,700m	98%	2,346m	
14	野田追トンネル(北)他	4,450m	4,077m	92%	3,402m	
17	立岩トンネル(立岩)他	5,015m	5,015m	100%	4,977m	
18	立岩トンネル(山崎)	4,960m	4,085m	82%	2,730m	
19	立岩トンネル(ルコツ)	5,000m	5,000m	100%	4,118m	
20	立岩トンネル(豊津)他	2,065m	1,934m	94%	1,176m	
21	豊野トンネル外1箇所他	2,165m	1,875m	87%	1,212m	幌内トンネルを含む
22	国縫トンネル他	1,340m	1,340m	100%	902m	
31	内浦トンネル(静狩)他	5,570m	3,968m	71%	2,871m	
32	内浦トンネル(東川)	5,000m	2,356m	47%	956m	
33	内浦トンネル(幌内)他	5,000m	5,000m	100%	4,238m	
34	昆布トンネル(桂台)他	4,800m	4,800m	100%	4,769m	
35	昆布トンネル(宮田)他	5,710m	5,710m	100%	5,742m	宮田トンネルを含む
37	ニセコトンネル他	2,250m	2,250m	100%	2,250m	
38	羊蹄トンネル(有島)他	4,166m	1,854m	44%	525m	
39	羊蹄トンネル(比羅夫)他	5,569m	3,404m	61%	2,540m	
43	ニツ森トンネル(鹿子)他	4,780m	4,780m	100%	4,748m	
44	ニツ森トンネル(尾根内)	4,615m	3,628m	79%	2,343m	
45	ニツ森トンネル(明治)他	3,255m	940m	29%	153m	
47	後志トンネル(落合)他	4,865m	4,865m	100%	4,691m	
48	後志トンネル(北上沢)他	4,600m	4,600m	100%	4,543m	
49	後志トンネル(塩谷)	4,050m	2,220m	55%	288m	
50	後志トンネル(天神)他	4,460m	1,997m	45%	1,298m	
52	朝里トンネル他	4,328m	3,771m	87%	2,390m	
53	札幌トンネル(石倉)他	4,506m	1,291m	29%	0m	
54	札幌トンネル(銭函)	4,000m	903m	23%	0m	
55	札幌トンネル(星置)	4,400m	447m	10%	0m	
56	札幌トンネル(富丘)	4,500m	1,117m	25%	0m	
57	札幌トンネル(札幌)	8,446m	1,429m	17%	0m	
58	札幌トンネル(桑園)他	346m	85m	25%	0m	進捗率から求めた換算値
合計		168,926m	117,579m	-	84,037m	※1

## 明かり工事進捗状況

No	工区名	延長	備考
1	市渡高架橋他	461m	高架橋、橋りょう工事中
12	大新高架橋外1箇所	2,883m	高架橋基礎工事中
15	新八雲(仮称)駅高架橋	1,178m	準備中
16	遊楽部高架橋	1,083m	準備中
23	国縫高架橋	2,138m	準備中
24	花岡高架橋	2,639m	準備中
25	中ノ沢高架橋	1,876m	高架橋基礎工事中
26	平里高架橋他	1,838m	高架橋基礎工事中
27	長万部駅高架橋	2,319m	準備中
28	栄原高架橋	2,534m	準備中
29	共立路盤	3,921m	準備中
30	静狩路盤	4,390m	高架橋、橋脚基礎工事中
36	宮田高架橋外1箇所	1,136m	高架橋、橋脚基礎工事中
40	岩尾別高架橋	2,354m	高架橋、橋脚基礎工事中
41	倶知安駅高架橋	3,160m	高架橋、橋脚基礎工事中
42	琴平高架橋	3,395m	準備中
46	明治高架橋他	976m	高架橋、橋脚工事中
51	新小樽(仮称)駅高架橋外1箇所	360m	高架橋基礎工事中
58	札幌トンネル(桑園)他	659m	高架橋、橋脚基礎工事中
59	札幌車両基地高架橋	1,344m	高架橋、橋脚基礎工事中

## 設備工事進捗状況

No	工事種類	工区名	契約数量	備考
60	軌道工事	基準器設置	84,799個	基準器設置工事中


## 1.市渡高架橋他

橋脚工事状況



## 19.立岩トンネル(ルコツ)

防水工状況

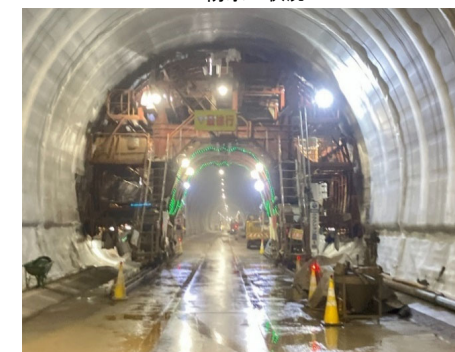

## 33.内浦トンネル(幌内)他

坑内状況

## 44.ニツ森トンネル(尾根内)

覆工状況

## 50.後志トンネル(天神)他

覆工状況
