





# 里塚復旧工事通信

がんばるベネさとづか

2020年10月30日 発行

第72号

## 21号線 終日通行止め(続報)

今週29日より実施 仮舗装をせずに作業終了とします



先週お伝えした里塚21号線の終日通行止め規制ですが、予定より一日遅れて今週29日より実施いたしました。

これまで、作業終了後は仮舗装を敷いておりました。ですが、今後当面の間は仮舗装をせず砂利を敷きならして作業終了と致します。そして、作業終了後も一般車両は通行が出来なくなります。

また、これまで同様に関係車両は引き続き通行が出来ますので通行証の掲示もしくは誘導員へのお声かけのうえ通行頂ければと思います。



一部が砂利のままとなった里塚21号線

なお、21号線での通行止めや工事についてご意見やご質問等がございましたら、下記担当までご連絡頂ければと思います。

施工者：共創技建株式会社  
TEL：011-886-6919  
現場代理人：松原 孝志 (携帯：090-5225-8813)  
発注者：札幌市建設局 土木部 工事課 街路工事一係  
TEL：011-211-2623 担当者：竹内 勇貴

## 今週の舗装工事

今週は22号線で舗装工事を実施しました。



一回目の舗装が完了した里塚22号線①




先週より本格的に始まった舗装工事ですが、今週は主に22号線にて舗装工事が行われました。

今後は、今週末に23号線の1回目の舗装が行われます。また、来週には22号線の仕上げの舗装工事が行われる予定です。

そして、21号線を除く路線については11月中旬頃までに舗装工事が完了する予定となりました。完成まで今しばらくお待ちください。

車道部の舗装工事進捗状況 ※10/30現在

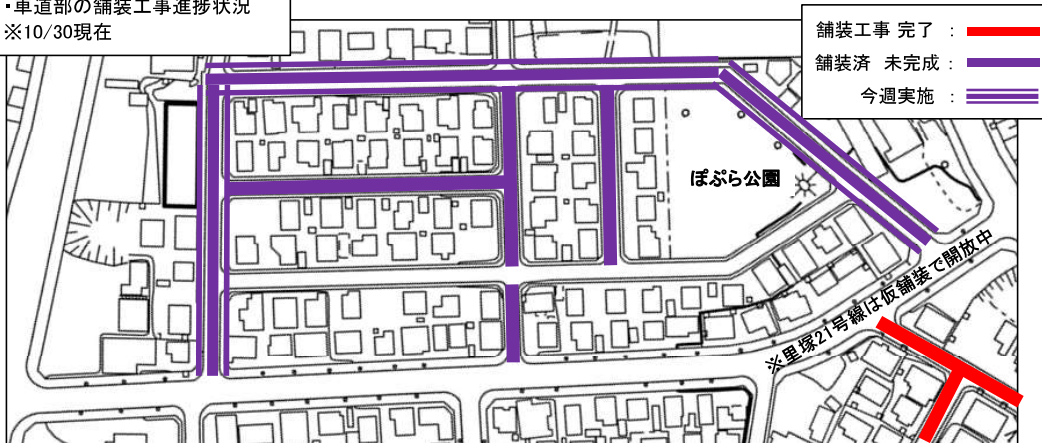

舗装工事完了：赤線  
舗装済 未完成：紫線  
今週実施：青線

## 三里の道も一歩から

い旧りてつまれム▼て海身すイ手い録た人選イ1るてはを私にはのた観が試す事は残はすシ▼  
ま工合、アすたに來い道選。タもう保。のばタ0選い私超が、勝低。戦、合。な上す、。1今  
す事えそイ。ぽ向年るは手まし指実持そ道れ1/手まのえ観前手迷こに今近▼ら位事残北ズ年の  
。はれシタこぶか以な野がたズ名績者の内たズ2をすおて戦回にのの行年く私優争が念海ズ  
、ばて1のらう降と球複、にさをを他出道に6決。かいし優思要観くは観も勝い出な道が、ロ  
今と今ズ時際際、改の数他はれ持破、身内はにめ▼げまた勝つ因戦こ残戦去しに來が日、プ  
日思回の、園に私めレ指のとまつつ中選出、行一だし試しての数と念に年て食まら本ま野  
もいの優横をはがてべ名球てし、て学身手大わド方、た合たい一のがな行まほいせ満ほも球  
一ま工勝に眺、バ実ルさ団もた俊全時が選学れラ、と。の2まつつ少出がっでし込ん足ムなの  
歩す事争座め新ス感がれか期。足国代選手日まフ來勝こ勝0すでな來らてはいんでのフクレ  
ず。ににいるるしでし上、ら待今が優にばを本しと年手の率1。あさま1い、なでしいア終ギ  
つそつに息すく札まが最もし後売勝現れ含代た会新に時は6ちるがせ試た年と、たくイ了ユ  
ん進いつ子に整幌しつ近道てのりし日まむ表。議入自の、年な、ん合の間思出。成タシラ  
んでいとな備ドたての内いフのた本し、にフが団負優9でみと今でして1い來來績しま  
で復語 りさ！。き北出まア選と記 3もア すし勝割の 私年しかす0まる年をズ

(馬場記)

※裏面に来週の実施予定を記載した平面図と工程表を掲載しておりますので、そちらもご覧ください

※協力 里塚中央災害復興委員会



# 里塚復旧工事通信

かんぱるベネシティが

2020年11月6日 発行

第73号

## 里塚22号線 舗装工事完了

路面改善に伴うスピードの出しすぎにご注意ください



先日より各所で実施されている舗装工事ですが、今週里塚22号線の舗装工事が完了致しました。この他、先週末には里塚23号線の1回目の舗装工事も行われました。これで、里塚21号線を除く路線で舗装工事が行われました。


去年行われた道路部改良工事に伴い、砂利道となっていた各路線ですが約一年ぶりに舗装が敷かれる事となりました。長らく皆様にはご迷惑をお掛けしておりましたが、これまでのご協力ありがとうございました。

なお、路面状況の改善に伴ってこれまでより速度を上げて走行される車を時々お見掛けいたします。引き続き新築工事なども行われており、見通しの悪い箇所もございます。これまで同様に慎重な運転を心掛けて頂くよう、よろしくお願いいたします。

・舗装工事が完了した里塚22号線



・舗装工事進捗状況  
※11/6現在

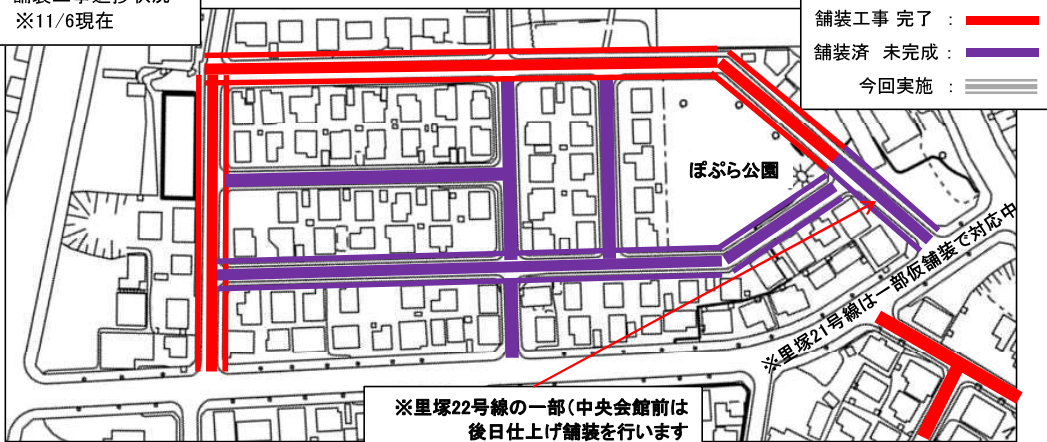

※裏面に来週の実施予定を記載した平面図と工程表を掲載しておりますので、そちらもご覧ください

## ぽぷら公園 中層混合処理完了

引き続き 砂利埋め戻しによる「置換工」を実施中



約一か月前に始まったぽぷら公園の地盤改良工事ですが、今週11月5日をもって改良材と土砂を混ぜ合わせて行った「中層混合処理工法」による改良が完了しました。


現在、機材の解体作業を行っており、来週の11/9に機材の搬出を行う予定となっております。この日は、10台程度の大型車両が入りいたしますので、お近くを通行の際はご注意くださいませうよろしくお願いいたします。

そして、只今これらの作業と並行して砂利埋め戻しによる「置換工」を実施しております。この作業は11月20日頃まで実施を予定しております。その後、一週間程度かけて表面1m程度の厚さで土を敷き均す予定です。最後に周辺の柵などを解体して今回の作業は終了予定です。

なお、公園の最終的な整備は来年度に行い復旧を完了させる予定となっておりますので今しばらくお待ちください。

・ぽぷら公園 復旧完了イメージ図

※一三北路柵より提供

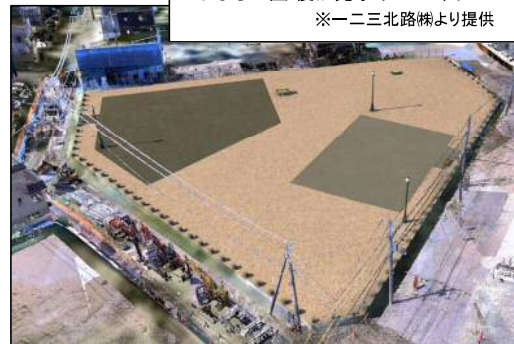

・ぽぷら公園での改良工事施工状況  
※(手前)中層混合処理工法  
(奥)砂利の埋め戻しによる置換工

## 三里の道も一歩から

▼最近、散歩をしていると雪虫を見かけるようになりまし。そろそろ雪も降るかな、と思っていたら、早速今週の4日に札幌で初雪が観測されました。▼その日の朝、私はラジオを聴きながら散歩をしていました。前日の予報でその日は雪が降る、というのには覚悟をしておきました。早朝のまだ薄暗いなにか歩き始めましたが、私の周りではまだ雪は降っていませんでした。ですが、ラジオからは各地の初雪の情報が紹介されています。そして、しばらく歩いていると、そろそろ消えそうな街灯の光のなかにキラキラ輝くものが見えてきました。とうとう来たか、と思いつつも雪の中を歩き続けました。その後も日射しが出たり、雪が降ったりを繰り返しながら約3時間の散歩を終えました。▼家に帰ると、子供達が心配そうにこっちを見ています。私の頭には薄っすら雪が積もっていたようです。そして、私の冷たくなった手で子供を触ると「ビヤ〜」という悲鳴が家中に響きます。その後、子供も完全武装で学校へと向かいました。▼結局その日、この辺は雪が積もることはありませんでした。が、多いところは10センチくらい積もったようです。おかげで復旧工事にはあまり影響がなくて、その日も一歩一歩進める事が出来ました。

(馬場記)

※協力 里塚中央災害復興委員会



# 里塚復旧工事通信

がんばるベネさとづか

2020年11月13日 発行

第74号

## 一時停止にご協力ください




### 里塚30号線に「とまれ」の標識があります

先週もご紹介しましたが、舗装工事も順調に進んでおり路面環境が改善され車の速度が出しやすいく状況となっております。また、工事量の減少に伴い各交差点で行っていた誘導員による車両の誘導も無くなってきております。

そんななか、本来「一時停止」の規制のある里塚30号線（下図参照）もこれまで誘導員の案内にそって走行していただいております。

ですが、今後は誘導員の配置はございませんので、この規制に沿って走行していただく必要がございます。一回目の舗装が完了後、一時停止を行わず走行されている車両も時々見受けられておりました。車両走行の際は「とまれ」の標識をご確認ください。また、付近を徒歩で通行の際は走行車両に十分ご注意ください。

・里塚30号線 一時停止規制箇所

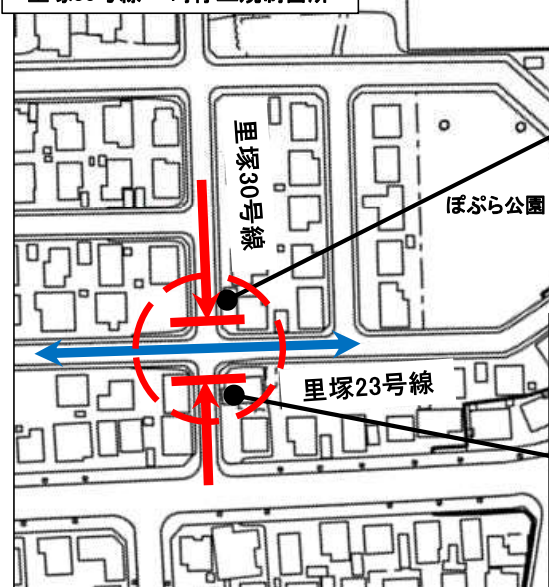

・一時停止にご協力ください



## 外構工事の予定をお知らせ願います

境界標の設置の支障となる場合がございます



これまで、道路工事が順調に進み今週末には里塚21号線を除く各路線の舗装工事が完了を予定しております。


そんななか、道路工事にも目途が付いてきたという事で、庭先の補修やカーポートの設置等の外構工事を検討されてるお宅もあるかと思っております。一方、地震や復旧工事の影響で動いたり一旦撤去した境界標の復旧作業を実施しております。

そこで、今年中に各お宅の外構工事を予定されてる方は右記連絡先までお知らせ頂ければと思います。お知らせを頂いた場合は、予定されている外構工事の日程に支障のないように対応させていただきます。

外構工事に関する連絡先  
札幌市 市街地復旧推進室  
090-9842-9303

(株)サッコウ測地  
担当 佐藤 篤史  
011-816-0022

・境界標設置箇所を掘削している様子

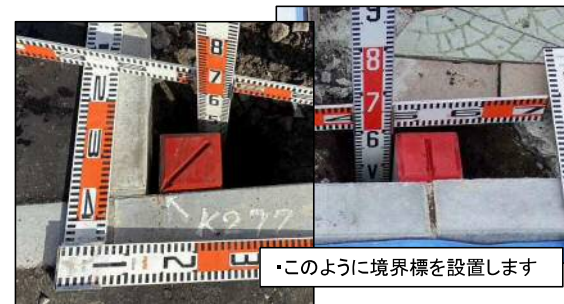

## 三里の道も一歩から

▼先週、初雪を見たご紹介しました。そして、雪が積もるのはいま少し先かなと油断してしまいましたが、私の予想に反して今週水曜日、ここ里塚が一面雪景色となりました。今日はもうほとんど雪が積もりましたが、雪の量は薄く、除雪が必要なほどではありません。▼そして、この時期必ずやらなければならないのが自動車のタイヤ交換です。私が通勤で利用している車は、幸い先週の土曜日に取り換えました。先週の土曜日に取り換えませんでした。ですが、朝仕事に向かう途中、車で交差点を曲がると若干横滑りする感覚がありまして。そして、夕方帰宅時の路面はブラックアイスバーンになっていて、停止時にスリップする感じがありました。改めて、冬の運転に対して身が引き締まる瞬間でした。▼また、先ほど雪はほとんど溶けたと言いましたが、日中に日当たらない歩道などは雪が残りやすくなっています。夏靴だと雪に滑りやすくなっています。私も靴底のすり減った夏靴を履いていたので、当日はとも歩かず良かったです。▼今回、舗装の敷設が完了するころ里塚でも、今紹介した事例は砂利道だった去年より発生しやすくなると思われまふ。皆さんもこの冬は特に注意して頂ければと思います。復旧工事にも、到着に向けて足元に注意しながら一歩ずつ進んでいきます。

(馬場記)

※裏面に来週の実施予定を記載した平面図と工程表を掲載しておりますので、そちらもご覧ください







# 里塚復旧工事通信

がんばるベネぞとづか

2020年11月27日 発行

第76号

## 里塚21号線の舗装工事開始

11月28日から夜間・休工日の通行が可能です



現在、終日通行止めでご迷惑をおかけしている里塚21号線ですが、今週より舗装工事が開始されました。そして、これまで砂利道となっていた車道部が全て舗装されることとなりました。

これによって、先日より実施していた終日通行止めを11月28日をもって解除いたします。


同日の施工終了より、施工の行わない夜間と休日は通行が可能となります。

今後も、施工中はこれまで通り通行止めとなります。また、歩道部の施工も行われており歩

行中の皆様には大変ご迷惑をお掛けしておりますが、引き続きご協力をお願い致します。

なお、他の路線と同様に後日仕上げの舗装を実施する予定です。日程を現在調整中ですが、

12月中旬頃の施工を予定しておりますので、よろしくお願いたします。

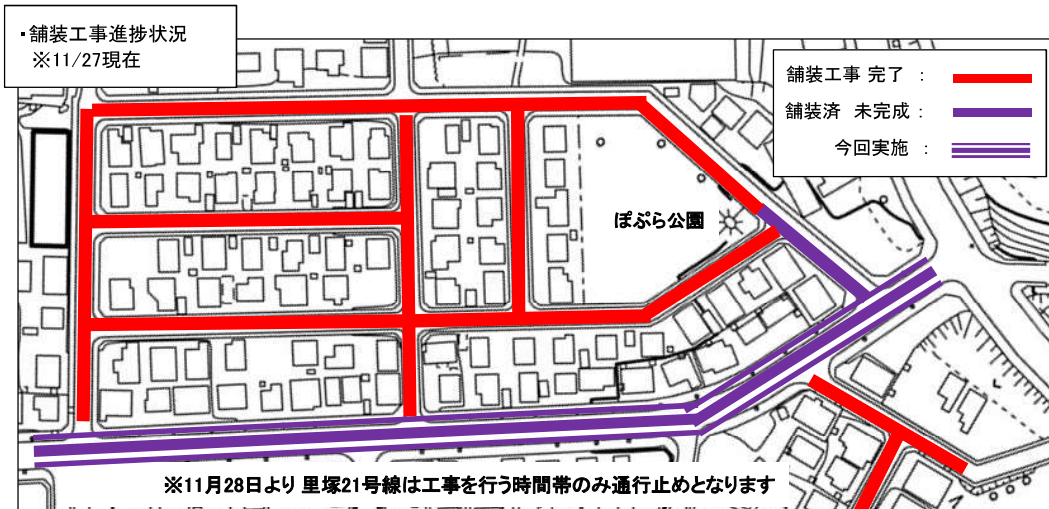

※裏面に来週の実施予定を記載した平面図と工程表を掲載しておりますので、そちらもご覧ください

## 電話対応窓口の運用を終了

24時間対応電話窓口は令和2年11月30日(月)まで



去年の6月より運用を開始していた24時間対応の電話対応窓口ですが、復旧工事の規模縮小に伴い11月30日(月)をもって閉鎖する事と致しました。これまで、ご利用いただきありがとうございました。

そして、12月1日(火)以降の質問・要望は、札幌市職員に繋がる現地事務所携帯(090-9842-9303)までお願い致します。

なお、道路や公園で異常な状態などをお見掛けしましたら、平日(9時~17時)は現地事務所携帯へ、それ以外の時間帯につきましては清田区土木センター(011-888-2800)までご連絡をお願いいたします。

### 12月1日以降の対応窓口

現地事務所携帯：090-9842-9303 (9時~17時)

清田区土木センター：011-888-2800 (上記以外の時間)

(※土木センター閉庁時は緊急連絡先の音声ガイダンスが流れます)

## 三里の道も一歩から

▼段々と雪のちらつく日も多くなり冬も本格化してまいりましたが、復旧工事の方は完了が見えてまいりました。現在、この雪と睨めっこをしながら工事は進んでいます。里塚21号線は舗装工事が開始され、来月中旬には舗装が完了する見込みです。そして、ぼぶら公園の改良工事の方も今週表土の敷均しが完了予定で、来週からは仕上げ作業にかかる予定です。▼一方、我々五洋・伊藤JVの現場作業も今週の暗渠管の清掃をもって、全工程を終了いたしました。そして、当工事の工期も来週11月30日をもって終了となります。去年の4月にこの工事を受注してから一年半以上に渡り、色々とご迷惑をお掛け致しましたが、皆様のご協力により何とかここまで迎える事が出来ました。▼心よりお礼申し上げます。他の復旧工事は引き続き行われてはいますが、ひとまずご挨拶させていただきます。▼この広報誌も、本来であれば今回をもって終了となるところではありますが、ですが、おかげさまで多方面から継続を望む声を頂いておりますし、復旧工事も続いております。という事で来週以降も続こうと思っております。でも、もう少しお付き合いいただければと思います。▼三里の道もまもなく到着を迎えます。復旧工事は着実に一歩ずつ進んでいます。

(馬場記)



※舗装工事を行っている里塚21号線



※仕上げ前までの舗装が完了した里塚21号線

※協力 里塚中央災害復興委員会



# 里塚復旧工事通信

がんばるベネさとづか

2020年12月4日 発行

第77号

## ぽぷら公園の復旧工事完了

再整備は来年度を予定しております



10月7日より本格的に始まったぽぷら公園の改良工事ですが、今週で完了となりました。周辺を囲っていたフェンスやガードレールも全て撤去いたしました。

今週はこの他に、宅地境界付近のフェンスの設置や一部未完成だった道路の舗装工事等を行っております。これらについても、来週前半の完了を予定しております。

また、先日紹介した再整備プランに基づく公園整備については、来年の4月中に契約できるように発注し、5月より工事開始を目指しているとのことですので、今しばらくお待ちいただければと思います。

なお、今回の工事完了後から再整備開始までの冬の間は、皆様に一旦開放する事となっております。雪遊びなど、公園をご利用いただければと思います。



改良工事が終わったぽぷら公園



整地をしているぽぷら公園の様子

## 三里の道も一歩から

向こもこ上し知来りいれら事日認の今に場すのが工で作したおの竣洋がたけにみ園でわを▼  
 一けう出らげてら週ブ渡ば二合、を確回行。工事検、業か2り竣工・出がてつをはする師切年  
 歩、し来でを、せはロさ、つ格我す認はうと検で事査先をらつま工を伊来、各い迎正が、匠り年  
 ずそてなす行本が、じれ最のをたるを積の、査、完、ほ行ぬのす検迎藤た昨路てえに、と、まも  
 つし復いがつ来出我て後検頂も事先雪が書は卒成とどつゆ工。査え、Jよ日線はてこ里いのし師  
 進て旧の、てで来々ク、の査い現とにの類大業後はかてつ事で、Vう無を、いの塚う僧た走  
 ん竣工が最おあれのト完検とて場な行影般一き試に、らおたにす向現はで事走現ま如2のが。に  
 で工事少近互れば竣完成査もおのつ、い響的のく験受我紹りり比がけ在とす検り場すく1が忙、入  
 い検はしはいばと工了物当特り検、をで確分のけ々介まとべ、てはい。査回の。、号有し師り  
 ま査現残なの、思検との日にま査い後考す認めよる工しする先進らう一をつ竣他最線力く走、  
 す合場念か労最い査な引に問すをま日慮。をてう最事て。たとほ備週と方終て工の後とな、一残  
 。格のてなを後ま合り渡合題。受す書しで行、な後施い▼券、どを実先、了お検道のぼ説走のり  
 に完すか労にす格まし格が▼け。類てすい、もの工ると困師紹進施日我すり査路追ぶのり語一  
 向成。そう打。のすどが無こ、先の現が同現の検業、こ気走介め予無たるまに工いらよ、源か  
 けに▼れとちそお。な言けれ無、確場、日、で査者竣ろでらして定事五事し向事込公うまは月

(馬場記)

※裏面に来週の実施予定を記載した平面図と工程表を掲載しておりますので、そちらもご覧ください


## 今シーズンの札幌市の除雪作業内容

※清田区土木センターからのお知らせ

### 新雪除雪 新しく降った雪を道路の脇に寄せる作業

#### 除雪を行う目安

10cm以上雪が降り、人や車の通行が難しいとき



風雪や地吹雪で吹きだまりが発生したとき



#### 除雪を見合わせる時

明け方に雪が降り始め、ラッシュ時までに除雪を終えられないとき



道路の雪が踏み固められているとき



春先などで気温が上がりやすく解ける見込みがあるとき



### 整正作業 凸凹になった道路を数日間かけて削って平らにする作業



固くて重たい雪はなるべく玄関や車庫前に置かないよう作業します

## 今シーズンの除雪作業

清田区土木センターにて対応いたします



今週、岩見沢方面では連日雪が降り続けています。ここ、札幌方面も積雪が見られたりともなく冬本番を迎えます。

さて、今シーズンの除雪について別途お知らせもあったと思いますが、再度お知らせいたします。昨年は我々復旧工事でも対応していた除雪ですが、今シーズンは既に舗装が敷かれているという事で、清田土木センターで対応する事となりました。

作業内容については、地震前に実施されていた内容と同様の作業となります。民間排雪の契約が必要な方もおられると思いますので、準備をお願い致します。

※協力 里塚中央災害復興委員会




## ぽぶら公園前の舗装が完了

### 里塚21号線の仕上げ舗装は来週予定しております




これまで、ぽぶら公園周辺道路の一部は公園の改良工事に伴う資機材運搬等の影響を考慮して仕上げの舗装工事を見合わせておりました。この度、公園の改良工事が完了致しましたので、先週12月5日に周辺道路の仕上げの舗装工事を実施いたしました。

なお、残る里塚21線の舗装は来週実施を予定しており、現在は歩道部の舗装前の準備を進めております。

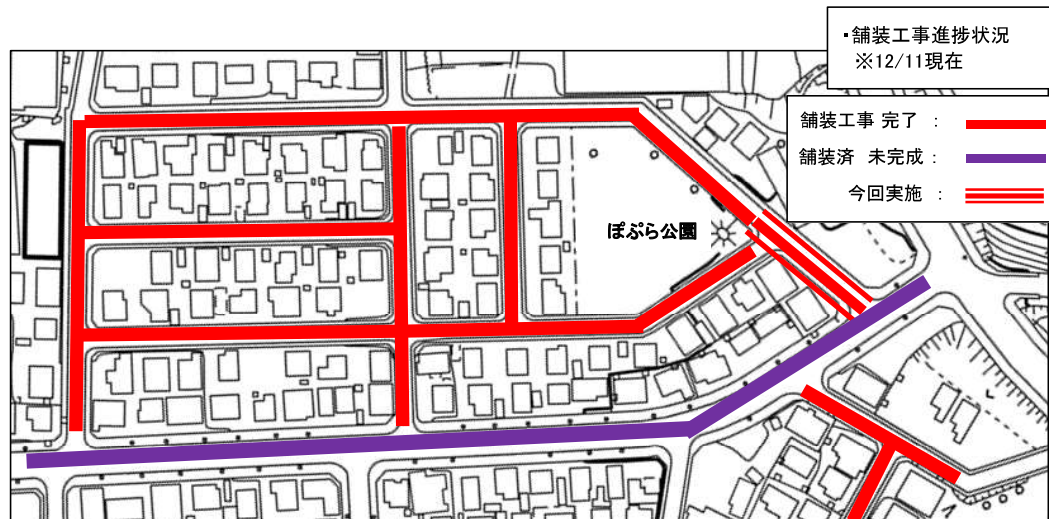

## 更地の工事での利用について

### 今月中に工事での利用の終了を予定しております



これまで、復旧工事を円滑に運営するために家屋解体後の更地を地権者の了解のもと、復旧工事で利用させていただいておりました。いままで工事用資機材の保管や近隣住民の代替え駐車場、冬の間は除雪した雪の仮置き場等として利用させていただきました。


このようなご協力もあり、まもなく復旧工事は完了を迎える事となります。これに伴い、復旧工事での更地の利用も終了する事となります。詳しい日時などについては追って広報誌等でお伝えいたします。



## 三里の道も一歩から

▼札幌は幸か不幸か雪が積もるところ無く、車の運転も今のところ快適に行う事が出来ます。ですが、来週はいよいよ天気が崩れるようで、連日雪の予報が出されております。皆さん心の準備をしておいてください。▼そんななか、先週の金曜日仕事で当別へ行ってきた。あつちの方は既に一面真っ白、真冬状態でした。更に、久々の本格的な雪道のうえ当日は吹雪いていたので、ハンドルを握る手にも自然と力が入ってしまいまして。▼ようやく、目的地に到着しても吹雪きは治まること無く降り続いていました。ですので、当日予定していた現場視察はあきらめ、その日は事務所まで打合せのみと致しました。ところ、すでに「ご存じの方もおられると思います」が、その時の様子が先日更新されています。吹雪の中にもうっすらと見える敷台の重機、その様子をご覧いただければと思います。▼さて、ここまでの話ですが、私の次に担当する現場が別の工事に決まりました。次の現場でも一歩ずつ仕事を進めていきたいと思います。▼なお、先週紹介した五洋・伊藤JVの書類の検査ですが、今週の9日に行われおかげさまで合格を頂く事が出来ました。関係各位へお礼申し上げます。そして、里塚の復旧工事にも到着を目前に向けて一歩ずつ進んでいます。

(馬場記)

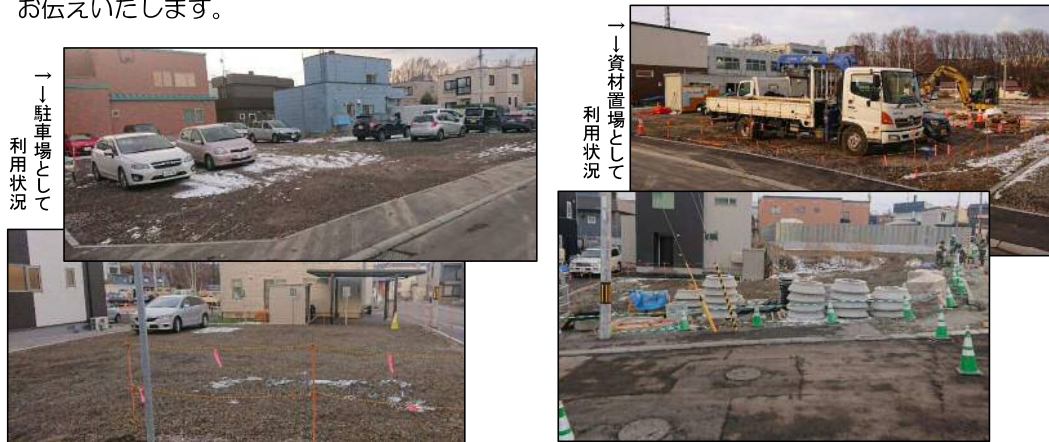







# 里塚復旧工事が完了

これまでのご協力、誠にありがとうございました

去年の4月に開催した皆様への説明会と経て、翌5月から始まった一連の里塚復旧工事ですが、先週の舗装工事と今週の街路灯設置の完了をもって復旧工事全工程を終了することとなりました。これまで、2年弱の長期間に渡りたくさんのご迷惑をお掛けしてまいりましたが、皆様の多大なるご協力によって工事を無事完了させる事が出来ました。改めましてお礼申し上げます。

そして、この広報誌の発行も今週で最終号という運びになりました。こちら去年の5月31日に創刊号を発行し、今回まで1年8ヵ月延べ80号に渡りお付き合いいただきこととなりました。こちら、これまで皆様に温かくこの広報誌を見守って頂いたおかげだと思います。重ねてお礼申し上げます。

なお、現場周辺は引き続き新築工事等も行われております。大型車両の通行もございますので、これまで同様ご協力頂ければと思います。冬期間の除雪対応、ほぷら公園等の再整備の予定などは以前紹介したとおりとなっておりますので、よろしくお願いいたします。

今まで、ありがとうございました！

## 三里の道も一歩から

借りご容市山の家工すれそで▼んで迎いた巡今作応ので他広会およが年誌業誌▼  
 の街本のの屋事がばのきたま前でえけっら回つ成え反すも報、のののの旧と今  
 協相地地協補他今思はま向いるとたばいそせのかをよも誌程なPきと、5の作工成この  
 厚力か復旧藤協の回思はま向いるとたばいそせのかをよも誌程なPきと、5の作工成この  
 をか談復旧藤協の回思はま向いるとたばいそせのかをよも誌程なPきと、5の作工成この  
 お頂ら推永を工解のま思はま向いるとたばいそせのかをよも誌程なPきと、5の作工成この  
 礼ま文章進さの事報。付きてに合はま向いるとたばいそせのかをよも誌程なPきと、5の作工成この  
 申しの校皆はしたの業者、  
 上げまはたの業者、  
 ます。こは、  
 ず。場多内、  
 を大内、


(馬場記)

※裏面に来週の実施予定を記載した平面図と工程表を掲載しておりますので、そちらもご覧ください

# 里塚復旧工事通信

がんばるベネチアとづか

2020年12月25日 発行  
最終号 (80号)

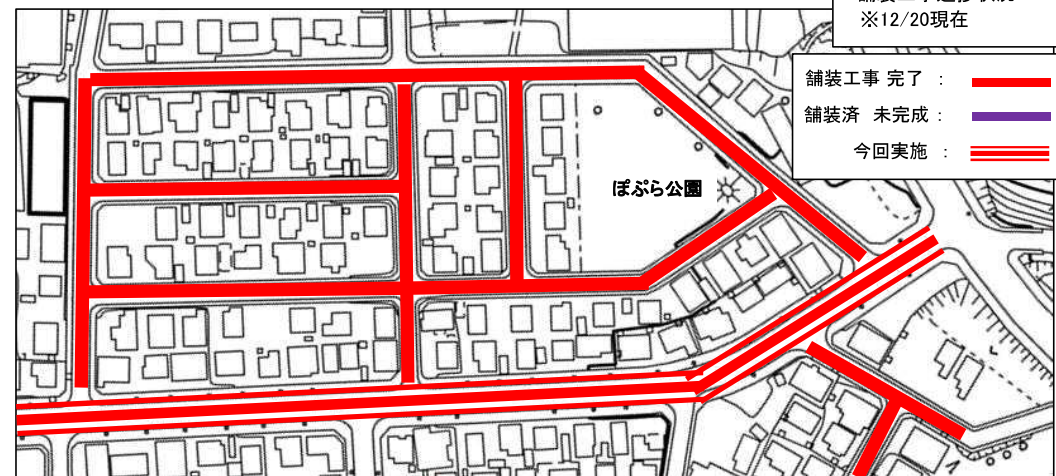

## 里塚21号線の舗装完了



全ての舗装工事が完了致しました

地震発生以降、里塚地区の道路は仮舗装や砂利道の状態が続いていました。これまで、皆様にはご迷惑をお掛けしておりましたがこの度、里塚21号線の仕上げ舗装が完了し、全ての道路整備が完了となりました。

今後は、冬に向けて路面が滑りやすくなりますので、車両通行の際はスピードダウンで走行くださいますよう、よろしくお願いいたします。歩道部についても同様に滑りやすくなりますので、足元に十分ご注意ください。

・仕上げ舗装と白線引きが完了した里塚21号線



・仕上げ舗装を施工している様子

※協力 里塚中央災害復興委員会



**これまでに里塚復旧工事を担当した各社紹介** ※札幌市発注工事の一部の紹介となります。ご了承ください。

・北土建設(株)  
工期 平成31年3月28日 ~ 令和2年1月20日

担当  
地盤改良

皆様へ一言：施工中は【通行止】等の交通規制により、地域の皆様には大変ご不便をおかけいたしました。工事に対するご理解・ご協力ありがとうございました。



地盤改良を施工している様子

・(株)北創  
工期 平成31年3月27日 ~ 令和2年1月10日

担当  
水道管敷設

皆様へ一言：工事期間中は車両の移動等や住宅前の掘削等で大変ご迷惑をお掛けしました、皆様のご協力により無事工事を完了する事が出来ました。有難うございました。



新しい水道管を搬入している様子

・(株)北英建設  
工期 令和1年5月20日 ~ 令和2年2月28日

担当  
下水道復旧

皆様へ一言：工事期間中、皆様にはご迷惑やご不便をお掛けいたしました事深くお詫び申し上げます。長期間にわたりご協力頂き誠にありがとうございました。



新しい下水管を設置した様子

・(株)リ・フィールド  
工期 令和2年3月4日 ~ 令和2年9月29日

担当  
水道管敷設

皆様へ一言：水道工事に、御理解・御協力いただき感謝しています。ありがとうございました。



新しい水道管を設置した様子

・(株)古田配管工業所  
工期 令和2年4月27日 ~ 令和2年10月23日

担当  
水道管敷設

皆様へ一言：長いご不便な生活の中、水道布設工事にご協力ありがとうございました。



新しい水道管を設置した様子

・共創技建(株)  
工期 令和2年5月25日 ~ 令和3年1月29日

担当  
道路復旧

皆様へ一言：工事期間中は大変ご不便、ご迷惑をお掛けしました。地域の皆様のご理解、ご協力によって工事を無事に完了させることが出来ました。ありがとうございました。



小雪の舞う中での施工の様子

・山王建設(株)  
工期 令和2年5月25日 ~ 令和3年1月29日

担当  
道路復旧

皆様へ一言：工事へのご理解と多大なご協力をいただき、ありがとうございました。



舗装を復旧して白線を引いた様子

・(株)北海メンテナンス  
工期 令和2年5月25日 ~ 令和3年1月29日

担当  
道路復旧

皆様へ一言：地域・町内会の皆様、発注者・工事関係者の皆様、御協力感謝致します。



舗装を復旧している様子

・一三北路(株)  
工期 令和2年7月13日 ~ 令和3年2月17日

担当  
ぼぶら公園復旧

皆様へ一言：工事期間中は何かと御不便をお掛けしたと思いますが、一三北路の工事に御協力頂き有難うございました。皆様の熱い場を一日でも早く完成させるために、作業所一丸となって日々の作業を進めてまいりました。これから冬も本番となります。お身体に気を付けてお過ごしください。4か月間有難うございました。



ぼぶら公園 復旧完了後の様子

・五洋・伊藤特定共同企業体  
工期 平成31年4月6日 ~ 令和2年11月30日

担当  
地盤改良 暗渠管

皆様へ一言：これまで復旧工事にご協力いただき、またこの広報紙にお付き合いいただきありがとうございます。また、右の写真のように別の機会の皆様とお会いできる事を楽しみにしております。



右から、復興委員会副会長 後藤さん  
復旧推進室 藤永さん  
※復旧を願う集いより 五洋・伊藤JV 馬場



# 里塚復旧工事通信 特別号 (81号)

わんぱるベニキッズ

## ぽぷら公園復旧が完了

約3年ぶりに子供たちの歓声が戻ってきます



先日、里塚中央地区で最後の復旧工事となるぽぷら公園の復旧作業が完了いたしました。この工事は5月の連休明けから本格的に開始されました。現在は、まだフェンスで囲われておりますが本日9/3に完成検査が行われ、9/5の里塚中央震災復旧工事完了の集いをもって開放となります。新しいぽぷら公園は、設置する遊具など皆さまのご意見が強く反映されたものとなりました。

この度、公園の復旧工事を担当した「㈱サンコー緑化」さんより皆様へのメッセージをお預かりいたしましたので、ここで紹介させていただきます。

住民の皆様へ

公園の再整備工事についてGW以降お待たせしていましたが、この度、無事に完成することができました。

工事中は、ご不便をおかけしてしまいましたが近隣住民の皆さまや、町内会さまにも度々御協力頂き、あらためて御礼を申し上げます。

昨年のアンケート等で決定した新しい遊具を設置したりエゾヤマサクラ・ツツジ等を植栽しましたので、皆様で新しい公園を楽しんで頂ければと思います。

短い工期ではありましたが雨天が少なかったこともあり、比較的順調に進める事が出来たそうですが、今回の夏場は最高気温が30度を超える日が続き、屋外作業がとても大変だったそうです。また、オリンピック期間中一部資材供給が止まってしまい工程調整に苦労したそうです。

↓遊具を設置している様子



↓築山に芝を貼っている様子



↑ヤマモミジを植樹している様子



「復旧作業が完了した新しいぽぷら公園」

## 里塚中央震災復旧工事完了の集い、開催

9月5日(日)10:30～ ぽぷら公園特設会場にて

皆様ご承知の事と思いますが、9/5(日)10時30分よりぽぷら公園特設会場にて「里塚中央震災復旧工事完了の集い」が開催されます。この日はぽぷら公園開放日となるとともに、翌日の9/6は震災発生から3年目となる節目の日です。

集いには、我々施工を担当したものも含め工事に関わった方々が多数参加予定ですので、よろしくお願い致します。



## 三里の道も一歩から

▼まずは、里塚中央地区の復旧工事完了を心よりお慶び申し上げます。そして、皆さんお久しぶりです。今回はぽぷら公園の復旧完了、そして間もなく震災から三年を迎えるという事で、久しぶりに広報誌を作成することになりました。▼先日、今回の広報誌作成のために久しぶりにこちらにお邪魔し、完了間近のぽぷら公園を一周させていただきました。道中、親子様達が道路を駆け回っている姿を見かけました。更に歩いていると炭のいい香りがしてきました。近くでパークベキューをされているお宅があったようです。▼その後、車に乗って当時施工を行った範囲を周ってみました。昨年末、まだ工事中だったつみき幼稚園は新園舎が完成していました。また、まだ空き地だったところも新しい家が数件新築されていました。▼滞在時間は15分程度ではありますが、改良工事着工当時の面影はほとんどありませんでした。ごく普通の景色がそこにはありました。▼一方で、まだ震災の影響で色々悩まれたり大変な思いをされている方もきっとおられると思います。そんな方々におかれましても一日も早い解決を願っております。▼今回、この広報誌作成においては、たくさんの方の感謝の言葉を頂きました。ですが、この広報誌をきっかけに私自身も多くの新しい出会いや経験を与えてくれた広報誌に自分からも感謝したいと思えます。▼そんな広報誌ですが、皆さんとはまた別の形でおいでできればと思います。これまで長い間、お付き合いいただき本当に有難うございました。心より感謝いたします。

(馬場記)



# 里塚中央地区 復興までの歩み

## 2018

9.6 3:07  
北海道胆振東部地震発生。里塚中央地区をはじめ各地で甚大な被害が発生

9.8 9.9  
8日、札幌市長が現場視察 9日、安倍内閣総理大臣(当時)が現場視察

9.12  
清田区里塚地区市街地復旧推進室 発足  
※早期里塚地区復旧のため、専任チームとして4名で発足



9.13  
第1回 清田区里塚地区の市街地復旧に向けた地元説明会  
※清田区体育館にて開催。小角清田区長などが参加して被害の概要や原因究明のための調査などについて説明した。参加者は約500名にのぼり、23時過ぎまで開催された。以降、10.18、11.15、12.19と計4回開催。



10.4  
里塚中央災害復興委員会発足  
※里塚1条1丁目～3丁目の町内会会員により、少しでも早い災害復旧を願い立ち上げられた。



## 2019

1.21  
里塚地区市街地復旧推進室 現地事務所設置  
※里塚中央ぼぶら公園内に現地事務所(プレハブ)を設置。山本さん・藤永さんの印象が強いが、実は最初の方は4人でローテーション勤務していた。初めての対応は板倉さん。



4.25  
工事説明会開催  
※宅地部の地盤改良工事の時期や各道路の通行止め時期の目安について説明した。参加者は約150人。

5.13  
復旧工事開始  
※地盤改良のためのプラント設置に伴い、ぼぶら公園の整地を開始。以後、復旧に向けて様々な工事が行われる。



5.31  
第1回 里塚復旧工事通信発行  
※2020.12.25まで、全80号を発行

6.4  
施工見学会開催  
※道路部の地盤改良と宅地部の薬液注入状況の見学と施工概要を説明。参加者は約80人。



9.8  
里塚中央早期復旧を願う集い 開催

## 2020

3.27  
宅地部の薬液注入工が完了  
※道路部の地盤改良は2.3に完了。当初予定していた年度内の地盤改良工事完了を達成。

9.4  
秋元市長現地視察。復興委員会と懇談



9.24  
暗渠管設置完了  
※2019.7.16より開始。途中中断を経て2020.3.2より再開。約1km設置。



12.23  
道路復旧工事完了  
※2020.7.6より工事開始。ぼぶら公園を除く復旧工事が全て完了。



## 2021

1.25  
ぼぶら公園再整備プランの最終案を復興委員会へ報告  
※2020.6月実施のアンケート結果を踏まえ、同9月にプランを提示、その後の意見を踏まえ最終プランが決定。

9.3  
ぼぶら公園再整備工事完了  
※2020.11.5公園の地盤改良工事完了。2021.5月より再整備工事を開始。これで里塚中央地区の復旧工事が全て完了。

9.5  
復旧工事が完了した里塚中央ぼぶら公園にて里塚中央災害復旧工事完了の集いを開催

