


東雁来雨水ポンプ場

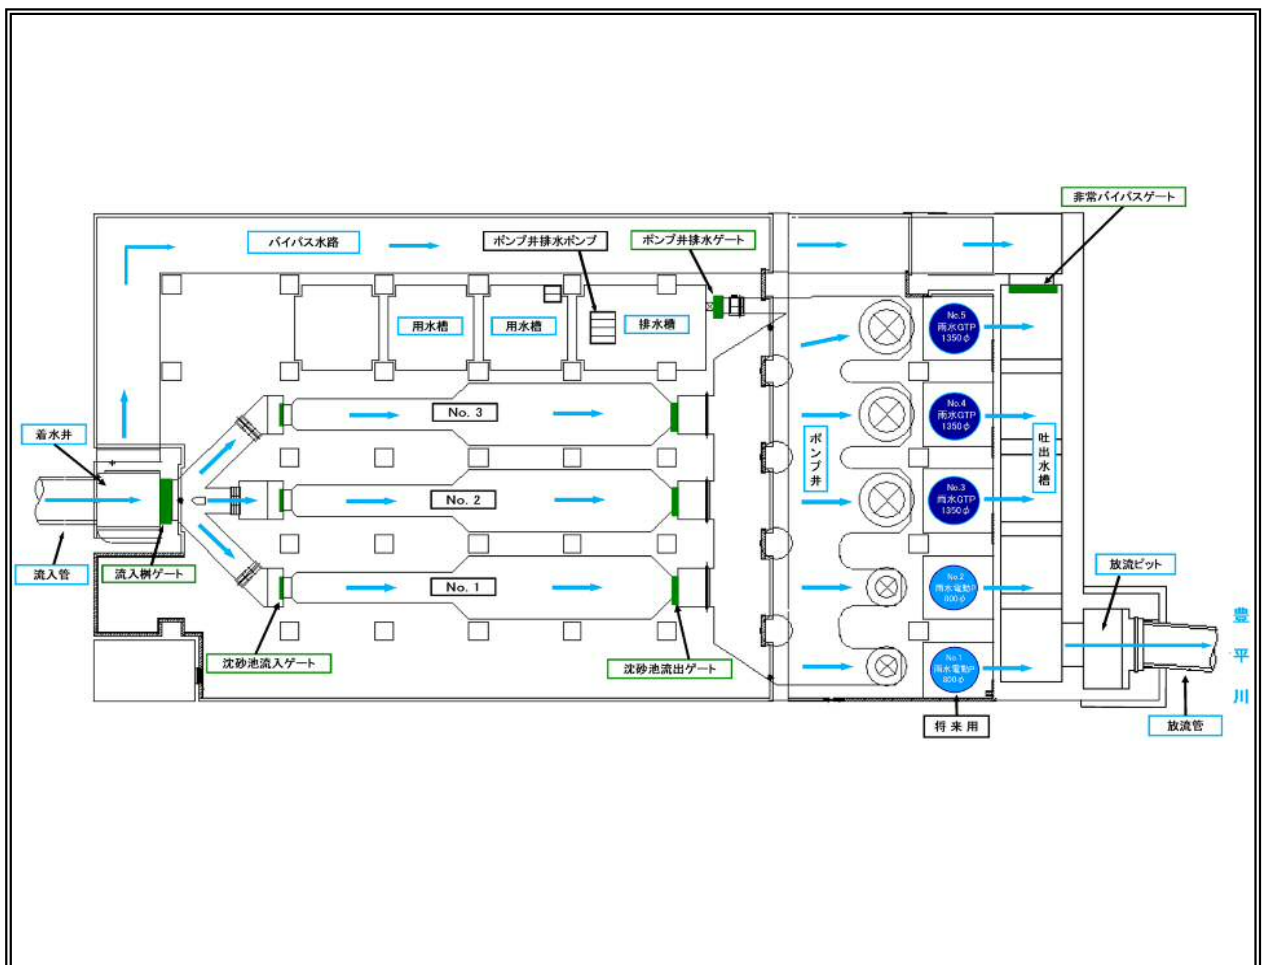

1 運 転 実 績 調

(1) 揚 水 量 等

月	降水量 (mm/月)	総揚水量 (m ³)		雨水放水量 (m ³) (雨水ポンプ)			雨水送水量 (m ³) (排水ポンプ)	
		月量	日量	日数	月量	日量	月量	日量
4	97.5	19,000	630	2	16,420	540	2,580	90
5	67.0	5,840	190	2	5,730	190	110	0
6	40.0	11,110	370	2	7,920	260	3,190	110
7	7.5	1,180	40	0	0	0	1,180	40
8	78.0	23,110	750	1	18,840	610	4,270	140
9	36.0	10,140	340	1	7,860	260	2,280	80
10	75.5	5,020	160	0	0	0	5,020	160
11	93.5	41,430	1,380	2	37,590	1,250	3,840	130
12	108.5	6,860	220	1	5,760	180	1,100	40
1	170.0	1,150	40	0	0	0	1,150	40
2	112.0	0	0	0	0	0	0	0
3	54.5	5,730	180	1	3,560	110	2,170	70
合計	940.0	130,570	—	12	103,680	—	26,890	—
平均	78.3	10,880	360	1	8,640	290	2,240	70
最大	4/18 44.0	—	11/9 33,160	—	—	11/9 33,160	—	6/2 2,140
最小	—	—	—	0	—	—	—	—

月	動力別揚水量 (m ³)			沈砂・スクリーンかす量 (m ³)		
	電動機	エンジン	計	沈砂	スクリーンかす	計
4	19,000	0	19,000	0.0	0.0	0.0
5	5,840	0	5,840	0.0	0.0	0.0
6	11,110	0	11,110	0.0	0.0	0.0
7	1,180	0	1,180	0.0	0.0	0.0
8	21,150	1,960	23,110	0.0	0.0	0.0
9	8,860	1,280	10,140	0.0	0.0	0.0
10	5,020	0	5,020	0.0	0.0	0.0
11	32,300	9,130	41,430	0.0	0.0	0.0
12	6,860	0	6,860	0.0	0.0	0.0
1	1,150	0	1,150	0.0	0.0	0.0
2	0	0	0	0.0	0.0	0.0
3	5,730	0	5,730	3.2	0.1	3.3
合計	118,200	12,370	130,570	3.2	0.1	3.3
平均	9,850	1,030	10,880	0.3	0.0	0.3
最大	11/9 24,030	11/9 9,130	—	—	—	—
最小	—	—	—	—	—	—

(3) 電力使用量

月	電 力 使 用 量			
	水 処 理 量 (動 力)			
	場 水 量			
	雨 水 ポ ン プ			
	水 量 (m ³)	買 電 (kWh)	発 電 (kWh)	使 用 量 / 水 量
4	13,970	948	0	0.0679
5	1,660	102	0	0.0614
6	3,220	221	0	0.0686
7	0	20	0	—
8	14,600	818	0	0.0560
9	5,000	281	0	0.0562
10	0	6	0	—
11	28,460	1,670	0	0.0587
12	4,250	247	0	0.0581
1	0	9	0	—
2	0	0	0	—
3	2,480	163	0	0.0657
合計	73,640	4,485	0	—
平均	6,140	374	0	0.0609
最大	28,460	1,670	—	0.0686
最小	0	0	—	0.0560

月	電 力 使 用 量						
	そ の 他		光 熱 水 費	合 計			
	買 電 (kWh)	発 電 (kWh)	買 電 (kWh)	買 電 (kWh)	発 電 (kWh)	使 用 量 (kWh)	発 電 量 の う ち 試 運 転 分 (kWh)
4	13,656	0	3,628	18,232	0	18,232	0
5	12,784	0	2,510	15,396	0	15,396	0
6	11,783	0	2,918	14,922	0	14,922	0
7	11,979	0	3,671	15,670	0	15,670	0
8	14,179	0	2,921	17,918	0	17,918	0
9	11,122	0	4,067	15,470	0	15,470	0
10	11,666	0	4,750	16,422	0	16,422	0
11	14,096	0	3,117	18,883	0	18,883	0
12	14,414	0	5,069	19,730	0	19,730	0
1	15,031	0	6,082	21,122	0	21,122	0
2	14,639	0	5,689	20,328	0	20,328	0
3	15,497	0	4,674	20,334	0	20,334	0
合計	160,846	0	49,096	214,427	0	214,427	0
平均	13,404	0	4,091	17,869	0	17,869	0
最大	15,497	0	6,082	21,122	—	21,122	—
最小	11,122	0	2,510	14,922	—	14,922	—

(4) 重油使用量・その他(用水)

月	重油							
	動力				自家発電機			
	雨水ポンプ			使用量 / 水量	燃料使用量(L)		合計 使用量(L)	
	水量 (m ³)	燃料使用量(L) 実運転	燃料使用量(L) 試運転		実運転	試運転	実運転	試運転
4	0	0	182	—	0	5	0	187
5	0	0	0	—	0	0	0	0
6	0	0	353	—	0	9	0	362
7	0	0	162	—	0	5	0	167
8	1,960	254	166	0.2143	0	4	254	170
9	1,280	126	174	0.2344	0	4	126	178
10	0	0	172	—	0	5	0	177
11	9,130	557	125	0.0747	0	5	557	130
12	0	0	174	—	0	4	0	178
1	0	0	206	—	0	5	0	211
2	0	0	0	—	0	0	0	0
3	0	0	367	—	0	13	0	380
合計	12,370	937	2,081	—	0	59	937	2,140
平均	1,030	78	173	0.0757	0	5	78	178
最大	9,130	557	367	0.2344	0	13	557	380
最小	0	0	0	0.0747	0	0	0	0

月	その他	
	用水	
	水道水 使用量 (m ³)	井戸水 使用量 (m ³)
4	0	842
5	0	484
6	1	293
7	1	743
8	0	107
9	2	450
10	1	137
11	0	844
12	1	49
1	0	770
2	0	868
3	1	357
合計	7	5,944
平均	1	495
最大	2	868
最小	0	49

2 決算状況調

(1) 処理区分別決算内訳

(単位 円)

項目	管理費	水処理費	計	比率
職員数	0人	0人	0人	—
給料	0	0	0	0.0%
手当等	0	0	0	0.0%
法定福利費	0	0	0	0.0%
人件費計	0	0	0	0.0%
被服費	0	0	0	0.0%
備消耗品費	0	0	0	0.0%
光熱水費	0	0	0	0.0%
印刷製本費	0	0	0	0.0%
通信運搬費	0	—	0	0.0%
賃借料	0	0	0	0.0%
手数料	0	—	0	0.0%
委託料	0	0	0	0.0%
修繕費	0	10,213,720	10,213,720	52.5%
動力費	0	9,248,273	9,248,273	47.5%
薬品費	0	0	0	0.0%
損害保険料	0	0	0	0.0%
負担金	0	0	0	0.0%
自動車重量税	0	0	0	0.0%
経費計	0	19,461,993	19,461,993	100.0%
合計	0	19,461,993	19,461,993	100.0%
比率	0.0%	100.0%	100.0%	—

(2) 修繕工事等内訳

直接修繕

場所	区分	修繕件名	金額 (千円)	工期	作業内容
計			0		

区分別集計	A	0 件	0 千円	建物
	B	0 件	0 千円	構築物
	C	0 件	0 千円	機械及び装置
	D	0 件	0 千円	車両運搬具
	E	0 件	0 千円	工具器具及び備品

請負修繕

場所	区分	修繕件名	金額 (千円)	工期	作業内容
その他	C	防災・安全交付金事業茨戸水再生プラザ2系反応タンクほか機械設備工事	4,488	12/21 ~ 3/15	井水除砂装置設置
	C	豊平川水再生プラザ第1処理施設汚水ポンプ用電動機ほか修繕工事	10,318	8/30 ~ 3/8	監視制御装置の修繕
計			14,806		

区分別集計	A	0 件	0 千円	建物
	B	0 件	0 千円	構築物
	C	2 件	14,806 千円	機械及び装置
	D	0 件	0 千円	車両運搬具
	E	0 件	0 千円	工具器具及び備品
