


藤野中継ポンプ場

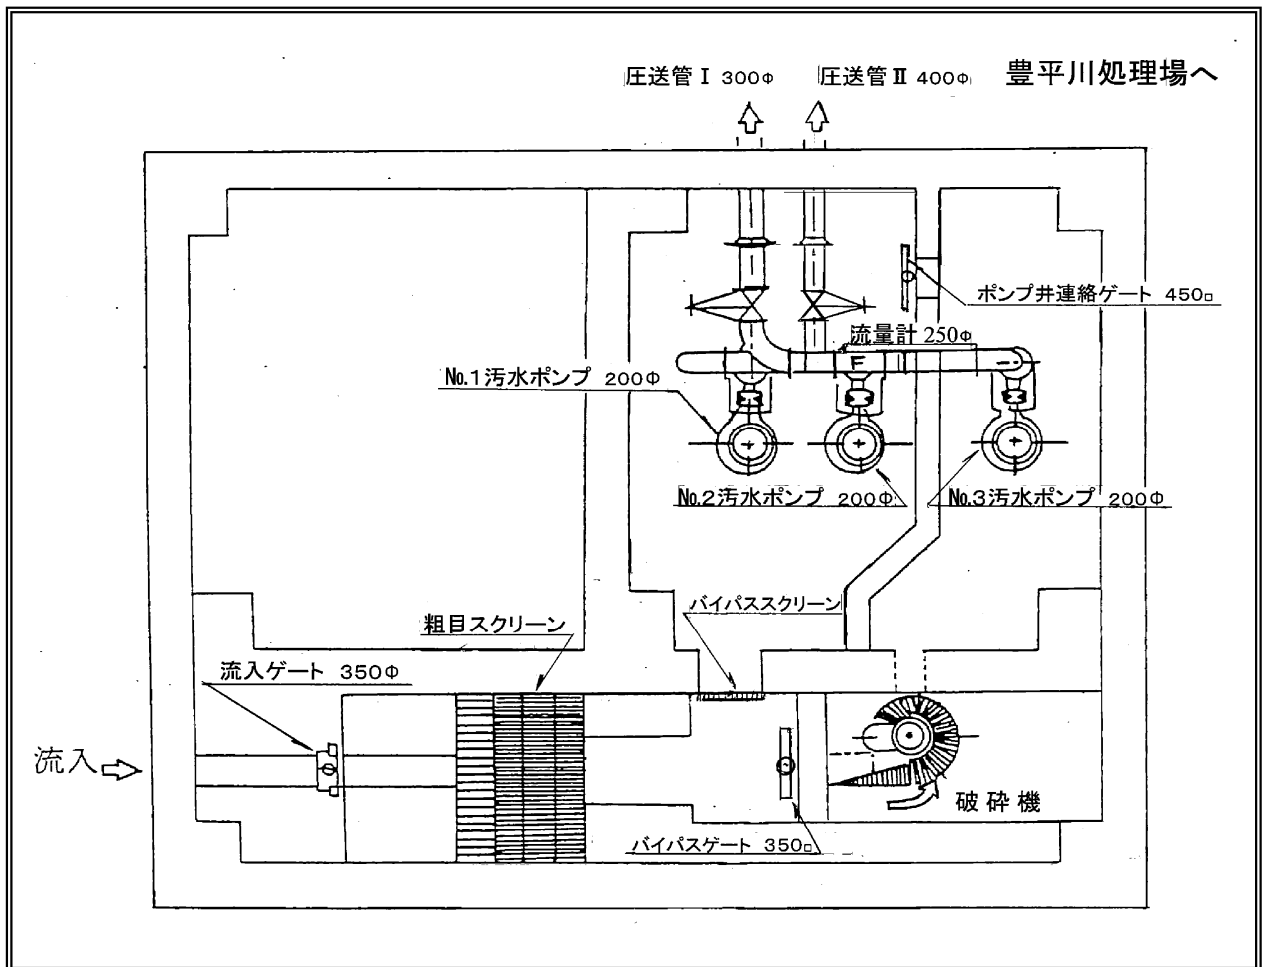

1 運 転 実 績 調

(1) 揚水量等

月	降水量 (mm/月)	総揚水量 (送水量) (m ³)		晴天時汚水量 (m ³)		電動機 による 揚水量 (m ³)	沈砂・スクリーンかす量		
		月量	日量	月量	日量		沈砂量 (m ³)	スクリーンかす (m ³)	計 (m ³)
4	15.5	58,670	1,960	48,900	1,630	58,670	0	0	0
5	88.0	35,920	1,160	33,170	1,070	35,920	0	0	0
6	77.0	33,280	1,110	31,800	1,060	33,280	0	0	0
7	83.5	36,870	1,190	34,100	1,100	36,870	0	0	0
8	236.5	48,890	1,580	35,650	1,150	48,890	0	0	0
9	103.0	36,520	1,220	32,700	1,090	36,520	0	0	0
10	100.0	38,450	1,240	34,100	1,100	38,450	0	0	0
11	95.0	35,810	1,190	30,900	1,030	35,810	0	0	0
12	150.0	35,820	1,160	34,410	1,110	35,820	0	0	0
1	76.5	35,370	1,140	34,100	1,100	35,370	0	0	0
2	89.0	31,060	1,110	31,060	1,120	31,060	0	0	0
3	43.5	64,760	2,090	34,720	1,120	64,760	0	0	0
合計	1,157.5	491,420	—	415,610	—	491,420	0	0	0
平均	96.5	40,950	1,350	34,630	1,140	40,950	0	0	0
最大	8/16 86.5	—	8/16 5,560	—	4/11 2,440	8/16 5,560	—	—	—
最小	—	—	6/23 970	—	5/20 980	6/23 970	—	—	—

(2) 運転時間

月	汚水ポンプ運転時間 (h) 4.75m ³ /分×3台				自家用発電機 運転時間(h) 200 kVA		
	No. 1	No. 2	No. 3	計	実運転	試運転	計
4	0.0	2.9	180.5	183.4	0.0	0.2	0.2
5	110.7	3.5	6.2	120.4	0.0	0.2	0.2
6	1.9	109.8	0.4	112.1	0.0	0.2	0.2
7	1.0	2.2	120.1	123.3	0.0	0.2	0.2
8	153.1	2.9	2.4	158.4	0.1	0.5	0.6
9	1.6	119.4	0.5	121.5	0.0	0.3	0.3
10	0.0	9.3	117.1	126.4	0.0	0.2	0.2
11	116.6	0.2	1.8	118.6	0.2	0.2	0.4
12	1.9	117.8	0.0	119.7	0.0	0.3	0.3
1	0.0	13.4	102.4	115.8	0.0	0.2	0.2
2	102.3	0.0	1.7	104.0	0.0	0.2	0.2
3	1.4	199.5	0.0	200.9	0.0	0.2	0.2
合計	490.5	580.9	533.1	1,604.5	0.3	2.9	3.2
平均	40.9	48.4	44.4	133.7	0.0	0.2	0.3
最大	153.1	199.5	180.5	200.9	0.2	0.5	0.6
最小	0.0	0.0	0.0	104.0	0.0	0.2	0.2

(3) 電力使用量等

月	電 力 量							
	動 力 費							
	汚水ポンプ			その他		合 計		
	買 電 (kWh)	発 電 (kWh)	使用量 /水量	買 電 (kWh)	発 電 (kWh)	買 電 (kWh)	発 電 (kWh)	使用量計 (kWh)
4	8,254	0	0.1407	1,494	0	9,748	0	9,748
5	5,419	0	0.1509	1,462	0	6,881	0	6,881
6	5,045	0	0.1516	1,262	0	6,307	0	6,307
7	5,549	0	0.1505	1,276	0	6,825	0	6,825
8	7,129	7	0.1460	2,193	0	9,322	7	9,329
9	5,468	0	0.1497	1,646	0	7,114	0	7,114
10	5,689	0	0.1480	1,302	0	6,991	0	6,991
11	5,337	1	0.1491	1,480	0	6,817	1	6,818
12	5,387	0	0.1504	1,381	0	6,768	0	6,768
1	5,211	0	0.1473	1,254	0	6,465	0	6,465
2	4,681	0	0.1507	1,260	0	5,941	0	5,941
3	9,041	0	0.1396	1,725	0	10,766	0	10,766
合計	72,210	8	—	17,735	0	89,945	8	89,953
平均	6,018	1	0.1470	1,478	0	7,495	1	7,496
最大	9,041	7	0.1516	2,193	0	10,766	7	10,766
最小	4,681	0	0.1396	1,254	0	5,941	0	5,941

月	電 力 量					灯油使用量			その他
	光熱水費	使用量合計				自家用発電機			用 水 水道
	買 電 (kWh)	買 電 (kWh)	発 電 (kWh)	使用量計 (kWh)	発電使用量の うち試運転分 (再掲) (kWh)	実運転 (L)	試運転 (L)	合計 (L)	使用量 (m ³)
4	197	9,945	0	9,945	0	0	16	16	3
5	194	7,075	0	7,075	0	0	18	18	6
6	157	6,464	0	6,464	0	0	15	15	20
7	192	7,017	0	7,017	0	0	15	15	4
8	173	9,495	7	9,502	0	10	37	47	2
9	180	7,294	0	7,294	0	0	19	19	3
10	165	7,156	0	7,156	0	0	18	18	2
11	224	7,041	1	7,042	0	16	17	33	3
12	310	7,078	0	7,078	0	0	18	18	2
1	394	6,859	0	6,859	0	0	15	15	2
2	299	6,240	0	6,240	0	0	19	19	1
3	276	11,042	0	11,042	0	0	16	16	3
合計	2,761	92,706	8	92,714	0	26	223	249	51
平均	230	7,726	1	7,726	0	2	19	21	4
最大	394	11,042	7	11,042	0	16	37	47	20
最小	157	6,240	0	6,240	0	0	15	15	1

2 決 算 状 況 調

(1) 処理区分別決算内訳

(単位 円)

項 目	管 理 費	水 処 理 費	計	比 率
職 員 数	0 人	0 人	0 人	-
給 料	0	0	0	0.0%
手 当 等	0	0	0	0.0%
法 定 福 利 費	0	0	0	0.0%
人 件 費 計	0	0	0	0.0%
被 服 費	0	0	0	0.0%
備 消 耗 品 費	0	0	0	0.0%
光 熱 水 費	0	0	0	0.0%
印 刷 製 本 費	0	0	0	0.0%
通 信 運 搬 費	0	-	0	0.0%
賃 借 料	0	0	0	0.0%
手 数 料	0	-	0	0.0%
委 託 料	0	0	0	0.0%
修 繕 費	0	0	0	0.0%
動 力 費	0	4,710,663	4,710,663	100.0%
薬 品 費	0	0	0	0.0%
損 害 保 険 料	0	0	0	0.0%
負 担 金	0	0	0	0.0%
自 動 車 重 量 税	0	0	0	0.0%
経 費 計	0	4,710,663	4,710,663	100.0%
合 計	0	4,710,663	4,710,663	100.0%
比 率	0.0%	100.0%	100.0%	-

(2) 修繕工事内訳

直接修繕

場所	区分	修繕件名	金額 (千円)	工期	修繕内容
		なし			
計			0		

区 分 別 集 計	A	0 件	0 千円	建物
	B	0 件	0 千円	構築物
	C	0 件	0 千円	機械及び装置
	D	0 件	0 千円	車両運搬具
	E	0 件	0 千円	工具及び備品

請負修繕

(市発注分)

場所	区分	修繕件名	金額 (千円)	工期	修繕内容
		なし			
計			0		

区 分 別 集 計	A	0 件	0 千円	建物
	B	0 件	0 千円	構築物
	C	0 件	0 千円	機械及び装置
	D	0 件	0 千円	車両運搬具
	E	0 件	0 千円	工具及び備品

(公社発注分)

場所	区分	修繕件名	金額 (千円)	工期	修繕内容
		なし			

区 分 別 集 計	A	0 件		建物
	B	0 件		構築物
	C	0 件		機械及び装置
	D	0 件		車両運搬具
	E	0 件		工具及び備品
