

札幌コンベンションセンター太陽光発電設備(98kW)

◎ 平成24年3月完成


◎ パネル設置状況

方位 東南東～真南
傾斜角 40～50度

※従来パネル、逆段差パネル、CISパネル、追尾型パネルの組合わせ



年月	発電量(kWh)
平成24年年度	96,676
平成25年年度	98,115
平成26年年度	111,067

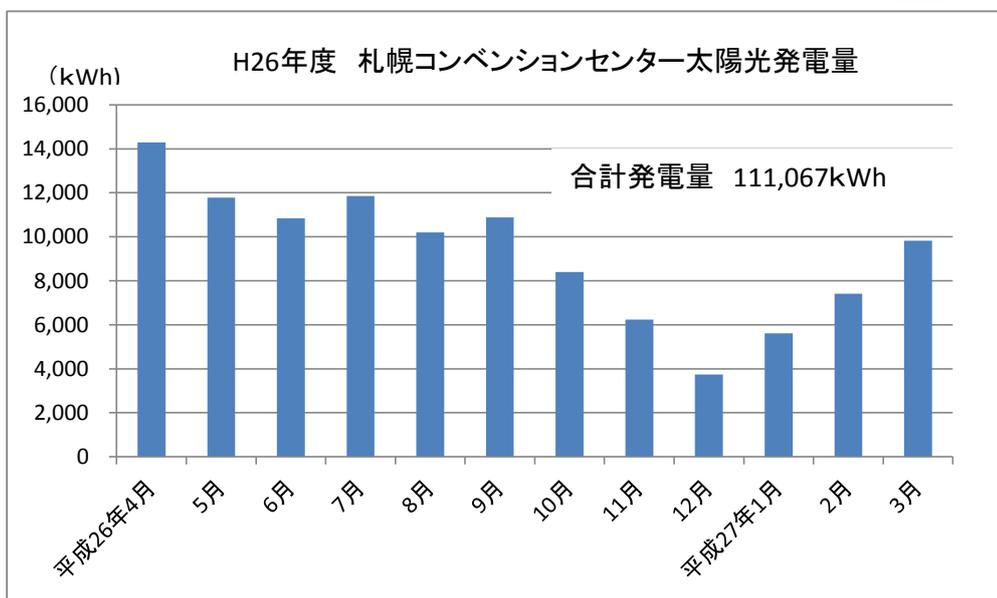

年月	発電量(kWh)
平成26年4月	14,294
5月	11,778
6月	10,843
7月	11,860
8月	10,201
9月	10,876
10月	8,399
11月	6,232
12月	3,742
平成27年1月	5,617
2月	7,409
3月	9,818
合計	111,067
