


東 雁 来 雨 水 ポ ン プ 場

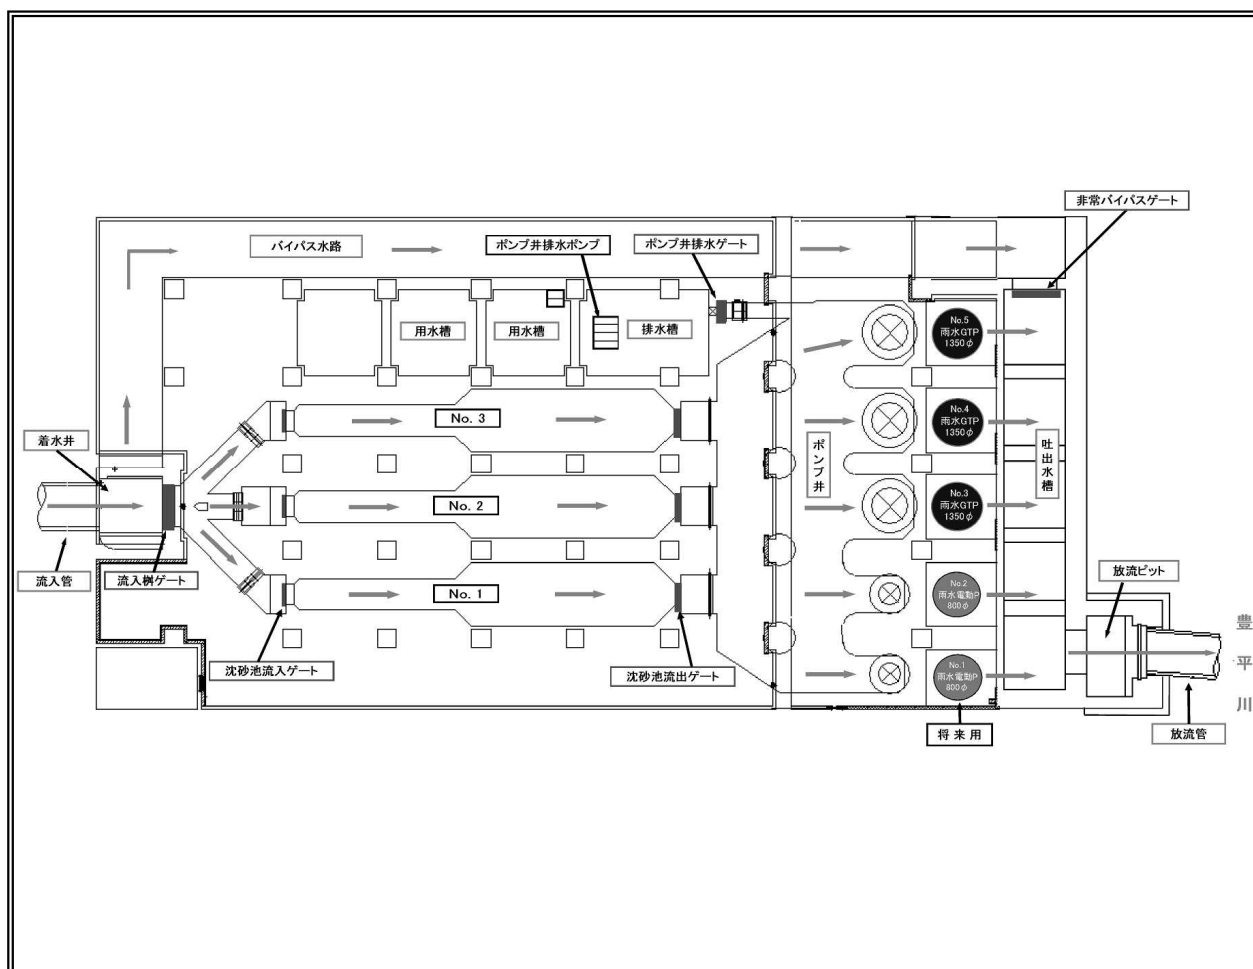

1 運 転 実 績 調

(1) 揚 水 量 等

月	降水量 (mm/月)	総 揚 水 量 (m ³)		雨 水 放 水 量 (m ³) (雨 水 ポ ン プ)			雨 水 送 水 量 (m ³) (排 水 ポ ン プ)	
		月 量	日 量	日数	月 量	日 量	月 量	日 量
4	56.0	7,280	240	1	4,240	140	3,040	100
5	18.5	1,820	60	0	0	0	1,820	60
6	90.0	43,820	1,460	5	39,950	1,330	3,870	130
7	40.0	10,870	350	2	6,240	200	4,630	150
8	75.5	45,820	1,480	5	45,820	1,480	0	0
9	140.5	75,050	2,500	8	73,430	2,450	1,620	50
10	98.5	32,360	1,040	7	29,800	960	2,560	80
11	100.5	17,050	570	4	16,210	540	840	30
12	47.0	3,790	120	0	0	0	3,790	120
1	152.5	1,000	30	0	0	0	1,000	30
2	117.0	2,570	90	0	0	0	2,570	90
3	67.5	1,140	40	0	0	0	1,140	40
合計	1,003.5	242,570	—	32	215,690	—	26,880	—
平均	83.6	20,210	660	3	17,970	590	2,240	70
最大	11/17 30.0	—	6/30 26,010	8	—	6/30 26,010	—	7/16 2,380
最小	—	—	—	0	—	—	—	—

月	動 力 別 揚 水 量 (m ³)			沈 砂 ・ ス ク リ ー ン か す 量 (m ³)		
	電 動 機	エ ン ジ ン	計	沈 砂	ス ク リ ー ン か す	計
4	7,280	0	7,280	0.0	0.0	0.0
5	1,820	0	1,820	0.0	0.0	0.0
6	30,480	13,340	43,820	0.0	0.0	0.0
7	10,870	0	10,870	0.0	0.0	0.0
8	28,480	17,340	45,820	3.5	0.0	3.5
9	52,130	22,920	75,050	5.4	0.0	5.4
10	32,360	0	32,360	0.0	0.0	0.0
11	17,050	0	17,050	0.0	0.0	0.0
12	3,790	0	3,790	4.0	0.2	4.2
1	1,000	0	1,000	0.0	0.0	0.0
2	2,570	0	2,570	0.0	0.0	0.0
3	1,140	0	1,140	0.0	0.0	0.0
合計	188,970	53,600	242,570	12.9	0.2	13.1
平均	15,750	4,470	20,210	1.1	0.0	1.1
最大	9/18 14,320	9/12 13,820	—	—	—	—
最小	—	—	—	—	—	—

(2) 運 転 時 間

月	電動雨水ポンプ運転時間(h)						自家発 運転時間 (h)	
	No. 1 φ 800 90m ³ /分		No. 2 φ 800 90m ³ /分		計			
	実運転	試運転	実運転	試運転	実運転	試運転	実運転	試運転
4	0.0	0.0	0.6	0.0	0.6	0.0	0.0	0.3
5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3
6	0.0	0.0	3.0	0.3	3.0	0.3	0.0	0.3
7	0.6	0.0	0.0	0.0	0.6	0.0	0.0	0.2
8	1.5	0.0	1.9	0.0	3.4	0.0	0.0	0.3
9	2.0	0.0	3.7	0.0	5.7	0.0	0.0	0.3
10	0.0	0.0	2.9	0.5	2.9	0.5	0.0	0.2
11	0.3	0.0	1.4	0.0	1.7	0.0	0.0	0.0
12	0.0	0.1	0.0	0.1	0.0	0.2	0.0	0.5
1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3
2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3
3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3
合計	4.4	0.1	13.5	0.9	17.9	1.0	0.0	3.3
平均	0.4	0.0	1.1	0.1	1.5	0.1	0.0	0.3
最大	2.0	0.1	3.7	0.5	5.7	0.5	0.0	0.5
最小	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

月	エンジン雨水ポンプ運転時間(h)							
	No. 3 φ 1,350 228m ³ /分		No. 4 φ 1,350 228m ³ /分		No. 5 φ 1,350 228m ³ /分		計	
	実運転	試運転	実運転	試運転	実運転	試運転	実運転	試運転
4	0.0	0.3	0.0	0.2	0.0	0.3	0.0	0.8
5	0.0	0.2	0.0	0.3	0.0	0.2	0.0	0.7
6	0.4	0.3	0.0	0.2	1.2	0.3	1.6	0.8
7	0.0	0.2	0.0	0.2	0.0	0.2	0.0	0.6
8	0.3	0.0	1.3	0.0	0.6	0.0	2.2	0.0
9	0.4	0.0	0.0	0.3	2.9	0.0	3.3	0.3
10	0.0	0.2	0.0	0.2	0.0	0.2	0.0	0.6
11	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
12	0.0	0.5	0.0	0.5	0.0	0.5	0.0	1.5
1	0.0	0.2	0.0	0.3	0.0	0.3	0.0	0.8
2	0.0	0.3	0.0	0.3	0.0	0.3	0.0	0.9
3	0.0	0.3	0.0	0.3	0.0	0.3	0.0	0.9
合計	1.1	2.5	1.3	2.8	4.7	2.6	7.1	7.9
平均	0.1	0.2	0.1	0.2	0.4	0.2	0.6	0.7
最大	0.4	0.5	1.3	0.5	2.9	0.5	3.3	1.5
最小	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

(3) 電力使用量

月	電 力 量			
	水 処 理 量 (動 力)			
	揚 水 量			
	雨 水 ポ ン プ			
	水 量 (m^3)	買 電 (kWh)	発 電 (kWh)	使 用 量 ／ 水 量
4	3,750	258	0	0.0688
5	0	14	0	—
6	21,550	1,238	0	0.0574
7	3,350	224	0	0.0669
8	22,620	1,266	0	0.0560
9	40,720	2,268	0	0.0557
10	21,520	1,247	0	0.0579
11	10,250	643	0	0.0627
12	0	46	0	—
1	0	24	0	—
2	0	16	0	—
3	0	13	0	—
合計	123,760	7,257	0	—
平均	10,310	605	0	0.0586
最大	40,720	2,268	—	0.0688
最小	0	13	—	0.0557

月	電 力 量						
	そ の 他		光 熱 水 費	合 計			
	買 電 (kWh)	発 電 (kWh)	買 電 (kWh)	買 電 (kWh)	発 電 (kWh)	使 用 量 (kWh)	発電量のうち 試運転分(kWh)
4	12,877	0	3,583	16,718	0	16,718	0
5	15,575	0	2,967	18,556	0	18,556	0
6	17,460	0	2,938	21,636	0	21,636	0
7	17,989	0	2,888	21,101	0	21,101	0
8	18,053	0	3,107	22,426	0	22,426	0
9	17,215	0	2,947	22,430	0	22,430	0
10	15,744	0	3,288	20,279	0	20,279	0
11	14,900	0	5,273	20,816	0	20,816	0
12	16,799	0	7,735	24,580	0	24,580	0
1	15,972	0	7,777	23,773	0	23,773	0
2	15,240	0	7,900	23,156	0	23,156	0
3	15,625	0	7,558	23,196	0	23,196	0
合計	193,449	0	57,961	258,667	0	258,667	0
平均	16,121	0	4,830	21,556	0	21,556	0
最大	18,053	0	7,900	24,580	—	24,580	—
最小	12,877	0	2,888	16,718	—	16,718	—

(4) 重油使用量・その他（用水）

月	重油動力							
	雨水ポンプ				自家発電機		合計	
	水量 (m^3)	燃料使用量(L)		使用量 ／ 水量	燃料使用量(L)		使用量(L)	
		実運転	試運転		実運転	試運転	実運転	試運転
4	0	0	169	—	0	4	0	173
5	0	0	176	—	0	4	0	180
6	13,340	521	171	0.0519	0	5	521	176
7	0	0	155	—	0	3	0	158
8	17,340	754	0	0.0435	0	5	754	5
9	22,920	1,119	0	0.0488	0	5	1,119	5
10	0	0	162	—	0	5	0	167
11	0	0	0	—	0	0	0	0
12	0	0	344	—	0	9	0	353
1	0	0	170	—	0	4	0	174
2	0	0	173	—	0	5	0	178
3	0	0	174	—	0	4	0	178
合計	53,600	2,394	1,694	—	0	53	2,394	1,747
平均	4,470	200	141	0.0447	0	4	200	146
最大	22,920	1,119	344	0.0519	0	9	1,119	353
最小	0	0	0	0.0435	0	0	0	0

月	その他	
	用水	
	水道水 使用量 (m^3)	井戸水 使用量 (m^3)
4	0	116
5	0	887
6	0	1,028
7	1	1,065
8	0	63
9	0	109
10	1	1,094
11	0	0
12	0	2,296
1	1	923
2	0	930
3	0	872
合計	3	9,383
平均	0	782
最大	1	2,296
最小	0	0

2 決 算 状 況 調

(1) 処理区分別決算内訳

(単位 円)

項 目	管 理 費	水 処 理 費	計	比 率
職 員 数	0 人	0 人	0 人	—
給 料	0	0	0	0.0%
手 当 等	0	0	0	0.0%
法 定 福 利 費	0	0	0	0.0%
人 件 費 計	0	0	0	0.0%
被 服 費	0	0	0	0.0%
備 消 耗 品 費	0	0	0	0.0%
光 熱 水 費	0	0	0	0.0%
印 刷 製 本 費	0	0	0	0.0%
通 信 運 搬 費	0	—	0	0.0%
賃 借 料	0	0	0	0.0%
手 数 料	0	—	0	0.0%
委 託 料	0	0	0	0.0%
修 繕 費	0	811,536	811,536	3.5%
動 力 費	0	22,617,812	22,617,812	96.5%
薬 品 費	0	0	0	0.0%
損 害 保 険 料	0	0	0	0.0%
負 担 金	0	0	0	0.0%
自 動 車 重 量 税	0	0	0	0.0%
経 費 計	0	23,429,348	23,429,348	100.0%
合 計	0	23,429,348	23,429,348	100.0%
比 率	0.0%	100.0%	100.0%	—

(2) 修繕工事等内訳

直 接 修 繕

場所	区分	修 繕 件 名	金額 (千円)	工 期	作 業 内 容
その他	C	吸排気ファンVベルト調整		5/12 ～ 5/12	Vベルト心出し及び張り調整
計			0		

区分別集計	A	0 件	0 千円	建物
	B	0 件	0 千円	構築物
	C	1 件	0 千円	機械及び装置
	D	0 件	0 千円	車両運搬具
	E	0 件	0 千円	工具器具及び備品

請 負 修 繕

場所	区分	修 繕 件 名	金額 (千円)	工 期	作 業 内 容
その他					
計			0		

区分別集計	A	0 件	0 千円	建物
	B	0 件	0 千円	構築物
	C	0 件	0 千円	機械及び装置
	D	0 件	0 千円	車両運搬具
	E	0 件	0 千円	工具器具及び備品
