


米里中継ポンプ場

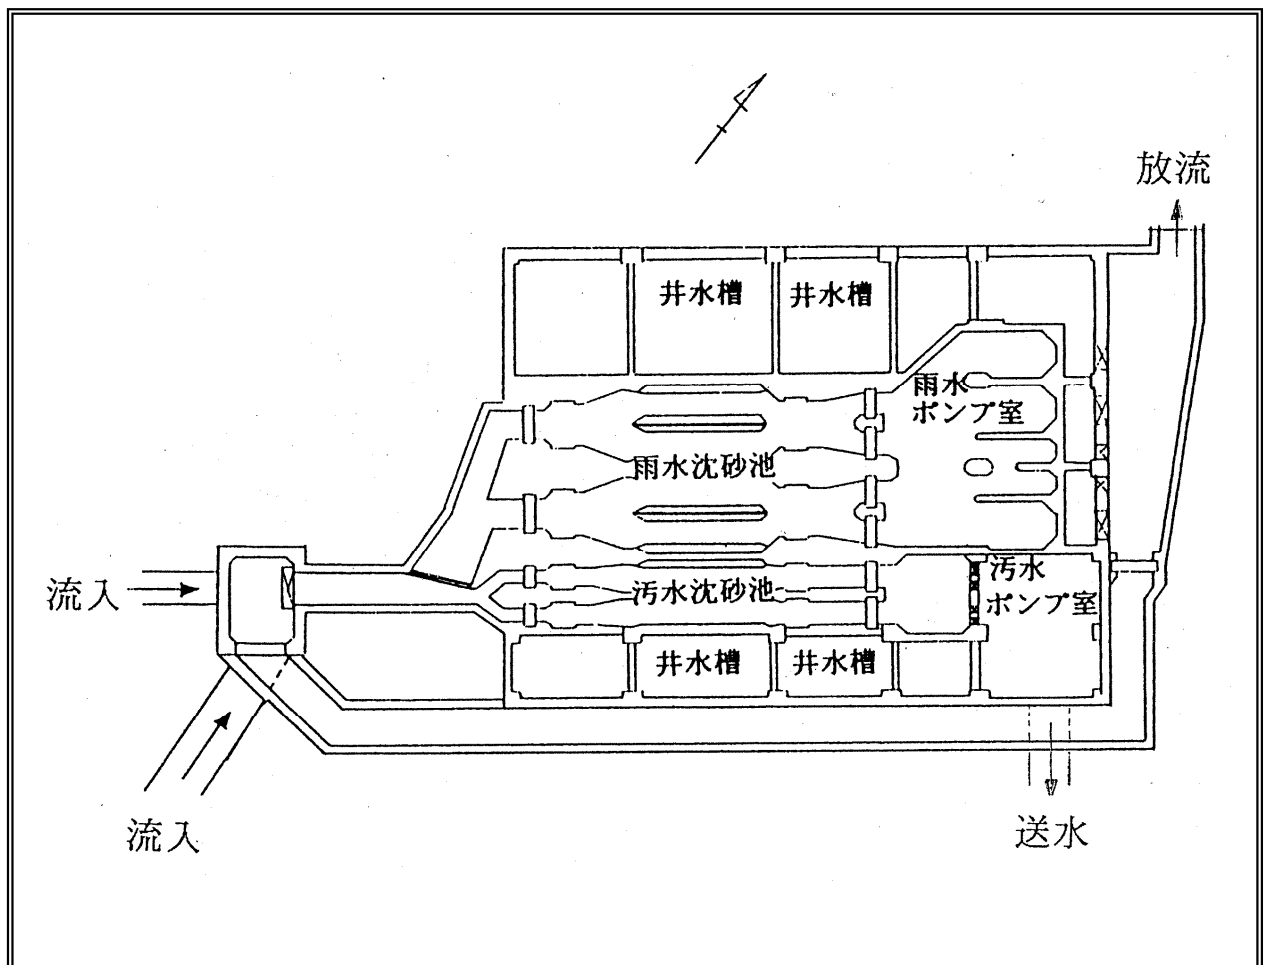

1 運 転 実 績 調

(1) 揚 水 量 等

月	降 水 量	総 揚 水 量		雨 水 放 水 量 (雨 水 ポ ン プ)			送 水 量 (汚 水 ポ ン プ)	
	mm/月	月量(m ³)	日量(m ³)	日数	月量(m ³)	日量(m ³)	月量(m ³)	日量(m ³)
4	70.0	119,660	3,990	2	5,500	180	114,160	3,810
5	26.5	76,910	2,480	0	0	0	76,910	2,480
6	106.0	122,490	4,080	4	27,970	930	94,520	3,150
7	56.5	103,830	3,350	2	8,960	290	94,870	3,060
8	59.0	95,260	3,070	3	10,980	350	84,280	2,720
9	183.0	196,210	6,540	7	62,670	2,090	133,540	4,450
10	108.5	156,160	5,040	6	20,160	650	136,000	4,390
11	129.5	174,400	5,810	4	21,100	700	153,300	5,110
12	47.0	75,230	2,430	0	0	0	75,230	2,430
1	153.5	68,790	2,220	0	0	0	68,790	2,220
2	117.0	138,600	4,780	2	3,580	120	135,020	4,660
3	67.5	208,700	6,730	0	0	0	208,700	6,730
合 計	1124.0	1,536,240	—	30	160,920	—	1,375,320	—
平 均	93.7	128,020	4,200	3	13,410	440	114,610	3,760
最大	11/17 43.0	—	9/18 38,580	—	—	9/18 22,740	—	3/29 21,760
最小	—	—	1/1 1,530	—	—	—	—	1/1 1,530

月	晴天時汚水量		動力別揚水量 (m ³)			沈砂・スクリーンかす量(m ³)		
			電動機の	エンジンの	計	沈砂	スクリーンかす	計
	月量(m ³)	日量(m ³)	揚水量	揚水量				
4	77,100	2,570	119,000	660	119,660	4.8	0.0	4.8
5	63,550	2,050	76,910	0	76,910	0.0	0.0	0.0
6	56,700	1,890	111,650	10,840	122,490	0.0	0.0	0.0
7	62,620	2,020	103,210	620	103,830	5.1	0.0	5.1
8	58,280	1,880	91,750	3,510	95,260	0.0	0.0	0.0
9	63,900	2,130	168,060	28,150	196,210	5.2	0.0	5.2
10	71,610	2,310	152,010	4,150	156,160	5.2	0.0	5.2
11	98,700	3,290	173,110	1,290	174,400	2.5	2.2	4.7
12	67,890	2,190	75,230	0	75,230	0.0	0.0	0.0
1	61,380	1,980	68,790	0	68,790	0.0	0.0	0.0
2	71,920	2,480	138,600	0	138,600	0.0	0.0	0.0
3	76,880	2,480	208,700	0	208,700	0.0	0.0	0.0
合 計	830,530	—	1,487,020	49,220	1,536,240	22.8	2.2	25.0
平 均	69,210	2,270	123,920	4,100	128,020	1.9	0.2	2.1
最大	—	11/26 3,770	11/17 30,156	9/18 12,826	—	—	—	—
最小	—	6/25 1,650	—	—	—	—	—	—

(2) 運 転 時 間

月	汚水ポンプ運転時間(h)				
	I-No. 1 φ 200	I-No. 2 φ 200	II-No. 1 φ 350	II-No. 2 φ 350	計
	4.2 m ³ /分	4.2 m ³ /分	17 m ³ /分	17 m ³ /分	
4	352.2	67.5	11.1	0.0	430.8
5	16.6	276.3	0.0	5.1	298.0
6	263.8	42.0	18.4	0.0	324.2
7	54.5	273.1	0.7	13.2	341.5
8	269.5	26.4	10.0	0.0	305.9
9	64.8	364.6	0.3	32.8	462.5
10	346.3	77.7	30.8	1.5	456.3
11	444.3	6.8	0.0	45.0	496.1
12	294.1	0.0	2.1	0.1	296.3
1	284.6	0.0	0.0	1.1	285.7
2	410.3	2.5	32.1	0.2	445.1
3	230.6	521.9	0.0	21.5	774.0
合計	3,031.6	1,658.8	105.5	120.5	4,916.4
平均	252.6	138.2	8.8	10.0	409.7
最大	444.3	521.9	32.1	45.0	774.0
最小	16.6	0.0	0.0	0.0	285.7

月	雨水ポンプ運転時間(h)								自家発電機	
	電動 φ 500		No. 1 φ 1,000		No. 2 φ 1,000		計		運転時間(h)	
	36 m³/分		140 m³/分		140 m³/分				500 kVA	
	実運転	試運転	実運転	試運転	実運転	試運転	実運転	試運転	実運転	試運転
4	1.9	0.0	0.0	0.5	0.3	0.5	2.2	1.0	0.0	0.7
5	0.0	0.0	0.0	0.5	0.0	0.5	0.0	1.0	0.0	0.5
6	6.7	0.0	0.0	0.5	2.3	0.5	9.0	1.0	0.0	0.5
7	3.4	0.0	0.5	0.5	0.0	0.5	3.9	1.0	0.0	0.5
8	2.9	0.0	0.0	0.5	1.7	0.5	4.6	1.0	0.2	0.5
9	13.5	0.0	8.2	0.6	0.1	0.5	21.8	1.1	0.0	0.5
10	6.3	0.0	0.2	0.6	2.7	0.5	9.2	1.1	0.0	0.5
11	7.9	0.0	1.0	0.5	0.0	0.5	8.9	1.0	0.0	0.5
12	0.0	0.0	0.0	0.5	0.0	0.6	0.0	1.1	0.0	0.5
1	0.0	0.0	0.0	0.5	0.0	0.5	0.0	1.0	0.0	0.5
2	1.6	0.0	0.0	0.5	0.0	0.5	1.6	1.0	0.0	0.6
3	0.0	0.0	0.0	0.5	0.0	0.5	0.0	1.0	0.0	0.5
合計	44.2	0.0	9.9	6.2	7.1	6.1	61.2	12.3	0.2	6.3
平均	3.7	0.0	0.8	0.5	0.6	0.5	5.1	1.0	0.0	0.5
最大	13.5	0.0	8.2	0.6	2.7	0.6	21.8	1.1	0.2	0.7
最小	0.0	0.0	0.0	0.5	0.0	0.5	0.0	1.0	0.0	0.5

(3) 電力使用量

月	動 力							
	水 処 理							
	揚 水							
	汚 水 ポ ン プ				雨 水 ポ ン プ			
	水 量 (m ³)	買 電 (kWh)	発 電 (kWh)	使用量 ／水量	水 量 (m ³)	買 電 (kWh)	発 電 (kWh)	使用量 ／水量
4	114,160	6,895	0	0.0604	4,840	17	0	0.0035
5	76,910	4,667	0	0.0607	0	0	0	—
6	94,520	5,587	0	0.0591	17,130	568	0	0.0332
7	94,870	5,675	0	0.0598	8,340	281	0	0.0337
8	84,280	4,994	0	0.0593	7,470	245	0	0.0328
9	133,540	8,250	0	0.0618	34,520	1,148	0	0.0333
10	136,000	3,895	0	0.0286	16,010	536	0	0.0335
11	153,300	9,236	0	0.0602	19,810	676	0	0.0341
12	75,230	4,526	0	0.0602	0	1	0	—
1	68,790	4,326	0	0.0629	0	0	0	—
2	135,020	7,954	0	0.0589	3,580	137	0	0.0383
3	208,700	12,454	0	0.0597	0	0	0	—
合計	1,375,320	78,459	0	—	111,700	3,609	0	—
平均	114,610	6,538	0	0.0570	9,310	301	0	0.0323
最大	208,700	12,454	—	0.0629	34,520	1,148	—	0.0383
最小	68,790	3,895	—	0.0286	0	0	—	0.0035

月	動 力		光熱水費	電 力 量 合 計				
	水 処 理			買 電 (kWh)	買 電 (kWh)	発 電 (kWh)	使 用 量 (kWh)	発電量のうち 試運転分 (kWh)
	そ の 他							
	買 電 (kWh)	発 電 (kWh)	買 電 (kWh)	買 電 (kWh)	発 電 (kWh)	使 用 量 (kWh)	発電量のうち 試運転分 (kWh)	
4	7,379	0	2,490	16,781	0	16,781	0	
5	7,337	0	1,476	13,480	0	13,480	0	
6	7,956	0	1,577	15,688	0	15,688	0	
7	10,266	0	1,438	17,660	0	17,660	0	
8	11,691	0	1,617	18,547	0	18,547	0	
9	9,000	0	1,527	19,925	0	19,925	0	
10	11,215	0	1,617	17,263	0	17,263	0	
11	7,140	0	2,587	19,639	0	19,639	0	
12	8,998	0	5,924	19,449	0	19,449	0	
1	9,533	0	6,219	20,078	0	20,078	0	
2	10,177	0	6,192	24,460	0	24,460	0	
3	6,804	0	5,457	24,715	0	24,715	0	
合計	107,496	0	38,121	227,685	0	227,685	0	
平均	8,958	0	3,177	18,974	0	18,974	0	
最大	11,691	—	6,219	24,715	—	24,715	—	
最小	6,804	—	1,438	13,480	—	13,480	—	

(4) 重油使用量・その他

月	重油							
	動力						合計	
	汚水・雨水ポンプ				自家発電機			
	水 量 (m^3)	燃料使用量(L)		使用量 ／水量	燃料使用量(L)		重油使用量(L)	
		実運転	試運転		実運転	試運転	実運転	試運転
4	660	21	49	0.0318	0	107	21	156
5	0	0	46	－	0	73	0	119
6	10,840	172	54	0.0159	0	69	172	123
7	620	39	46	0.0629	0	73	39	119
8	3,510	138	45	0.0393	0	89	138	134
9	28,150	561	54	0.0199	0	69	561	123
10	4,150	207	42	0.0499	0	71	207	113
11	1,290	69	28	0.0535	0	69	69	97
12	0	0	54	－	0	73	0	127
1	0	0	55	－	0	75	0	130
2	0	0	53	－	0	87	0	140
3	0	0	56	－	0	76	0	132
合計	49,220	1,207	582	－	0	931	1,207	1,513
平均	4,100	101	49	0.0245	0	78	101	126
最大	28,150	561	56	0.0629	0	107	561	156
最小	0	0	28	0.0159	0	69	0	97

月	そ の 他		
	油 類	用 水	
	白 灯 油	水 道 水	井 戸 水
	使用量 (L)	使用量 (m^3)	使用量 (m^3)
4	1	0	936
5	0	0	701
6	0	0	1,431
7	0	0	1,115
8	0	1	1,373
9	1	0	1,603
10	0	0	1,472
11	0	0	1,444
12	7	0	601
1	25	0	594
2	102	2	718
3	14	0	1,031
合計	150	3	13,019
平均	13	0	1,085
最大	102	2	1,603
最小	0	0	594

2 決 算 状 況 調

(1) 処理区分別決算内訳

(単位 円)

項 目	管 理 費	水 処 理 費	計	比 率
職 員 数	0 人	0 人	0 人	-
給 料	0	0	0	0.0%
手 当 等	0	0	0	0.0%
法 定 福 利 費	0	0	0	0.0%
人 件 費 計	0	0	0	0.0%
被 服 費	0	0	0	0.0%
備 消 耗 品 費	0	0	0	0.0%
光 熱 水 費	0	0	0	0.0%
印 刷 製 本 費	0	0	0	0.0%
通 信 運 搬 費	0	-	0	0.0%
賃 借 料	0	0	0	0.0%
手 数 料	0	-	0	0.0%
委 託 料	0	0	0	0.0%
修 繕 費	214,500	29,052,012	29,266,512	74.9%
動 力 費	0	9,830,178	9,830,178	25.1%
薬 品 費	0	0	0	0.0%
損 害 保 険 料	0	0	0	0.0%
負 担 金	0	0	0	0.0%
自 動 車 重 量 税	0	0	0	0.0%
経 費 計	214,500	38,882,190	39,096,690	100.0%
合 計	214,500	38,882,190	39,096,690	100.0%
比 率	0.5%	99.5%	100.0%	-

(2) 修繕工事内訳

直接修繕

場所	区分	修繕件名	金額 (千円)	工期	修繕内容
沈砂池・ポンプ	C	し渣コンベアNo.1ライナー交換	3,595	6/19 ～ 6/21	ライナー20枚交換
	C	No.2トラフシュウ交換 雑排水 ピット清掃	800	10/4、10/5	シュウ62枚交換、ピット清掃
	C	No.2洗浄水ポンプ交換	1,000	12/7	洗浄水ポンプ1台交換
計			5,395		

区分別集計	A	0 件	0 千円	建物
	B	0 件	0 千円	構築物
	C	3 件	5,395 千円	機械及び装置
	D	0 件	0 千円	車両運搬具
	E	0 件	0 千円	工具及び備品

請負修繕

場所	区分	修繕件名	金額 (千円)	工期	修繕内容
沈砂池・ポンプ	C	米里中継ポンプ場No.3汚水ポンプ 修繕工事	22,000	6/5 ～ 3/15	No.3汚水ポンプ羽根車、主軸 等の交換
建築	A	米里中継ポンプ場電動スライダー 修理	99	6/21 ～ 8/31	光電センサー交換
	C	米里中継ポンプ場天井クレーン修 理	1,199	6/26 ～ 10/31	ワイヤーロープ・オイル等の 交換、ランウェイのタッチ アップ
	A	米里中継ポンプ場誘導灯修理	124	7/13 ～ 10/31	誘導灯交換
計			23,422		

区分別集計	A	2 件	223 千円	建物
	B	0 件	0 千円	構築物
	C	2 件	23,199 千円	機械及び装置
	D	0 件	0 千円	車両運搬具
	E	0 件	0 千円	工具及び備品
