


月寒川雨水ポンプ場

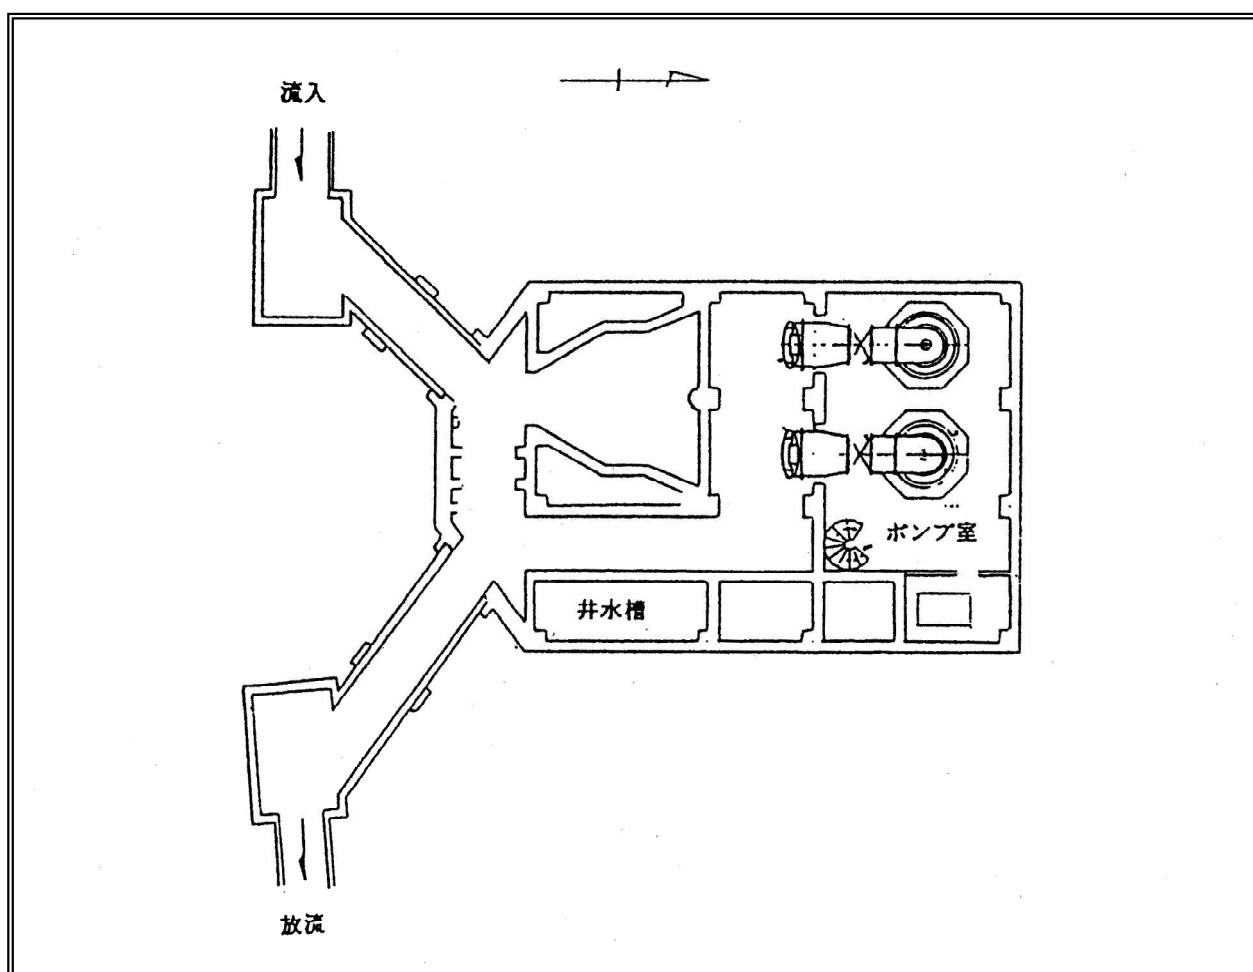

1 運 転 実 績 調

(1) 揚 水 量 等

月	降水量	雨水放水量(雨水ポンプ)			沈砂・スクリーンかす量 (m ³)	
	mm/月	日数	月量(m ³)	日量(m ³)	沈砂	スクリーンかす
4	56.0	0	0	0		0.0
5	24.5	0	0	0		0.0
6	115.5	3	3,310	110		0.0
7	54.5	2	2,050	70		0.0
8	69.5	1	730	20		0.0
9	202.0	6	13,840	460		0.0
10	106.0	1	870	30		0.0
11	128.0	1	510	20		0.0
12	47.0	0	0	0		0.0
1	153.5	0	0	0		0.0
2	117.0	0	0	0		0.0
3	67.5	0	0	0		0.0
合計	1,141.0	14	21,310	—	—	0.0
平均	95.1	1	1,780	60	—	0.0
最大	9/5 47.0	—	—	9/5 8,810	—	—
最小	—	—	—	—	—	—

(2) 運 転 時 間

月	雨水ポンプ運転時間(h)						自家発電機 運転時間(h)	
	No. 1 φ1,350 230 m ³ /分		No. 2 φ1,350 230 m ³ /分		計		100 kVA	
	実運転	試運転	実運転	試運転	実運転	試運転	実運転	試運転
4	0.0	0.6	0.0	0.5	0.0	1.1	0.0	0.0
5	0.0	0.6	0.0	0.5	0.0	1.1	0.0	0.0
6	0.0	0.5	1.9	0.5	1.9	1.0	0.0	0.0
7	0.2	0.6	0.3	0.6	0.5	1.2	0.0	0.0
8	0.0	0.5	0.3	0.5	0.3	1.0	0.0	0.0
9	3.7	0.5	0.0	0.5	3.7	1.0	0.0	0.0
10	0.0	0.6	0.5	0.5	0.5	1.1	0.0	0.0
11	0.2	0.4	0.0	0.5	0.2	0.9	0.0	0.0
12	0.0	0.6	0.0	0.5	0.0	1.1	0.0	0.0
1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
3	0.0	0.5	0.0	0.5	0.0	1.0	0.0	0.5
合計	4.1	5.4	3.0	5.1	7.1	10.5	0.0	0.5
平均	0.3	0.5	0.3	0.4	0.6	0.9	0.0	0.0
最大	3.7	0.6	1.9	0.6	3.7	1.2	0.0	0.5
最小	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

(3) 電力使用量

月	動 力									
	水 処 理					光熱水	合 計			
	揚 水 量			そ の 他						
	雨 水 ポ ン プ			(200 V)	(200 V)	(100 V)				
	水 量 (m ³)	買 電 (kWh)	発 電 量 (kWh)	買 電 (kWh)	発 電 (kWh)	買 電 (kWh)	買 電 (kWh)	発 電 (kWh)	使用量 (kWh)	発電量のうち 試運転(kWh)
4				1,750	0	58	1,808	0	1,808	0
5				1,523	0	120	1,643	0	1,643	0
6				1,112	0	52	1,164	0	1,164	0
7				958	0	90	1,048	0	1,048	0
8				863	0	85	948	0	948	0
9				907	0	112	1,019	0	1,019	0
10				911	0	76	987	0	987	0
11				1,205	0	70	1,275	0	1,275	0
12				1,791	0	74	1,865	0	1,865	0
1				2,400	0	97	2,497	0	2,497	0
2				1,751	0	59	1,810	0	1,810	0
3				2,003	0	89	2,092	0	2,092	0
合計				17,174	0	982	18,156	0	18,156	0
平均				1,431	0	82	1,513	0	1,513	0
最大				2,400	0	120	2,497	—	2,497	—
最小				863	0	52	948	—	948	—

(4) 重油使用量・その他（用水）

月	重油								その他	
	動力						合 計		用 水	
	雨水エンジンポンプ				自家発電機				水 道 水 (m ³)	井 水 (m ³)
	水 量 (m ³)	実運転 (L)	試運転 (L)	使 用 量 ／ 水 量	実運転 (L)	試運転 (L)	実運転 (L)	試運転 (L)		
4	0	0	30	—	0	0	0	30	0	12
5	0	0	28	—	0	0	0	28	0	15
6	3,310	58	27	0.0175	0	0	58	27	1	21
7	2,050	6	31	0.0029	0	0	6	31	0	23
8	730	8	27	0.0110	0	0	8	27	0	15
9	13,840	132	25	0.0095	0	0	132	25	0	29
10	870	13	31	0.0149	0	0	13	31	0	15
11	510	8	29	0.0157	0	0	8	29	0	15
12	0	0	31	—	0	0	0	31	0	15
1	0	0	0	—	0	0	0	0	0	0
2	0	0	0	—	0	0	0	0	0	0
3	0	0	30	—	0	9	0	39	0	24
合計	21,310	225	289	—	0	9	225	298	1	184
平均	1,780	19	24	0.0106	0	1	19	25	0	15
最大	13,840	132	31	0.0175	0	—	132	39	1	29
最小	0	0	0	0.0029	0	—	0	0	0	0

2 決 算 状 況 調

(1) 処理区分別決算内訳

(単位 円)

項 目	管 理 費	水 処 理 費	計	比 率
職 員 数	0 人	0 人	0 人	-
給 料	0	0	0	0.0%
手 当 等	0	0	0	0.0%
法 定 福 利 費	0	0	0	0.0%
人 件 費 計	0	0	0	0.0%
被 服 費	0	0	0	0.0%
備 消 耗 品 費	0	0	0	0.0%
光 熱 水 費	0	0	0	0.0%
印 刷 製 本 費	0	0	0	0.0%
通 信 運 搬 費	0	-	0	0.0%
賃 借 料	0	0	0	0.0%
手 数 料	0	-	0	0.0%
委 託 料	0	0	0	0.0%
修 繕 費	67,210	1,155,000	1,222,210	55.1%
動 力 費	0	996,114	996,114	44.9%
薬 品 費	0	0	0	0.0%
損 害 保 険 料	0	0	0	0.0%
負 担 金	0	0	0	0.0%
自 動 車 重 量 税	0	0	0	0.0%
経 費 計	67,210	2,151,114	2,218,324	100.0%
合 計	67,210	2,151,114	2,218,324	100.0%
比 率	3.0%	97.0%	100.0%	-

(2) 修繕工事内訳

直 接 修 繕

場所	区分	修 繕 件 名	金額 (千円)	工 期	修 繕 内 容
沈砂池・ポンプ		なし			
計			0		

区 分 別 集 計	A	0 件	0 千円	建物
	B	0 件	0 千円	構築物
	C	0 件	0 千円	機械及び装置
	D	0 件	0 千円	車両運搬具
	E	0 件	0 千円	工具及び備品

請 負 修 繕

場所	区分	修 繕 件 名	金額 (千円)	工 期	修 繕 内 容
沈砂池・ポンプ	C	月寒川雨水ポンプ場エンジン修理	1,177	5/16 ～ 8/31	温調弁、断水リレー交換
計			1,177		

区 分 別 集 計	A	0 件	0 千円	建物
	B	0 件	0 千円	構築物
	C	1 件	1,177 千円	機械及び装置
	D	0 件	0 千円	車両運搬具
	E	0 件	0 千円	工具及び備品
