


厚別川雨水ポンプ場

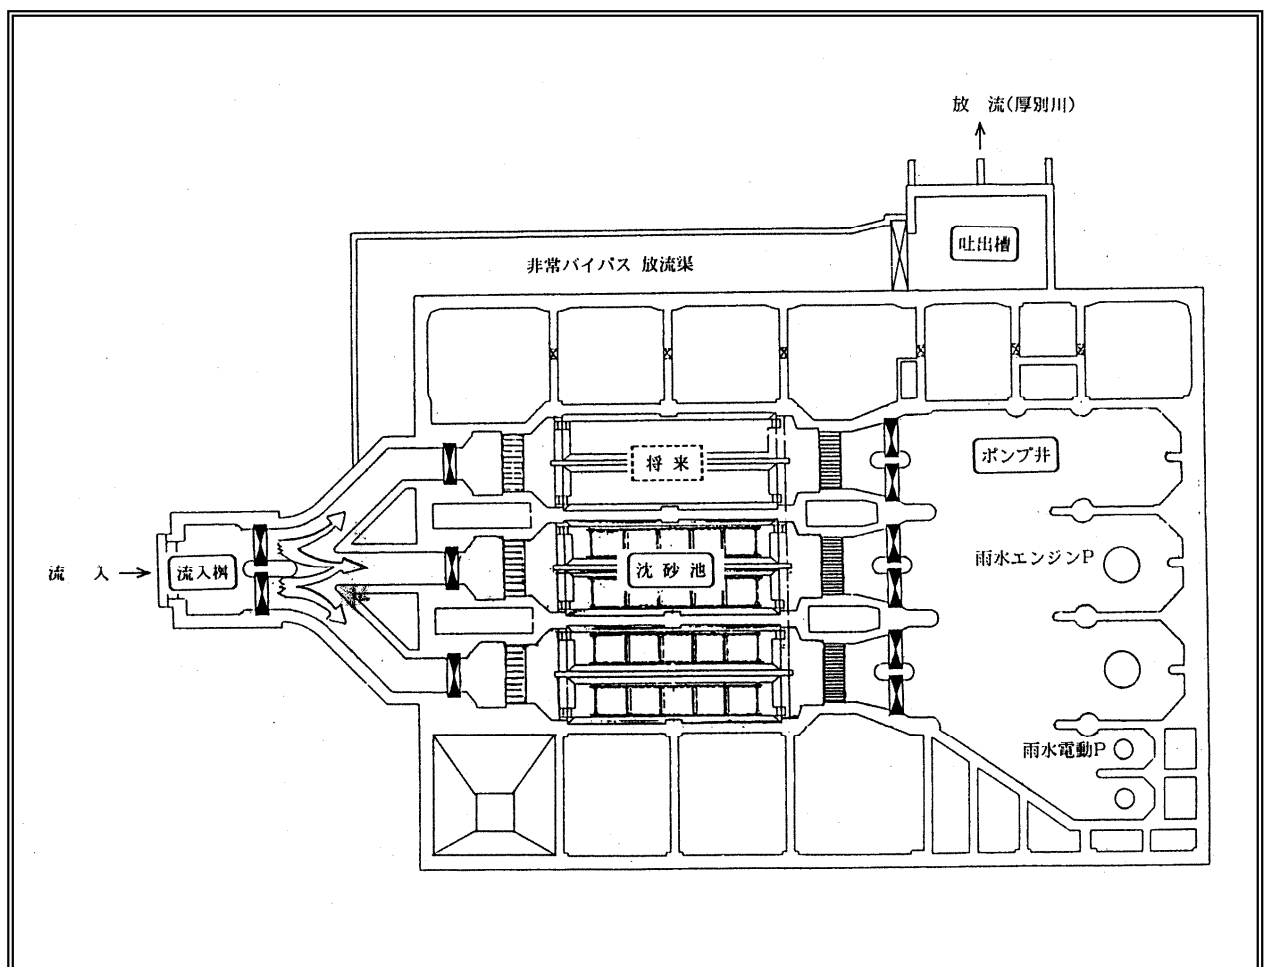

1 運 転 実 績 調

(1) 揚 水 量 等

月	降水量 (mm/月)	総 揚 水 量 (m ³)		雨 水 放 流 量 (m ³)							
		月 量	日 量	雨 水 ポ ン プ			ポンプ井排水ポンプ			計	
				日数	月 量	日 量	日数	月 量	日 量	月 量	日 量
4	46.5	147,240	4,910	7	74,800	2,490	0	0	0	74,800	2,490
5	14.5	74,500	2,400	4	23,100	750	0	0	0	23,100	750
6	78.0	204,250	6,810	11	154,300	5,140	0	0	0	154,300	5,140
7	39.0	120,210	3,880	6	68,900	2,220	0	0	0	68,900	2,220
8	57.0	143,910	4,640	9	94,300	3,040	0	0	0	94,300	3,040
9	165.0	447,210	14,910	13	380,000	12,670	0	0	0	380,000	12,670
10	77.0	219,250	7,070	7	150,700	4,860	0	0	0	150,700	4,860
11	75.0	232,090	7,740	15	161,100	5,370	0	0	0	161,100	5,370
12	47.0	62,140	2,000	3	8,200	260	0	0	0	8,200	260
1	153.5	52,170	1,680	1	2,000	60	0	0	0	2,000	60
2	117.0	137,270	4,730	6	73,800	2,540	0	0	0	73,800	2,540
3	67.5	231,760	7,480	20	149,500	4,820	0	0	0	149,500	4,820
合計	937.0	2,072,000	—	102	1,340,700	—	0	0	—	1,340,700	—
平均	78.1	172,670	5,660	9	111,730	3,660	0	0	0	111,730	3,660
最大	9/5 57.5	—	9/5 143,270	20	—	9/5 141,400	—	—	—	—	—
最小	—	—	1/15 450	1	—	—	—	—	—	—	—

月	送 水 量 (m ³)		動 力 別 雨 水 放 流 量 (m ³)			沈砂・スクリーンかす量(m ³)		
	ポンプ井排水ポンプ		電動機による 放 流 量	エンジンによる 放 流 量	計	沈砂	スクリーン かす	計
	月 量	日 量						
4	72,440	2,420	56,600	18,200	74,800	0.0	0.0	0.0
5	51,400	1,650	23,100	0	23,100	0.0	0.0	0.0
6	49,950	1,670	69,600	84,700	154,300	4.2	0.0	4.2
7	51,310	1,660	40,000	28,900	68,900	0.0	0.0	0.0
8	49,610	1,600	49,400	44,900	94,300	5.0	0.0	5.0
9	67,210	2,240	145,000	235,000	380,000	12.3	0.0	12.3
10	68,550	2,210	102,300	48,400	150,700	11.6	0.0	11.6
11	70,990	2,370	112,000	49,100	161,100	0.0	0.0	0.0
12	53,940	1,740	8,200	0	8,200	0.0	0.0	0.0
1	50,170	1,620	2,000	0	2,000	0.0	0.0	0.0
2	63,470	2,190	73,800	0	73,800	0.0	0.0	0.0
3	82,260	2,660	149,500	0	149,500	0.0	0.0	0.0
合計	731,300	—	831,500	509,200	1,340,700	33.1	0.0	33.1
平均	60,940	2,000	69,290	42,430	111,730	2.8	0.0	2.8
最大	—	4/1 3,460	—	—	—	—	—	—
最小	—	1/15 450	—	—	—	—	—	—

※ 雑排水量は、総揚水量、動力別揚水量に含まない。

(2) 運 転 時 間

月	ポンプ井排水ポンプ運転時間(h)			雨 水 電 動 ポ ン プ 運 転 時 間 (h)		
	送 水	放 流	計	No. 1	No. 2	計
				実運転+試運転	実運転+試運転	実運転+試運転
4	503.1	0.0	503.1	0.0	8.6	8.6
5	357.0	0.0	357.0	3.5	0.0	3.5
6	347.0	0.0	347.0	9.9	0.0	9.9
7	356.5	0.0	356.5	6.0	0.0	6.0
8	344.5	0.0	344.5	7.1	0.0	7.1
9	467.1	0.0	467.1	20.4	0.7	21.1
10	476.1	0.0	476.1	15.6	0.0	15.6
11	493.2	0.0	493.2	17.0	0.0	17.0
12	374.6	0.0	374.6	1.2	0.0	1.2
1	348.4	0.0	348.4	0.4	0.0	0.4
2	441.0	0.0	441.0	11.3	0.0	11.3
3	571.4	0.0	571.4	23.9	0.0	23.9
合計	5,079.9	0.0	5,079.9	116.3	9.3	125.6
平均	423.3	0.0	423.3	9.7	0.8	10.5
最大	571.4	—	571.4	23.9	8.6	23.9
最小	344.5	—	344.5	0.0	0.0	0.4

月	雨水エンジンポンプ運転時間 (h)						自家発電機 運転時間 625 kVA(h)	
	No. 1		No. 2		計			
	実運転	試運転	実運転	試運転	実運転	試運転	実運転	試運転
4	0.0	0.2	2.2	0.2	2.2	0.4	0.0	0.1
5	0.0	0.2	0.0	0.2	0.0	0.4	0.0	0.1
6	0.3	0.2	6.5	0.2	6.8	0.4	0.0	0.1
7	4.9	0.3	0.0	0.3	4.9	0.6	0.0	0.1
8	0.0	0.3	3.9	0.3	3.9	0.6	0.0	0.1
9	15.6	0.2	2.1	0.3	17.7	0.5	0.7	0.1
10	0.9	0.2	3.2	0.2	4.1	0.4	0.0	0.1
11	5.3	0.2	0.0	0.3	5.3	0.5	0.0	0.1
12	0.0	0.2	0.0	0.2	0.0	0.4	0.0	0.1
1	0.0	0.2	0.0	0.2	0.0	0.4	0.0	0.1
2	0.0	0.2	0.0	0.2	0.0	0.4	0.0	0.2
3	0.0	0.3	0.0	0.2	0.0	0.5	0.0	0.1
合 計	27.0	2.7	17.9	2.8	44.9	5.5	0.7	1.3
平 均	2.3	0.2	1.5	0.2	3.7	0.5	0.1	0.1
最 大	15.6	0.3	6.5	0.3	17.7	0.6	0.7	0.2
最 小	0.0	0.2	0.0	0.2	0.0	0.4	0.0	0.1

(3) 電力使用量

月	電 力 量					
	動 力					
	雨 水 揚 水				その他	
	雨水電動ポンプ					
	揚水量 (m ³)	買 電 (kWh)	発電量 (kWh)	使用量 /揚水量	買 電 (kWh)	発電量 (kWh)
4	56,600	2,410	0	0.0426	20,135	0
5	23,100	980	0	0.0424	13,301	0
6	69,600	3,070	0	0.0441	13,454	0
7	40,000	1,790	0	0.0448	14,043	0
8	49,400	2,030	0	0.0411	17,262	0
9	145,000	6,320	220	0.0451	20,288	0
10	102,300	4,680	0	0.0457	17,908	0
11	112,000	5,240	0	0.0468	20,221	0
12	8,200	380	0	0.0463	22,792	0
1	2,000	80	0	0.0400	23,632	0
2	73,800	3,420	0	0.0463	25,107	0
3	149,500	7,050	0	0.0472	28,878	0
合計	831,500	37,450	220	—	237,021	0
平均	69,290	3,121	18	0.0453	19,752	0
最大	149,500	7,050	220	0.0472	28,878	—
最小	2,000	80	0	0.0400	13,301	—

月	電 力 量							
	動 力			光 熱	電 力 収 支			
	合 計							
	買電 (kWh)	発電 (kWh)	使用量 (kWh)	買電 (kWh)	買電 (kWh)	発電 (kWh)	試運転内数 (kWh)	合計 (kWh)
4	22,545	0	22,545	1,400	23,945	0	0	23,945
5	14,281	0	14,281	1,240	15,521	0	0	15,521
6	16,524	0	16,524	1,600	18,124	0	0	18,124
7	15,833	0	15,833	1,610	17,443	0	0	17,443
8	19,292	0	19,292	1,460	20,752	0	0	20,752
9	26,608	220	26,828	1,510	28,118	220	0	28,338
10	22,588	0	22,588	1,450	24,038	0	0	24,038
11	25,461	0	25,461	1,490	26,951	0	0	26,951
12	23,172	0	23,172	1,960	25,132	0	0	25,132
1	23,712	0	23,712	1,990	25,702	0	0	25,702
2	28,527	0	28,527	3,590	32,117	0	0	32,117
3	35,928	0	35,928	2,000	37,928	0	0	37,928
合計	274,471	220	274,691	21,300	295,771	220	0	295,991
平均	22,873	18	22,891	1,775	24,648	18	0	24,666
最大	35,928	220	35,928	3,590	37,928	220	—	37,928
最小	14,281	0	14,281	1,240	15,521	0	—	15,521

(4) 重油使用量・その他

月	重 油								
	動 力								
	雨水ポンプ				自家発電機		使用量計 (L)		
	水量 (m^3)	燃料使用量 (L)		使用量 /水量	燃料使用量(L)				
実運転		試運転	実運転		試運転	実運転	試運転	合計	
4	18,200	450	110	0.0247	0	3	450	113	563
5	0	0	100	—	0	4	0	104	104
6	84,700	1,510	100	0.0178	0	3	1,510	103	1,613
7	28,900	1,000	100	0.0346	0	3	1,000	103	1,103
8	44,900	860	100	0.0192	0	3	860	103	963
9	235,000	4,200	100	0.0179	65	3	4,265	103	4,368
10	48,400	910	100	0.0188	0	3	910	103	1,013
11	49,100	1,110	100	0.0226	0	3	1,110	103	1,213
12	0	0	100	—	0	4	0	104	104
1	0	0	100	—	0	3	0	103	103
2	0	0	100	—	0	4	0	104	104
3	0	0	100	—	0	3	0	103	103
合計	509,200	10,040	1,210	—	65	39	10,105	1,249	11,354
平均	42,400	840	100	0.0197	5	3	842	104	946
最大	235,000	4,200	110	0.0346	65	4	4,265	113	4,368
最小	0	0	100	0.0178	0	3	0	103	103

月	そ の 他	
	水 道 水 使 用 量 (m ³)	井 水 使 用 量 (m ³)
4	0	304
5	0	141
6	0	731
7	0	233
8	0	465
9	0	1,168
10	1	856
11	1	786
12	0	155
1	0	50
2	0	257
3	0	640
合計	2	5,786
平均	0	482
最大	1	1,168
最小	0	50

2 決 算 状 況 調

(1) 処理区分別決算内訳

(単位 円)

項 目	管 理 費	水 処 理 費	計	比 率
職 員 数	0 人	0 人	0 人	-
給 料	0	0	0	0.0%
手 当 等	0	0	0	0.0%
法 定 福 利 費	0	0	0	0.0%
人 件 費 計	0	0	0	0.0%
被 服 費	0	0	0	0.0%
備 消 耗 品 費	0	0	0	0.0%
光 熱 水 費	0	0	0	0.0%
印 刷 製 本 費	0	0	0	0.0%
通 信 運 搬 費	0	-	0	0.0%
賃 借 料	0	0	0	0.0%
手 数 料	0	-	0	0.0%
委 託 料	0	0	0	0.0%
修 繕 費	0	0	0	0.0%
動 力 費	0	16,040,304	16,040,304	100.0%
薬 品 費	0	0	0	0.0%
損 害 保 険 料	0	0	0	0.0%
負 担 金	0	0	0	0.0%
自 動 車 重 量 税	0	0	0	0.0%
経 費 計	0	16,040,304	16,040,304	100.0%
合 計	0	16,040,304	16,040,304	100.0%
比 率	0.0%	100.0%	100.0%	-

(2) 修繕工事内訳

直 接 修 繕

場所	区分	修 繕 件 名	金額 (千円)	工 期	修 繕 内 容
沈砂池	C	沈砂バケットエレベーター整備	受託	7/3～7/5	リターンレールの変形、駆動減速機シャーピンの破断を確認したため交換
計			0		

区 分 別 集 計	A	0 件	0 千円	建物
	B	0 件	0 千円	構築物
	C	1 件	0 千円	機械及び装置
	D	0 件	0 千円	車両運搬具
	E	0 件	0 千円	工具及び備品

請 負 修 繕

(市発注分)

場所	区分	修 繕 件 名	金額 (千円)	工 期	修 繕 内 容
		なし			
計			0		

区 分 別 集 計	A	0 件	0 千円	建物
	B	0 件	0 千円	構築物
	C	0 件	0 千円	機械及び装置
	D	0 件	0 千円	車両運搬具
	E	0 件	0 千円	工具及び備品

(公社発注分)

場所	区分	修 繕 件 名	金額 (千円)	工 期	修 繕 内 容
電 気 室	C	厚別川雨水ポンプ場 監視制御装置ほか補修	—	5/19 ～ 1/26	厚別川雨水ポンプ場監視制御装置と データ収集装置のCPUユニットが故障 のため部品交換補修
	C	厚別川雨水ポンプ場 整流器盤補修	—	10/3 0 ～ 3/25	厚別川雨水ポンプ場の整流器盤内デ ジタルパネルが経年劣化により誤動作 が頻発しているため補修

区 分 別 集 計	A	0 件		建物
	B	0 件		構築物
	C	2 件		機械及び装置
	D	0 件		車両運搬具
	E	0 件		工具及び備品

