


簾舞中継ポンプ場

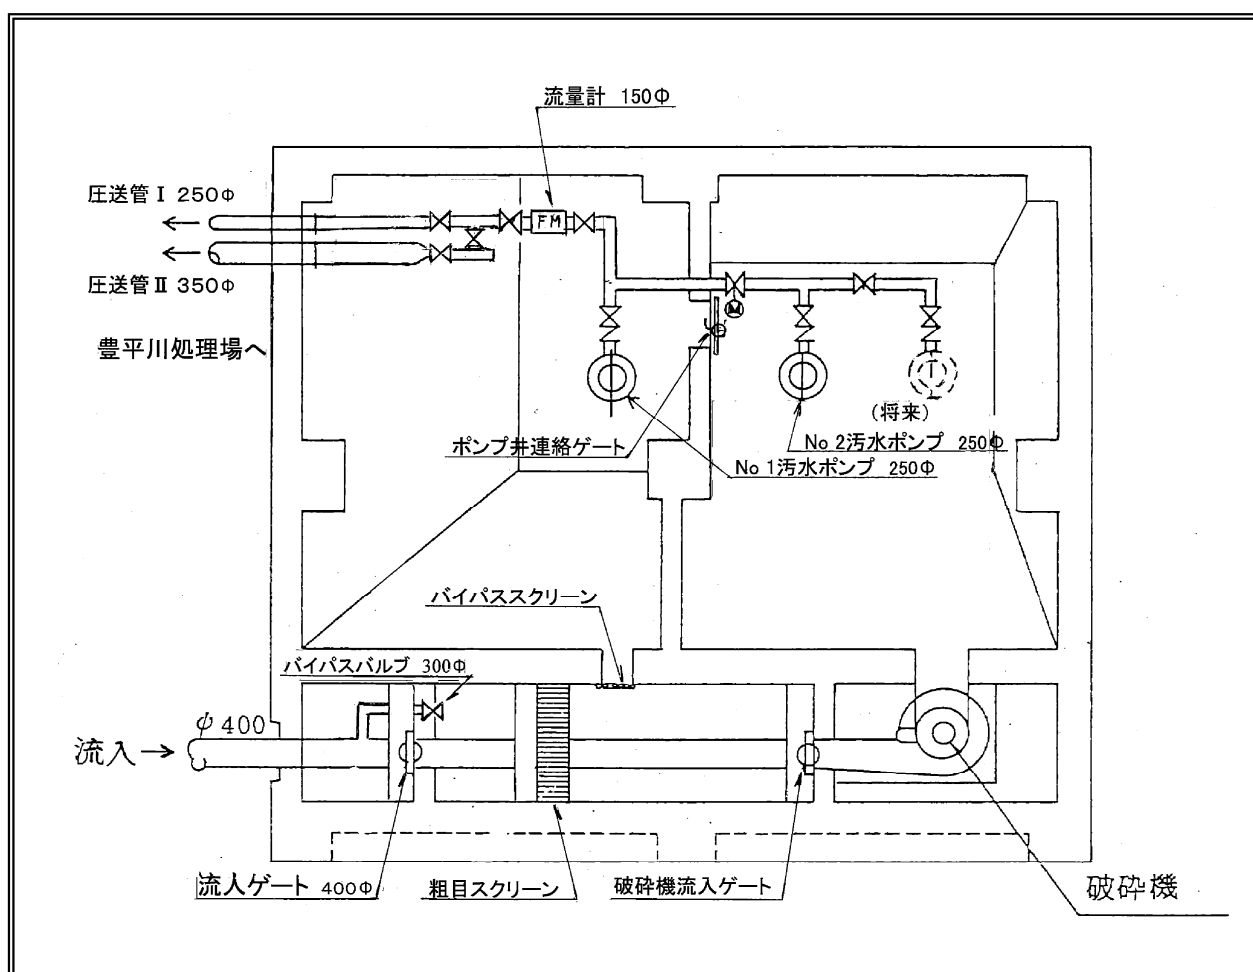

1 運 転 実 績 調

(1) 揚水量等

月	降水量 (mm/月)	総揚水量（送水量）		晴天時汚水量		電動機 による 揚水量 (m^3)	沈砂・スクリーンかす量		
		(m^3)		(m^3)			沈砂 (m^3)	スクリーンかす (m^3)	計 (m^3)
		月量	日量	月量	日量				
4	77.0	41,750	1,390	38,100	1,270	41,750	0	0	0
5	22.5	26,090	840	25,420	820	26,090	0	0	0
6	119.5	23,950	800	21,900	730	23,950	0	0	0
7	55.5	24,750	800	22,630	730	24,750	0	0	0
8	90.0	24,170	780	22,320	720	24,170	0	0	0
9	155.0	29,840	990	23,100	770	29,840	0	0	0
10	140.5	34,550	1,110	26,970	870	34,550	0	0	0
11	205.5	39,090	1,300	36,900	1,230	39,090	0	0	0
12	50.0	27,720	890	25,110	810	27,720	0	0	0
1	137.0	21,130	680	21,080	680	21,130	0	0	0
2	31.0	24,650	850	20,880	720	24,650	0	0	0
3	59.0	31,110	1,000	22,320	720	31,110	0	0	0
合計	1,142.5	348,800	—	306,730	—	348,800	0	0	0
平均	95.2	29,070	950	25,560	840	29,070	0	0	0
最大	11/17 106.0	—	11/17 4,980	—	4/3 1,670	11/17 4,980	—	—	—
最小	—	—	6/28 590	—	6/28 590	6/28 590	—	—	—

(2) 運転時間

月	汚水ポンプ運転時間(h) 4.0 m^3 /分×2台			自家用発電機 運転時間(h) 400 kVA		
	No. 1	No. 2	計	実運転	試運転	計
4	10.6	104.0	114.6	0.0	0.2	0.2
5	53.1	1.2	54.3	0.0	0.2	0.2
6	0.6	51.1	51.7	0.0	0.1	0.1
7	44.2	7.5	51.7	0.0	0.1	0.1
8	0.6	50.0	50.6	0.0	0.5	0.5
9	59.1	0.8	59.9	0.0	0.5	0.5
10	2.2	82.2	84.4	0.0	0.1	0.1
11	79.9	0.5	80.4	0.0	0.7	0.7
12	0.6	62.0	62.6	0.0	0.1	0.1
1	38.7	5.8	44.5	0.0	0.1	0.1
2	0.6	57.6	58.2	0.0	0.1	0.1
3	63.8	0.7	64.5	0.0	0.1	0.1
合計	354.0	423.4	777.4	0.0	2.8	2.8
平均	29.5	35.3	64.8	0.0	0.2	0.2
最大	79.9	104.0	114.6	0.0	0.7	0.7
最小	0.6	0.5	44.5	0.0	0.1	0.1

(3) 電力使用量等

月	電 力 量							
	動 力 費							
	汚水ポンプ			その他		合計		
	買 電 (kWh)	発 電 (kWh)	使用量 ／水量	買 電 (kWh)	発 電 (kWh)	買 電 (kWh)	発 電 (kWh)	使用量計 (kWh)
4	7,736	0	0.1853	2,105	0	9,841	0	9,841
5	3,665	0	0.1405	2,717	0	6,382	0	6,382
6	3,490	0	0.1457	2,705	0	6,195	0	6,195
7	3,490	0	0.1410	2,881	0	6,371	0	6,371
8	3,286	130	0.1413	3,439	0	6,725	130	6,855
9	4,043	0	0.1355	2,826	0	6,869	0	6,869
10	5,698	0	0.1649	2,533	0	8,231	0	8,231
11	5,427	0	0.1388	2,887	0	8,314	0	8,314
12	4,226	0	0.1525	2,886	0	7,112	0	7,112
1	3,004	0	0.1422	2,653	0	5,657	0	5,657
2	3,929	0	0.1594	2,410	0	6,339	0	6,339
3	4,354	0	0.1400	2,845	0	7,199	0	7,199
合計	52,348	130	—	32,887	0	85,235	130	85,365
平均	4,362	11	0.1505	2,741	0	7,103	11	7,114
最大	7,736	130	0.1853	3,439	0	9,841	130	9,841
最小	3,004	0	0.1355	2,105	0	5,657	0	5,657

月	電 力 量					重油使用量			その他
	光熱水費 水処理	使用量合計				自家発電電機			用 水 水 道
	買 電 (kWh)	買 電 (kWh)	発 電 (kWh)	使用量計 (kWh)	発電使用量の うち試運転分 (再掲)(kWh)	実運転 (L)	試運転 (L)	合計 (L)	使用量 (m ³)
4	305	10,146	0	10,146	0	0	7	7	2
5	232	6,614	0	6,614	0	0	10	10	2
6	189	6,384	0	6,384	0	0	7	7	2
7	161	6,532	0	6,532	0	0	7	7	4
8	134	6,859	130	6,989	130	0	41	41	2
9	172	7,041	0	7,041	0	0	33	33	2
10	261	8,492	0	8,492	0	0	7	7	1
11	260	8,574	0	8,574	0	0	49	49	2
12	250	7,362	0	7,362	0	0	7	7	1
1	242	5,899	0	5,899	0	0	6	6	1
2	227	6,566	0	6,566	0	0	10	10	1
3	256	7,455	0	7,455	0	0	7	7	3
合計	2,689	87,924	130	88,054	130	0	191	191	23
平均	224	7,327	11	7,338	11	0	16	16	2
最大	305	10,146	130	10,146	130	0	49	49	4
最小	134	5,899	0	5,899	0	0	6	6	1

2 決 算 状 況 調

(1) 処理区分別決算内訳

(単位 円)

項 目	管 理 費	水 処 理 費	計	比 率
職 員 数	0 人	0 人	0 人	-
給 料	0	0	0	0.0%
手 当 等	0	0	0	0.0%
法 定 福 利 費	0	0	0	0.0%
人 件 費 計	0	0	0	0.0%
被 服 費	0	0	0	0.0%
備 消 耗 品 費	0	0	0	0.0%
光 熱 水 費	0	0	0	0.0%
印 刷 製 本 費	0	0	0	0.0%
通 信 運 搬 費	0	-	0	0.0%
賃 借 料	0	0	0	0.0%
手 数 料	0	-	0	0.0%
委 託 料	0	0	0	0.0%
修 繕 費	0	0	0	0.0%
動 力 費	0	4,026,560	4,026,560	100.0%
薬 品 費	0	0	0	0.0%
損 害 保 険 料	0	0	0	0.0%
負 担 金	0	0	0	0.0%
自 動 車 重 量 税	0	0	0	0.0%
経 費 計	0	4,026,560	4,026,560	100.0%
合 計	0	4,026,560	4,026,560	100.0%
比 率	0.0%	100.0%	100.0%	-

(2) 修繕工事内訳

直 接 修 繕

場所	区分	修 繕 件 名	金額 (千円)	工 期	修 繕 内 容
		なし			
計			0		

区 分 別 集 計	A	0 件	0 千円	建物
	B	0 件	0 千円	構築物
	C	0 件	0 千円	機械及び装置
	D	0 件	0 千円	車両運搬具
	E	0 件	0 千円	工具及び備品

請 負 修 繕

(市発注分)

場所	区分	修 繕 件 名	金額 (千円)	工 期	修 繕 内 容
		なし			
計			0		

区 分 別 集 計	A	0 件	0 千円	建物
	B	0 件	0 千円	構築物
	C	0 件	0 千円	機械及び装置
	D	0 件	0 千円	車両運搬具
	E	0 件	0 千円	工具及び備品

(公社発注分)

場所	区分	修 繕 件 名	金額 (千円)	工 期	修 繕 内 容
その他	A	藤野中継ポンプ場ほか電動シャッタ補修	—	10/2 ～ 1/26	電動シャッタ部品交換

区 分 別 集 計	A	1 件		建物
	B	0 件		構築物
	C	0 件		機械及び装置
	D	0 件		車両運搬具
	E	0 件		工具及び備品
