


藻岩下第2中継ポンプ場

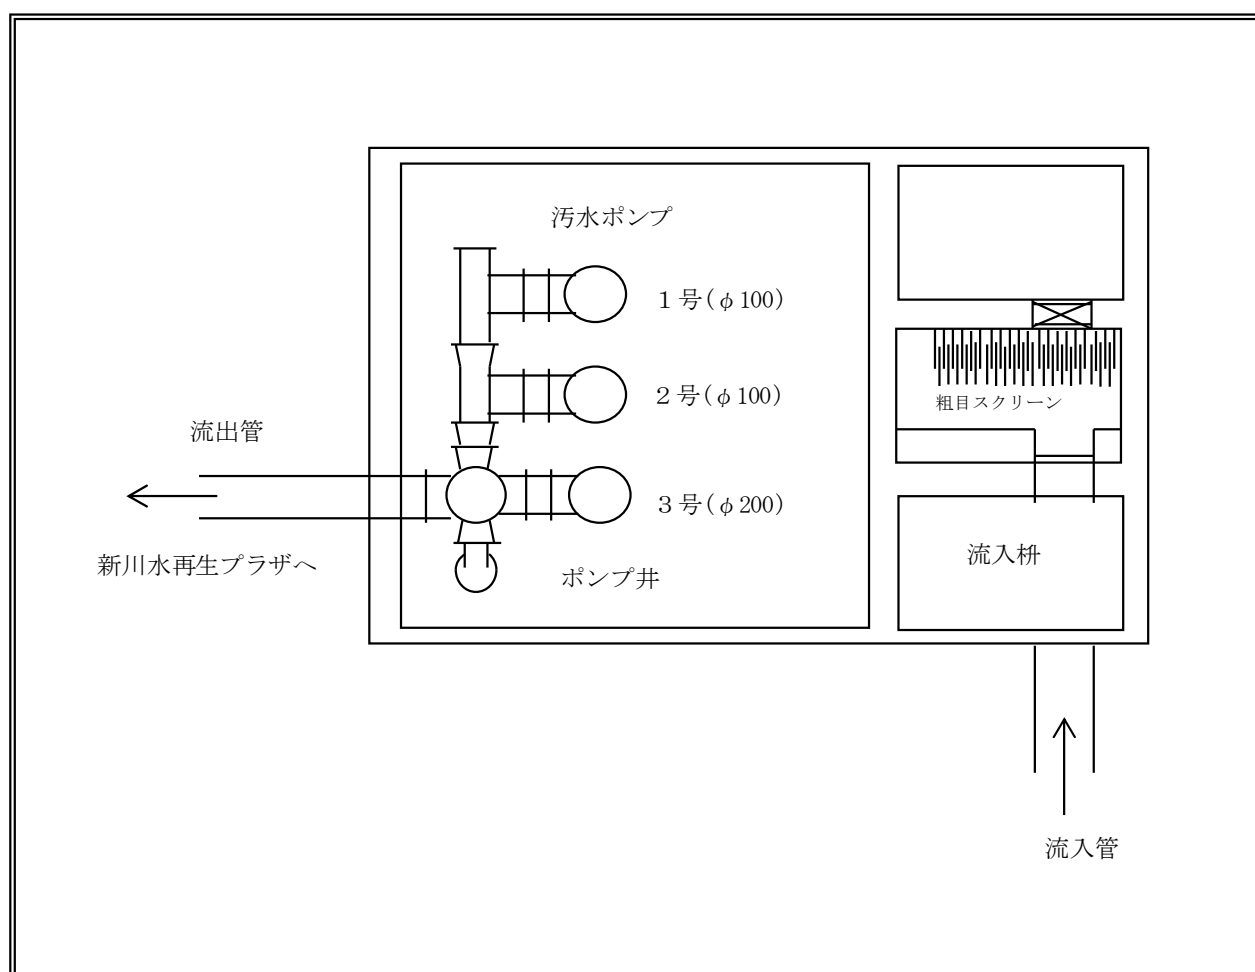

1 運 転 実 績 調

(1) 揚水量

月	総揚水(送水)量 (m ³)		晴天時汚水量 (m ³)		送水雨水量 (m ³)		電動機による 揚水量 (m ³)	沈砂・ スクリーンかす量(m ³)		
	月 量	日量	月 量	日量	月 量	日量		沈砂	スクリー ンかす	計
4	7,310	230	1,800	60	5,510	170	7,310	0.0	0.0	0.0
5	3,150	100	1,860	60	1,290	40	3,150	0.0	0.0	0.0
6	3,580	130	1,800	60	1,780	70	3,580	0.0	0.0	0.0
7	4,850	160	1,860	60	2,990	100	4,850	0.0	0.0	0.0
8	4,540	150	1,860	60	2,680	90	4,540	0.0	0.0	0.0
9	10,860	360	1,800	60	9,060	300	10,860	0.0	0.0	0.0
10	2,790	90	1,860	60	930	30	2,790	0.0	0.0	0.0
11	3,630	120	1,800	60	1,830	60	3,630	0.0	0.0	0.0
12	2,470	90	1,860	60	610	30	2,470	0.0	0.0	0.0
1	3,220	100	1,860	60	1,360	40	3,220	0.0	0.0	0.0
2	3,160	110	1,680	60	1,480	50	3,160	0.0	0.0	0.0
3	3,060	120	1,860	60	1,200	60	3,060	0.0	0.0	0.0
合計	52,620	—	21,900	—	30,720	—	52,620	0.0	0.0	0.0
平均	4,390	140	1,830	60	2,560	80	4,390	0.0	0.0	0.0
最大	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
最小	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

(2) 運転時間

月	汚水ポンプ運転時間 (h)				自家発運転時間(h)	
	No.1 φ100 1.5m ³ /分	No.2 φ100 1.5m ³ /分	No.3 φ200 3.3m ³ /分	計	実運転	試運転
4	42.7	41.3	0.0	84.0	0.0	0.2
5	18.3	17.9	0.0	36.2	0.0	0.2
6	19.2	19.0	1.3	39.5	0.0	0.2
7	27.7	28.0	0.0	55.7	0.0	0.2
8	26.0	25.5	0.3	51.8	0.0	0.2
9	17.3	103.0	2.0	122.3	0.0	0.2
10	12.5	18.9	0.3	31.7	0.0	0.2
11	20.9	20.6	0.1	41.6	0.0	0.2
12	14.6	13.8	0.0	28.4	0.0	0.2
1	18.7	18.3	0.0	37.0	0.0	0.2
2	18.6	17.7	0.0	36.3	0.0	0.2
3	17.9	17.3	0.0	35.2	0.0	0.2
合計	254.4	341.3	4.0	599.7	0.0	2.4
平均	21.2	28.4	0.3	50.0	0.0	0.2
最大	42.7	103.0	2.0	122.3	0.0	0.2
最小	12.5	13.8	0.0	28.4	0.0	0.2

(3) 電力使用量

月	電力量											
	水処理（動力）							光熱 水費	電力量合計			
	揚水量				その他 （動力）		合計					
	汚水ポンプ											
	水量 (m ³)	買電 (kWh)	発電 (kWh)	使用量 ／水量	買電 (kWh)	発電 (kWh)	買電 (kWh)	買電 (kWh)	買電 (kWh)	発電 (kWh)	使用量 (kWh)	発電量のう ち試運転分 (kWh)
4	7,310	462	0	0.0632	533	0	995	7	1,002	0	1,002	0
5	3,150	199	0	0.0632	312	0	511	6	517	0	517	0
6	3,580	237	0	0.0662	82	0	319	11	330	0	330	0
7	4,850	306	0	0.0631	273	0	579	6	585	0	585	0
8	4,540	290	0	0.0639	283	0	573	6	579	0	579	0
9	10,860	704	0	0.0648	-41	0	663	6	669	0	669	0
10	2,790	179	0	0.0642	597	0	776	12	788	0	788	0
11	3,630	230	0	0.0634	105	0	335	6	341	0	341	0
12	2,470	156	0	0.0632	235	0	391	7	398	0	398	0
1	3,220	204	0	0.0634	345	0	549	7	556	0	556	0
2	3,160	200	0	0.0633	250	0	450	5	455	0	455	0
3	3,060	194	0	0.0634	278	0	472	5	477	0	477	0
合計	52,620	3,361	0	—	3,252	0	6,613	84	6,697	0	6,697	0
平均	4,390	280	0	0.0639	270	0	550	10	560	0	560	0
最大	10,860	704	—	—	597	—	995	12	1,002	0	1,002	—
最小	2,470	156	—	—	-41	—	319	5	330	0	330	—

(4) 軽油使用量

月	軽油			
	自家発電機		合 計	
	燃料使用量(L)		使用量(L)	
	実運転	試運転	実運転	試運転
4	0.0	1.5	0.0	1.5
5	0.0	1.5	0.0	1.5
6	0.0	1.5	0.0	1.5
7	0.0	1.5	0.0	1.5
8	0.0	1.5	0.0	1.5
9	0.0	1.5	0.0	1.5
10	0.0	1.5	0.0	1.5
11	0.0	1.5	0.0	1.5
12	0.0	1.5	0.0	1.5
1	0.0	1.5	0.0	1.5
2	0.0	1.5	0.0	1.5
3	0.0	1.5	0.0	1.5
合計	0.0	18.0	0.0	18.0
平均	0.0	1.5	0.0	1.5
最大	0.0	1.5	0.0	1.5
最小	0.0	1.5	0.0	1.5

2 決 算 状 況 調

(1) 処理区分別決算内訳

(単位 円)

項 目	管 理 費	水 処 理 費	計	比 率
職 員 数	0 人	0 人	0 人	—
給 料	0	0	0	0.0%
手 当 等	0	0	0	0.0%
法 定 福 利 費	0	0	0	0.0%
人 件 費 計	0	0	0	0.0%
被 服 費	0	0	0	0.0%
備 消 耗 品 費	0	0	0	0.0%
光 熱 水 費	0	0	0	0.0%
印 刷 製 本 費	0	0	0	0.0%
通 信 運 搬 費	0	—	0	0.0%
賃 借 料	0	0	0	0.0%
手 数 料	0	—	0	0.0%
委 託 料	0	0	0	0.0%
修 繕 費	0	1,017,500	1,017,500	65.4%
動 力 費	0	537,880	537,880	34.6%
薬 品 費	0	0	0	0.0%
損 害 保 険 料	0	0	0	0.0%
負 担 金	0	0	0	0.0%
自 動 車 重 量 税	0	0	0	0.0%
経 費 計	0	1,555,380	1,555,380	100.0%
合 計	0	1,555,380	1,555,380	100.0%
比 率	0.0%	100.0%	100.0%	—

(2) 修繕工事等内訳

直接修繕

場所	区分	修繕件名	金額 (千円)	工期	修繕内容
		なし	0	～	
計			0		

区分別集計	A	0 件	0 千円	建物
	B	0 件	0 千円	構築物
	C	0 件	0 千円	機械及び装置
	D	0 件	0 千円	車両運搬具
	E	0 件	0 千円	工具器具及び備品

請負修繕

場所	区分	修繕件名	金額 (千円)	工期	修繕内容
その他	B	藻岩下第2中継ポンプ場ポンプ井 タラップ修理	454	5/15～9/21	ポンプ井のタラップの更新
	C	藻岩下第2中継ポンプ場投込圧力 式水位計修繕工事	563	10/11～11/30	ポンプ井の水位計の更新
計			1,018		

区分別集計	A	0 件	0 千円	建物
	B	1 件	454 千円	構築物
	C	1 件	563 千円	機械及び装置
	D	0 件	0 千円	車両運搬具
	E	0 件	0 千円	工具器具及び備品
