


茨戸中部中継ポンプ場

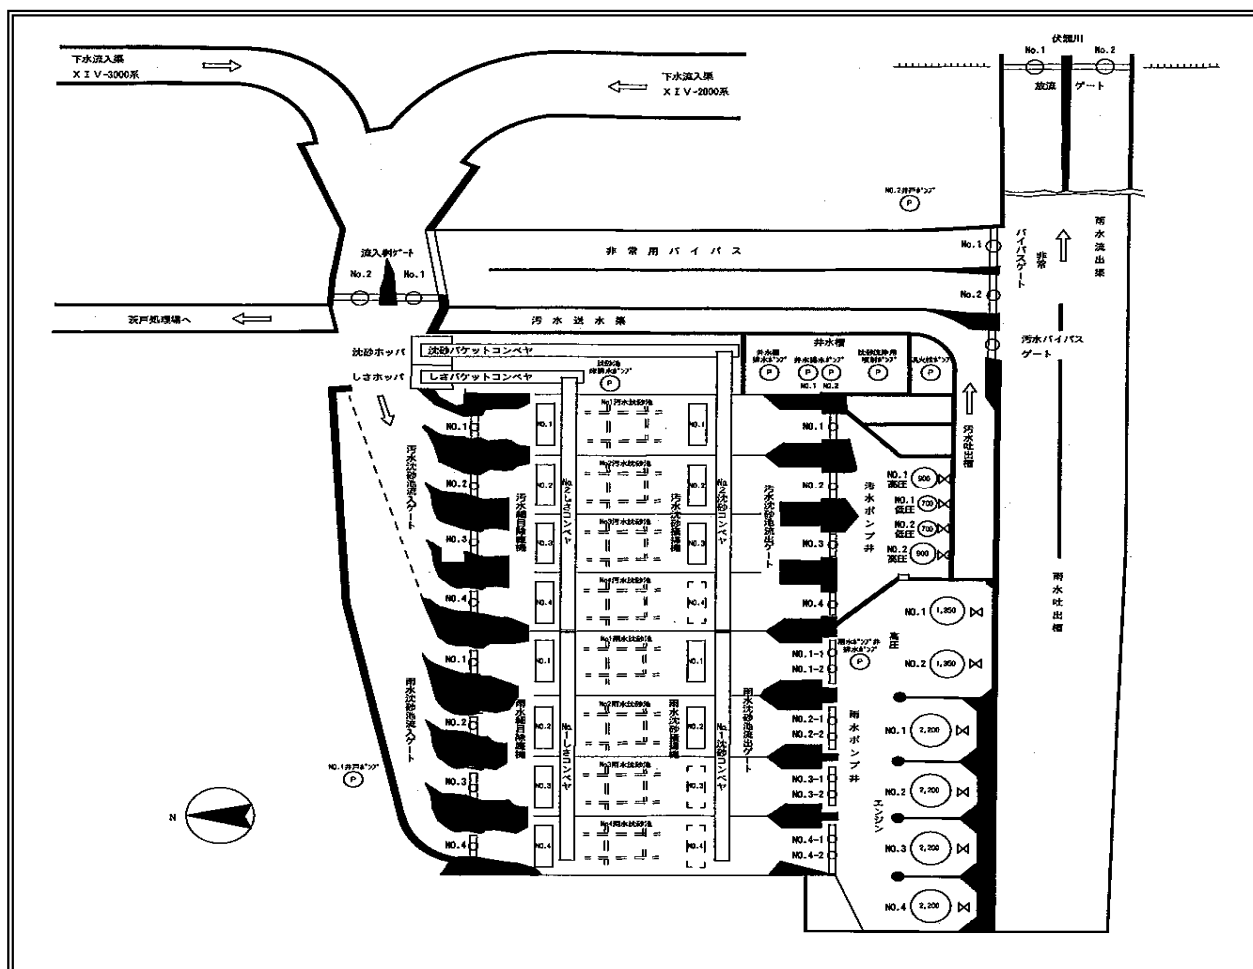

1 運 転 実 績 調

(1) 揚 水 量 等

月	降水量 (mm/月)	総 揚 水 量 (m ³)		雨 水 放 流 量 (m ³) (雨 水 ポ ン プ)			汚 水 送 水 量 (m ³) (汚 水 ポ ン プ)	
		月 量	日 量	日数	月 量	日 量	月 量	日 量
4	34.5	3,530,190	117,670	3	38,280	1,270	3,491,910	116,400
5	24.0	1,963,450	63,340	1	25,990	840	1,937,460	62,500
6	49.0	1,841,530	61,380	2	38,560	1,280	1,802,970	60,100
7	118.0	2,723,100	87,840	3	462,910	14,930	2,260,190	72,910
8	116.0	3,056,750	98,600	4	180,160	5,810	2,876,590	92,790
9	62.5	2,248,140	74,940	3	200,700	6,690	2,047,440	68,250
10	140.0	3,663,170	118,170	7	285,400	9,210	3,377,770	108,960
11	122.5	3,730,490	124,350	4	68,970	2,300	3,661,520	122,050
12	54.0	1,963,030	63,320	0	0	0	1,963,030	63,320
1	68.5	1,757,160	56,680	0	0	0	1,757,160	56,680
2	118.0	2,157,720	77,060	0	0	0	2,157,720	77,060
3	94.5	5,454,700	175,960	5	84,440	2,730	5,370,260	173,230
合計	1,001.5	34,089,430	—	32	1,385,410	—	32,704,020	—
平均	83.5	2,840,790	93,400	3	115,450	3,800	2,725,340	89,600
最大	7/28 58.0	—	7/28 532,490	7	—	7/28 278,770	—	3/13 360,180
最小	—	—	7/26 44,670	0	—	—	—	7/26 44,670

月	晴天日汚水量 (m ³)		動 力 別 揚 水 量 (m ³)			沈 砂 ・ ス ク リ ー ン か す 量 (m ³)		
	月 量	日 量	電 動 機	エ ン ジ ン	計	沈 砂	ス ク リ ー ン か す	計
4	2,232,000	74,400	3,530,190	0	3,530,190	4.1	0.0	4.1
5	1,647,340	53,140	1,963,450	0	1,963,450	4.0	3.9	7.9
6	1,544,100	51,470	1,841,530	0	1,841,530	11.8	3.7	15.5
7	1,464,440	47,240	2,567,160	155,940	2,723,100	20.7	0.0	20.7
8	1,749,330	56,430	3,055,840	910	3,056,750	20.5	3.5	24.0
9	1,529,700	50,990	2,177,840	70,300	2,248,140	21.8	0.0	21.8
10	1,852,870	59,770	3,655,640	7,530	3,663,170	21.2	5.0	26.2
11	2,762,700	92,090	3,730,490	0	3,730,490	9.0	3.6	12.6
12	1,864,030	60,130	1,963,030	0	1,963,030	6.4	3.1	9.5
1	1,532,330	49,430	1,757,160	0	1,757,160	4.4	0.0	4.4
2	1,384,040	49,430	2,157,720	0	2,157,720	3.7	4.0	7.7
3	1,532,330	49,430	5,454,700	0	5,454,700	6.5	4.1	10.6
合計	21,095,210	—	33,854,750	234,680	34,089,430	134.1	30.9	165.0
平均	1,757,930	57,800	2,821,230	19,560	2,840,790	11.2	2.6	13.8
最大	—	11/21 103,970	7/29 468,190	7/28 133,520	—	—	—	—
最小	—	7/26 44,670	7/26 44,660	—	—	—	—	—

(2) 運 転 時 間

月	汚水ポンプ運転時間(h)				汚水 ポンプ 合計	電動雨水ポンプ運転時間(h)					
	No. 1 φ 700	No. 2 φ 700	No. 1 φ 900	No. 2 φ 900		No. 1 φ 1,350 245m ³ /分		No. 2 φ 1,350 245m ³ /分		電動 計	
	64m ³ /分	64m ³ /分	107m ³ /分	107m ³ /分		実運転	試運転	実運転	試運転	実運転	試運転
4	169.0	704.5	0.1	15.4	889.0	0.0	0.0	2.3	0.0	2.3	0.0
5	709.5	26.7	4.5	0.0	740.7	1.6	0.0	0.0	0.0	1.6	0.0
6	72.5	635.0	0.0	6.2	713.7	0.0	0.0	2.2	0.0	2.2	0.0
7	696.7	59.2	28.7	1.1	785.7	16.8	0.0	0.9	0.0	17.7	0.0
8	99.6	700.3	0.1	32.7	832.7	0.0	0.0	10.4	0.0	10.4	0.0
9	640.1	90.5	11.7	0.0	742.3	7.3	0.0	0.0	0.0	7.3	0.0
10	115.2	722.8	0.1	57.0	895.1	0.0	0.0	16.1	0.0	16.1	0.0
11	707.8	147.5	51.2	0.0	906.5	4.1	0.0	0.0	0.0	4.1	0.0
12	39.3	677.7	0.1	0.1	717.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1	580.6	126.1	0.0	0.0	706.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2	119.7	554.7	0.0	4.5	678.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
3	401.8	662.5	112.9	3.9	1,181.1	5.1	0.0	0.0	0.0	5.1	0.0
合計	4,351.8	5,107.5	209.4	120.9	9,789.6	34.9	0.0	31.9	0.0	66.8	0.0
平均	362.7	425.6	17.5	10.1	815.8	2.9	0.0	2.7	0.0	5.6	0.0
最大	709.5	722.8	112.9	57.0	1,181.1	16.8	0.0	16.1	0.0	17.7	0.0
最小	39.3	26.7	0.0	0.0	678.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

月	エンジン雨水ポンプ運転時間(h)										雨水 ポンプ 合計		自家発 運転時間 (h)	
	No. 1 φ 2, 200 660m ³ /分		No. 2 φ 2, 200 660m ³ /分		No. 3 φ 2, 200 660m ³ /分		No. 4 φ 2, 200 660m ³ /分		エンジン 計					
	実運転	試運転	実運転	試運転	実運転	試運転	実運転	試運転	実運転	試運転	実運転	試運転	実運転	試運転
4	0.0	0.2	0.0	0.2	0.0	0.0	0.0	0.2	0.0	0.6	2.3	0.6	0.0	0.2
5	0.0	0.2	0.0	0.3	0.0	0.0	0.0	0.3	0.0	0.8	1.6	0.8	0.0	0.3
6	0.5	0.3	0.0	0.3	0.0	0.3	0.0	0.3	0.5	1.2	2.7	1.2	0.0	0.3
7	0.0	0.3	2.9	0.3	0.0	0.3	7.6	0.3	10.5	1.2	28.2	1.2	0.0	0.3
8	1.8	0.3	0.0	0.3	0.0	0.3	0.0	0.3	1.8	1.2	12.2	1.2	0.0	0.3
9	0.0	0.3	4.7	0.0	0.0	0.2	0.6	0.2	5.3	0.7	12.6	0.7	0.0	0.2
10	0.5	0.3	0.0	0.3	0.0	0.3	1.9	0.3	2.4	1.2	18.5	1.2	0.0	0.3
11	0.0	0.3	0.0	0.3	0.0	0.3	0.0	0.3	0.0	1.2	4.1	1.2	0.0	0.3
12	0.0	0.2	0.0	0.2	0.0	0.3	0.0	0.2	0.0	0.9	0.0	0.9	0.0	0.2
1	0.0	0.2	0.0	0.2	0.0	0.2	0.0	0.2	0.0	0.8	0.0	0.8	0.0	0.2
2	0.0	0.4	0.0	0.3	0.0	0.3	0.0	0.3	0.0	1.3	0.0	1.3	0.0	0.3
3	0.0	0.4	0.0	0.3	0.0	0.3	0.0	0.3	0.0	1.3	5.1	1.3	0.0	0.3
合計	2.8	3.4	7.6	3.0	0.0	2.8	10.1	3.2	20.5	12.4	87.3	12.4	0.0	3.2
平均	0.2	0.3	0.6	0.3	0.0	0.2	0.8	0.3	1.7	1.0	7.3	1.0	0.0	0.3
最大	1.8	0.4	4.7	0.3	0.0	0.3	7.6	0.3	10.5	1.3	28.2	1.3	0.0	0.3
最小	0.0	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.0	0.6	0.0	0.6	0.0	0.2

(3) 電力使用量

月	電 力 使 用 量							
	水 処 理 量 (動 力)							
	揚 水 量							
	汚 水 ポ ン プ				雨 水 ポ ン プ			
	水 量 (m^3)	買 電 (kWh)	発 電 (kWh)	使 用 量 ／ 水 量	水 量 (m^3)	買 電 (kWh)	発 電 (kWh)	使 用 量 ／ 水 量
4	3,491,910	102,030	0	0.0292	38,280	870	0	0.0227
5	1,937,460	59,980	0	0.0310	25,990	590	0	0.0227
6	1,802,970	55,980	0	0.0310	38,560	820	0	0.0213
7	2,260,190	68,210	0	0.0302	306,970	6,360	0	0.0207
8	2,876,590	79,440	0	0.0276	179,250	3,750	0	0.0209
9	2,047,440	62,500	0	0.0305	130,400	2,690	0	0.0206
10	3,377,770	98,070	0	0.0290	277,870	5,820	0	0.0209
11	3,661,520	105,930	0	0.0289	68,970	1,510	0	0.0219
12	1,963,030	59,480	0	0.0303	0	20	0	—
1	1,757,160	56,040	0	0.0319	0	20	0	—
2	2,157,720	64,110	0	0.0297	0	0	0	—
3	5,370,260	157,930	0	0.0294	84,440	1,870	0	0.0221
合計	32,704,020	969,700	0	—	1,150,730	24,320	0	—
平均	2,725,340	80,808	0	0.0297	95,890	2,027	0	0.0211
最大	5,370,260	157,930	—	0.0319	306,970	6,360	—	0.0227
最小	1,757,160	55,980	—	0.0276	0	0	—	0.0206

月	電 力 使 用 量						
	そ の 他		光 熱 水 費	合 計			
	買 電 (kWh)	発 電 (kWh)	買 電 (kWh)	買 電 (kWh)	発 電 (kWh)	使 用 量 (kWh)	発電量のうち 試運転分(kWh)
4	17,832	0	2,990	123,722	0	123,722	0
5	15,318	0	3,060	78,948	0	78,948	0
6	14,645	0	2,530	73,975	0	73,975	0
7	16,604	0	3,410	94,584	0	94,584	0
8	17,326	0	3,020	103,536	0	103,536	0
9	15,702	0	2,700	83,592	0	83,592	0
10	16,593	0	2,740	123,223	0	123,223	0
11	17,537	0	3,930	128,907	0	128,907	0
12	26,010	0	5,990	91,500	0	91,500	0
1	28,038	0	8,600	92,698	0	92,698	0
2	24,648	0	7,710	96,468	0	96,468	0
3	26,758	0	5,840	192,398	0	192,398	0
合計	237,011	0	52,520	1,283,551	0	1,283,551	0
平均	19,751	0	4,377	106,963	0	106,963	0
最大	28,038	0	8,600	192,398	—	192,398	—
最小	14,645	0	2,530	73,975	—	73,975	—

(4) 重油使用量・その他（用水）

月	重油							
	動力				自家発電機			
	雨水ポンプ				燃料使用量(L)		合計	
	水量 (m ³)	燃料使用量(L)		使用量 ／ 水量	燃料使用量(L)		使用量(L)	
		実運転	試運転		実運転	試運転	実運転	試運転
4	0	0	79	—	0	12	0	91
5	0	0	84	—	0	12	0	96
6	0	0	177	—	0	12	0	189
7	155,943	1,688	118	0.0108	0	12	1,688	130
8	917	196	116	0.2137	0	12	196	128
9	70,299	721	81	0.0103	0	11	721	92
10	7,537	280	118	0.0372	0	12	280	130
11	0	0	120	—	0	12	0	132
12	0	0	110	—	0	12	0	122
1	0	0	109	—	0	11	0	120
2	0	0	131	—	0	13	0	144
3	0	0	135	—	0	12	0	147
合計	234,696	2,885	1,378	—	0	143	2,885	1,521
平均	19,560	240	115	0.0123	0	12	240	127
最大	155,943	1,688	177	0.2137	0	13	1,688	189
最小	0	0	79	0.0103	0	11	0	91

月	その他	
	用水	
	水道水 使用量 (m ³)	井戸水 使用量 (m ³)
4	0	4,894
5	1	2,500
6	0	2,213
7	1	3,077
8	0	4,908
9	1	3,051
10	0	4,350
11	1	4,397
12	0	2,901
1	1	2,272
2	0	3,052
3	1	5,676
合計	6	43,291
平均	1	3,608
最大	1	5,676
最小	0	2,213

2 決 算 状 況 調

(1) 処理区分別決算内訳

(単位 円)

項 目	管 理 費	水 処 理 費	計	比 率
職 員 数	0 人	0 人	0 人	—
給 料	0	0	0	0.0%
手 当 等	0	0	0	0.0%
法 定 福 利 費	0	0	0	0.0%
人 件 費 計	0	0	0	0.0%
被 服 費	0	0	0	0.0%
備 消 耗 品 費	0	0	0	0.0%
光 熱 水 費	0	0	0	0.0%
印 刷 製 本 費	0	0	0	0.0%
通 信 運 搬 費	0	—	0	0.0%
賃 借 料	0	0	0	0.0%
手 数 料	0	—	0	0.0%
委 託 料	0	0	0	0.0%
修 繕 費	0	80,124,896	80,124,896	64.7%
動 力 費	0	43,671,942	43,671,942	35.3%
薬 品 費	0	0	0	0.0%
損 害 保 険 料	0	0	0	0.0%
負 担 金	0	0	0	0.0%
自 動 車 重 量 税	0	0	0	0.0%
経 費 計	0	123,796,838	123,796,838	100.0%
合 計	0	123,796,838	123,796,838	100.0%
比 率	0.0%	100.0%	100.0%	—

(2) 修繕工事等内訳

直接修繕

場所	区分	修 繕 件 名	金額 (千円)	工 期	修 繕 内 容
空調機	A	茨戸中部中継ポンプ場空調機室建具修繕	受託	11/5 ～ 3/30	建具更新を行い機能回復を図る
その他	C	中部中継ポンプ場接地極増し打ち工事	受託	11/18 ～ 12/20	接地抵抗値が高いため柵内を行い機能回復を図る
計			0		

区分別集計	A	1 件	0 千円	建物
	B	0 件	0 千円	構築物
	C	1 件	0 千円	機械及び装置
	D	0 件	0 千円	車両運搬具
	E	0 件	0 千円	工具器具及び備品

請負修繕

(市発注分)

場所	区分	修 繕 件 名	金額 (千円)	工 期	修 繕 内 容
沈砂池	C	茨戸中部中継ポンプ場No.3 汚水沈砂掻揚機修繕工事	74,818	9/9 ～ 3/17	No.3 汚水沈砂掻揚機の修繕
計			74,818		

区分別集計	A	0 件	0 千円	建物
	B	0 件	0 千円	構築物
	C	1 件	74,818 千円	機械及び装置
	D	0 件	0 千円	車両運搬具
	E	0 件	0 千円	工具器具及び備品
