


茨戸東部中継ポンプ場

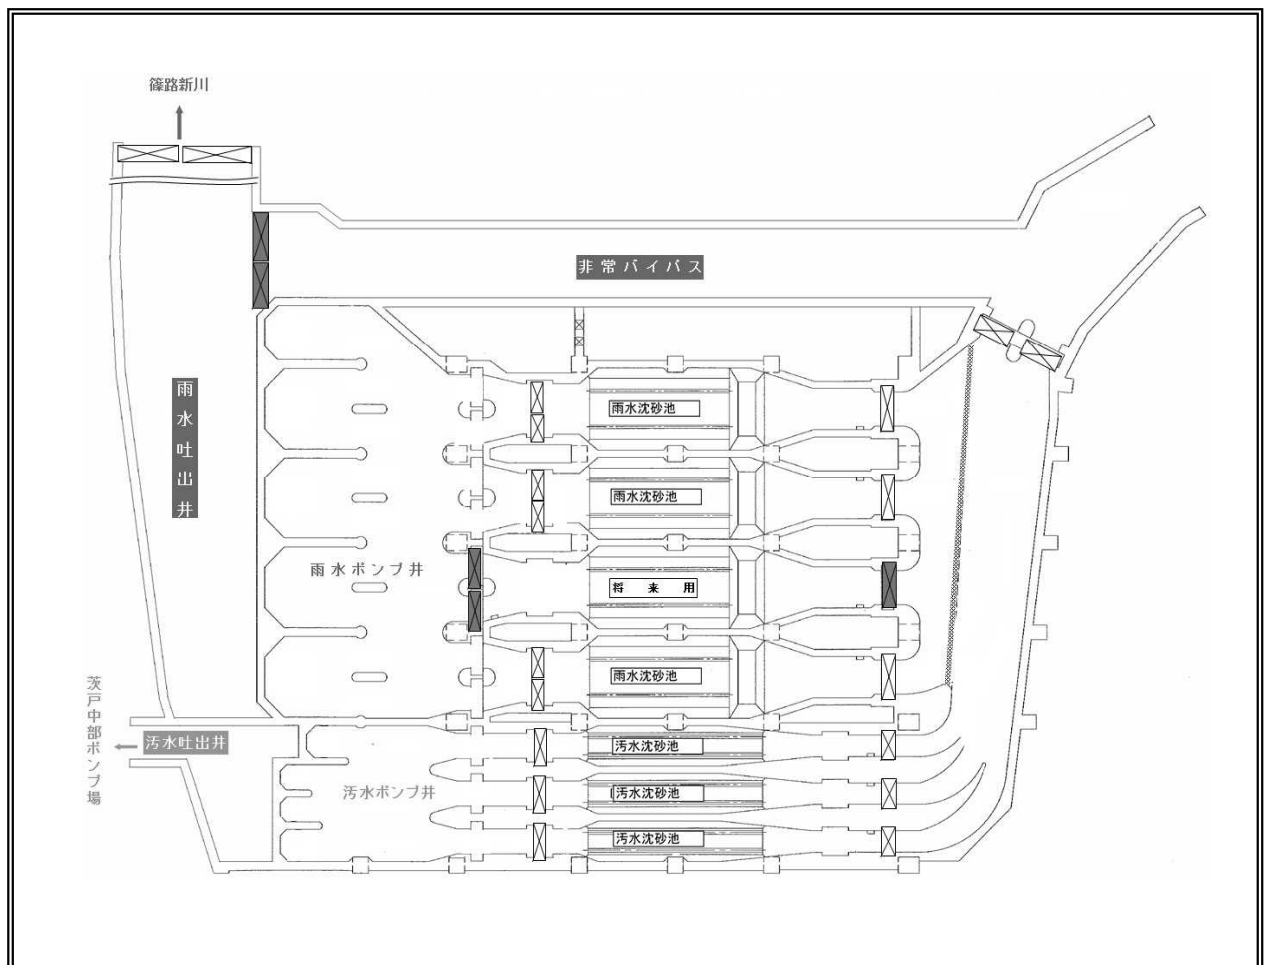

1 運 転 実 績 調

(1) 揚 水 量 等

月	降水量 (mm/月)	総揚水量 (m ³)		雨水放水量(雨水ポンプ) (m ³)			汚水送水量(汚水ポンプ) (m ³)	
		月量	日量	日数	月量	日量	月量	日量
4	32.5	1,296,510	43,220	3	13,320	450	1,283,190	42,770
5	31.0	739,300	23,850	1	20,380	660	718,920	23,190
6	36.0	635,000	21,170	2	19,970	670	615,030	20,500
7	111.0	1,118,990	36,100	3	268,560	8,670	850,430	27,430
8	100.0	1,068,320	34,460	4	79,380	2,560	988,940	31,900
9	62.5	882,970	29,430	2	116,750	3,890	766,220	25,540
10	124.0	1,368,240	44,140	7	159,740	5,160	1,208,500	38,980
11	129.5	1,416,050	47,200	4	47,750	1,590	1,368,300	45,610
12	54.0	635,810	20,510	0	0	0	635,810	20,510
1	68.5	628,190	20,260	0	0	0	628,190	20,260
2	118.0	718,470	25,660	0	0	0	718,470	25,660
3	94.5	2,207,890	71,220	7	85,000	2,740	2,122,890	68,480
合計	961.5	12,715,740	—	33	810,850	—	11,904,890	—
平均	80.1	1,059,650	34,840	3	67,570	2,220	992,070	32,620
最大	7/28 52.0	—	7/28 254,050	7	—	7/28 152,950	—	3/13 148,280
最小	—	—	7/14 16,040	0	—	—	—	7/14 16,040

月	晴天日汚水量 (m ³)		動力別揚水量 (m ³)			沈砂・スクリーンかす量 (m ³)		
	月量	日量	電動機	エンジン	計	沈砂	スクリーンかす	計
4	729,900	24,330	1,296,510	0	1,296,510	9.8	0.0	9.8
5	610,390	19,690	739,300	0	739,300	3.6	0.0	3.6
6	549,600	18,320	635,000	0	635,000	4.0	0.0	4.0
7	538,160	17,360	1,010,700	108,290	1,118,990	3.4	0.0	3.4
8	576,910	18,610	1,059,820	8,500	1,068,320	10.4	3.4	13.8
9	613,500	20,450	827,340	55,630	882,970	4.2	0.0	4.2
10	623,100	20,100	1,360,010	8,230	1,368,240	4.0	0.0	4.0
11	923,700	30,790	1,416,050	0	1,416,050	15.1	0.0	15.1
12	608,530	19,630	635,810	0	635,810	0.0	3.4	3.4
1	560,790	18,090	628,190	0	628,190	0.0	0.0	0.0
2	506,520	18,090	718,470	0	718,470	4.0	0.0	4.0
3	560,790	18,090	2,207,890	0	2,207,890	3.9	0.0	3.9
合計	7,401,890	—	12,535,090	180,650	12,715,740	62.4	6.8	69.2
平均	616,820	20,280	1,044,590	15,050	1,059,650	5.2	0.6	5.8
最大	—	11/21 38,480	7/29 211,700	7/28 82,010	—	—	—	—
最小	—	7/14 16,040	—	—	—	—	—	—

(2) 運 転 時 間

月	汚水ポンプ運転時間(h)					雨水ポンプ（電動）運転時間(h)					
	No. 1 φ 450	No. 2 φ 450	汚水 φ 600	汚雨 φ 600汚	合計	汚雨 φ 600雨 49m ³ /分		雨水 φ 1,000 150m ³ /分		計	
	23m ³ /分	23m ³ /分	49m ³ /分	49m ³ /分		実運転	試運転	実運転	試運転	実運転	試運転
4	183.3	581.2	17.3	0.0	781.8	0.0	0.0	1.5	0.0	1.5	0.0
5	412.0	23.0	5.3	0.0	440.3	0.0	0.0	2.2	0.0	2.2	0.0
6	46.1	330.0	5.0	0.0	381.1	0.0	0.0	2.1	0.0	2.1	0.0
7	399.6	58.2	32.4	0.0	490.2	0.0	0.0	17.4	0.0	17.4	0.0
8	75.6	425.3	32.6	0.0	533.5	0.0	0.0	7.6	0.0	7.6	0.0
9	370.1	69.2	17.0	0.0	456.3	0.0	0.0	6.6	0.0	6.6	0.0
10	111.7	525.1	54.8	1.6	693.2	0.0	0.0	16.2	0.0	16.2	0.0
11	588.0	146.8	53.7	0.0	788.5	0.0	0.0	5.2	0.0	5.2	0.0
12	23.0	376.8	0.0	0.0	399.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1	327.4	63.1	0.0	0.0	390.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2	45.7	392.3	0.0	6.9	444.9	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.1
3	662.4	389.8	3.2	121.5	1,176.9	0.0	0.0	9.3	0.0	9.3	0.0
合計	3,244.9	3,380.8	221.3	130.0	6,977.0	0.0	0.0	68.1	0.1	68.1	0.1
平均	270.4	281.7	18.4	10.8	581.4	0.0	0.0	5.7	0.0	5.7	0.0
最大	662.4	581.2	54.8	121.5	1,176.9	0.0	0.0	17.4	0.1	17.4	0.1
最小	23.0	23.0	0.0	0.0	381.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

月	雨水ポンプ（エンジン）運転時間（h）								雨水ポンプ 合計		自家発 運転時間 (h)	
	No. 1 φ 1, 500 270m ³ /分		No. 3 φ 1, 500 270m ³ /分		No. 4 φ 1, 500 270m ³ /分		計					
	実運転	試運転	実運転	試運転	実運転	試運転	実運転	試運転	実運転	試運転	実運転	試運転
4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.5	0.0	0.0	0.3
5	0.0	0.4	0.0	0.4	0.0	0.5	0.0	1.3	2.2	1.3	0.0	0.3
6	0.0	0.2	0.0	0.2	0.0	0.2	0.0	0.6	2.1	0.6	0.0	0.2
7	0.0	0.3	8.4	0.3	2.2	0.3	10.6	0.9	28.0	0.9	0.0	0.3
8	0.0	0.3	1.5	0.3	0.0	0.3	1.5	0.9	9.1	0.9	0.0	0.3
9	1.3	0.3	0.0	0.3	5.6	0.3	6.9	0.9	13.5	0.9	0.0	0.3
10	1.6	0.3	0.0	0.3	0.0	0.3	1.6	0.9	17.8	0.9	0.0	0.2
11	0.0	0.3	0.0	0.3	0.0	0.3	0.0	0.9	5.2	0.9	0.0	0.3
12	0.0	0.2	0.0	0.2	0.0	0.3	0.0	0.7	0.0	0.7	0.0	0.2
1	0.0	0.2	0.0	0.2	0.0	0.2	0.0	0.6	0.0	0.6	0.0	0.3
2	0.0	0.3	0.0	0.2	0.0	0.2	0.0	0.7	0.0	0.8	0.0	0.3
3	0.0	0.3	0.0	0.3	0.0	0.3	0.0	0.9	9.3	0.9	0.0	0.3
合計	2.9	3.1	9.9	3.0	7.8	3.2	20.6	9.3	88.7	9.4	0.0	3.3
平均	0.2	0.3	0.8	0.3	0.7	0.3	1.7	0.8	7.4	0.8	0.0	0.3
最大	1.6	0.4	8.4	0.4	5.6	0.5	10.6	1.3	28.0	1.3	0.0	0.3
最小	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2

(3) 電力使用量

月	電 力 量							
	水 処 理 量 (動 力)							
	揚 水 量							
	汚 水 ポ ン プ				雨 水 ポ ン プ			
	水 量 (m^3)	買 電 (kWh)	発 電 (kWh)	使 用 量 ／ 水 量	水 量 (m^3)	買 電 (kWh)	発 電 (kWh)	使 用 量 ／ 水 量
4	1,283,190	44,720	0	0.0349	13,320	400	0	0.0300
5	718,920	24,170	0	0.0336	20,380	620	0	0.0304
6	615,030	20,960	0	0.0341	19,970	590	0	0.0295
7	850,430	28,350	0	0.0333	160,270	4,900	0	0.0306
8	988,940	30,550	0	0.0309	70,880	2,110	0	0.0298
9	766,220	25,310	0	0.0330	61,120	1,880	0	0.0308
10	1,208,500	41,160	0	0.0341	151,510	4,490	0	0.0296
11	1,368,300	46,430	0	0.0339	47,750	1,450	0	0.0304
12	635,810	21,600	0	0.0340	0	0	0	—
1	628,190	21,200	0	0.0337	0	10	0	—
2	718,470	24,850	0	0.0346	0	10	0	—
3	2,122,890	73,840	0	0.0348	85,000	2,570	0	0.0302
合計	11,904,890	403,140	0	—	630,200	19,030	0	—
平均	992,070	33,595	0	0.0339	52,520	1,586	0	0.0302
最大	2,122,890	73,840	—	0.0349	160,270	4,900	—	0.0308
最小	615,030	20,960	—	0.0309	0	0	—	0.0295

月	電 力 量						
	そ の 他		光熱水費	合 計			
	買 電 (kWh)	発 電 (kWh)	買 電 (kWh)	買 電 (kWh)	発 電 (kWh)	使 用 量 (kWh)	発電量のうち 試運転分(kWh)
4	12,853	0	1,450	59,423	0	59,423	0
5	10,803	0	1,450	37,043	0	37,043	0
6	10,208	0	1,430	33,188	0	33,188	0
7	10,621	0	1,430	45,301	0	45,301	0
8	10,670	0	1,430	44,760	0	44,760	0
9	10,118	0	1,450	38,758	0	38,758	0
10	10,526	0	1,580	57,756	0	57,756	0
11	13,783	0	1,630	63,293	0	63,293	0
12	18,422	0	2,130	42,152	0	42,152	0
1	18,649	0	2,160	42,019	0	42,019	0
2	15,973	0	1,930	42,763	0	42,763	0
3	17,218	0	1,830	95,458	0	95,458	0
合計	159,844	0	19,900	601,914	0	601,914	0
平均	13,320	0	1,658	50,160	0	50,160	0
最大	18,649	0	2,160	95,458	—	95,458	—
最小	10,118	0	1,430	33,188	—	33,188	—

(4) 重油使用量・その他（用水）

月	重油								
	動力						その他 使用量 (L)	合計	
	雨水ポンプ				自家発電機			使用量 (L)	
	水量 (m ³)	実運転 (L)	試運転 (L)	使用量 ／ 水量	実運転 (L)	試運転 (L)		実運転 (L)	試運転 (L)
4	0	0	0	—	0	7	0	0	7
5	0	0	131	—	0	6	0	0	137
6	0	0	58	—	0	6	0	0	64
7	108,290	1,161	65	0.0107	0	7	0	1,161	72
8	8,500	134	67	0.0158	0	6	0	134	73
9	55,630	701	65	0.0126	0	6	0	701	71
10	8,230	150	64	0.0182	0	5	0	150	69
11	0	0	67	—	0	7	0	0	74
12	0	0	63	—	0	6	0	0	69
1	0	0	63	—	0	6	0	0	69
2	0	0	65	—	0	6	0	0	71
3	0	0	68	—	0	7	0	0	75
合計	180,650	2,146	776	—	0	75	0	2,146	851
平均	15,050	179	65	0.0119	0	6	0	179	71
最大	108,290	1,161	131	0.0182	0	7	0	1,161	137
最小	0	0	0	0.0107	0	5	0	0	7

月	そ の 他	
	用 水	
	水 道 水 (m ³)	井 戸 水 (m ³)
4	0	1,062
5	0	867
6	1	681
7	0	876
8	0	726
9	1	832
10	2	1,052
11	1	1,220
12	0	698
1	1	540
2	0	687
3	1	1,771
合計	7	11,012
平均	1	918
最大	2	1,771
最小	0	540

2 決 算 状 況 調

(1) 処理区分別決算内訳

(単位 円)

項 目	管 理 費	水 処 理 費	計	比 率
職 員 数	0 人	0 人	0 人	—
給 料	0	0	0	0.0%
手 当 等	0	0	0	0.0%
法 定 福 利 費	0	0	0	0.0%
人 件 費 計	0	0	0	0.0%
被 服 費	0	0	0	0.0%
備 消 耗 品 費	0	0	0	0.0%
光 熱 水 費	0	0	0	0.0%
印 刷 製 本 費	0	0	0	0.0%
通 信 運 搬 費	0	—	0	0.0%
賃 借 料	0	0	0	0.0%
手 数 料	0	—	0	0.0%
委 託 料	0	0	0	0.0%
修 繕 費	44,858,110	19,726,844	64,584,954	73.6%
動 力 費	0	23,217,319	23,217,319	26.4%
薬 品 費	0	0	0	0.0%
損 害 保 険 料	0	0	0	0.0%
負 担 金	0	0	0	0.0%
自 動 車 重 量 税	0	0	0	0.0%
経 費 計	44,858,110	42,944,163	87,802,273	100.0%
合 計	44,858,110	42,944,163	87,802,273	100.0%
比 率	51.1%	48.9%	100.0%	—

(2) 修繕工事等内訳

直接修繕

場所	区分	修 繕 件 名	金額 (千円)	工 期	修 繕 内 容
計			0		

区分別集計	A	0 件	0 千円	建物
	B	0 件	0 千円	構築物
	C	0 件	0 千円	機械及び装置
	D	0 件	0 千円	車両運搬具
	E	0 件	0 千円	工具器具及び備品

請 負 修 繕

(市発注分)

場所	区分	修 繕 件 名	金額 (千円)	工 期	修 繕 内 容
ポ 室 ン プ	C	茨戸東部中継ポンプ場汚雨水ポンプ600φ用電動機ほか修繕工事	44,858	4/22 ～ 3/14	汚雨水ポンプ600φの電動機、起動制御器等整備
そ の 他	A	茨戸水再生プラザほか煙突改修工事	16,650	9/2 ～ 1/31	煙突ライニング材の撤去
計			61,508		

区分別集計	A	1 件	16,650 千円	建物
	B	0 件	0 千円	構築物
	C	1 件	44,858 千円	機械及び装置
	D	0 件	0 千円	車両運搬具
	E	0 件	0 千円	工具器具及び備品
