


米里中継ポンプ場

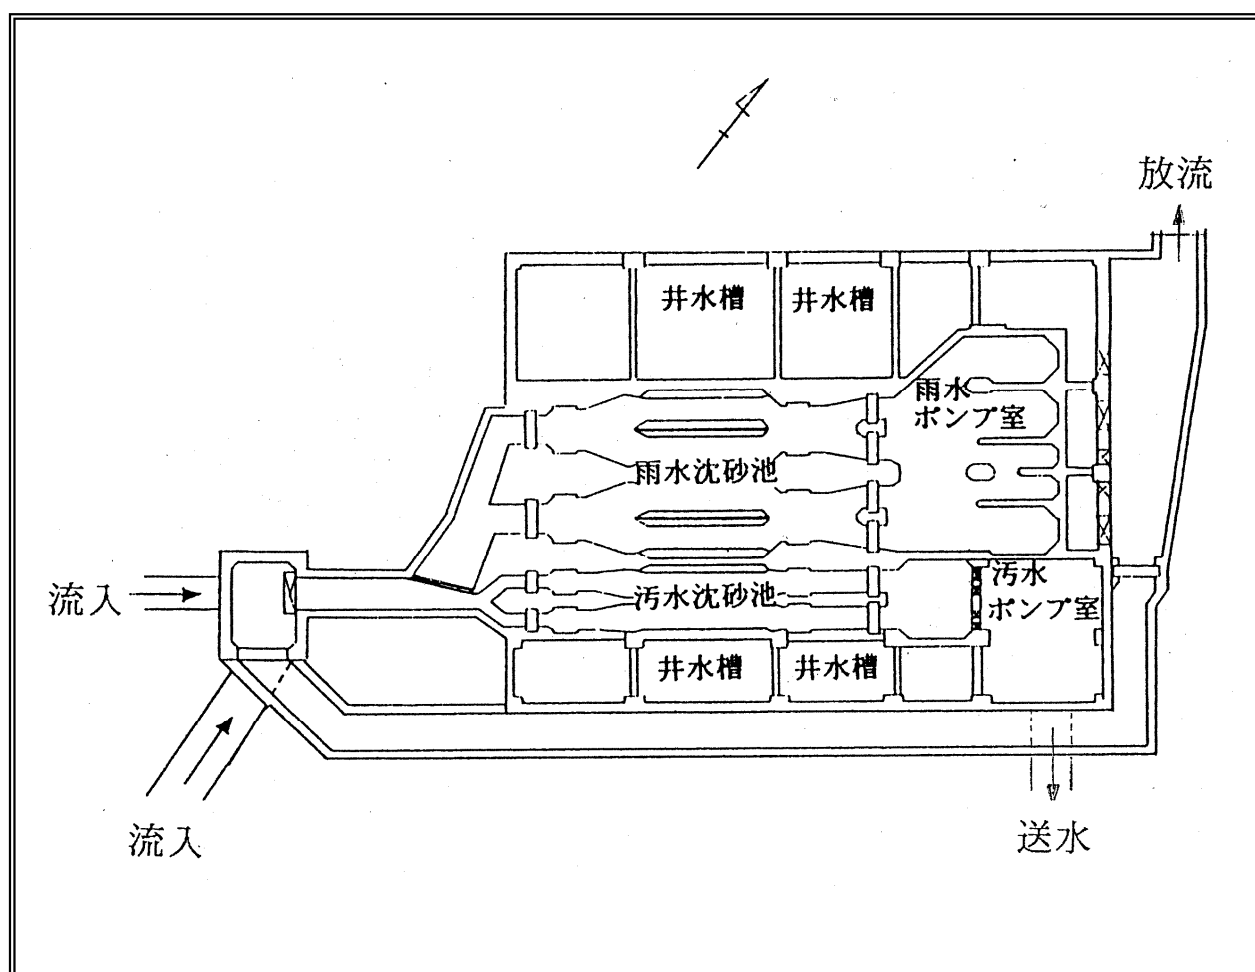

1 運 転 実 績 調

(1) 揚 水 量 等

月	降 水 量	総 揚 水 量		雨 水 放 水 量 (雨 水 ポ ン プ)			送 水 量 (汚 水 ポ ン プ)	
	mm/月	月量(m ³)	日量(m ³)	日数	月量(m ³)	日量(m ³)	月量(m ³)	日量(m ³)
4	27.0	144,090	4,800	1	320	10	143,770	4,790
5	38.0	80,420	2,590	1	3,840	120	76,580	2,470
6	39.5	68,480	2,280	2	4,200	140	64,280	2,140
7	121.0	146,000	4,710	2	45,210	1,460	100,790	3,250
8	101.0	123,180	3,970	2	11,370	370	111,810	3,600
9	76.0	112,490	3,750	3	25,660	860	86,830	2,890
10	144.0	174,250	5,620	7	19,280	620	154,970	5,000
11	116.5	175,560	5,850	3	3,450	120	172,110	5,730
12	54.0	69,930	2,260	0	0	0	69,930	2,260
1	68.5	65,790	2,120	0	0	0	65,790	2,120
2	118.0	85,000	3,040	0	0	0	85,000	3,040
3	94.5	272,590	8,790	1	1,330	40	271,260	8,750
合 計	998.0	1,517,780	—	22	114,660	—	1,403,120	—
平 均	83.2	126,480	4,160	2	9,560	320	116,930	3,840
最大	7/28 64.0	—	7/28 46,060	—	—	7/28 32,110	—	3/13 24,810
最小	—	—	1/1 1,530	—	—	—	—	1/1 1,530

月	晴天時汚水量		動力別揚水量 (m ³)			沈砂・スクリーンかす量(m ³)		
			電動機の	エンジンの	計	沈砂	スクリーンかす	計
	月量(m ³)	日量(m ³)	揚水量	揚水量				
4	85,500	2,850	144,090	0	144,090	0.0	0.0	0.0
5	61,380	1,980	80,420	0	80,420	5.1	0.0	5.1
6	53,700	1,790	68,480	0	68,480	0.0	0.0	0.0
7	54,250	1,750	127,060	18,940	146,000	0.0	0.0	0.0
8	59,830	1,930	122,210	970	123,180	3.5	0.0	3.5
9	61,800	2,060	102,600	9,890	112,490	0.0	0.0	0.0
10	68,510	2,210	174,250	0	174,250	4.3	0.0	4.3
11	82,500	2,750	175,560	0	175,560	0.0	0.0	0.0
12	63,550	2,050	69,930	0	69,930	0.0	0.0	0.0
1	53,320	1,720	65,790	0	65,790	0.0	0.0	0.0
2	48,160	1,720	85,000	0	85,000	0.0	0.0	0.0
3	53,320	1,720	272,590	0	272,590	0.0	0.0	0.0
合 計	745,820	—	1,487,980	29,800	1,517,780	12.9	0.0	12.9
平 均	62,150	2,040	124,000	2,480	126,480	1.1	0.0	1.1
最大	—	4/13 3,770	7/29 34,478	7/28 16,367	—	—	—	—
最小	—	1/2 1,540	—	—	—	—	—	—

(2) 運 転 時 間

月	汚水ポンプ運転時間(h)				
	I-No. 1 ϕ 200	I-No. 2 ϕ 200	II-No. 1 ϕ 350	II-No. 2 ϕ 350	計
	4.2 m ³ /分	4.2 m ³ /分	17 m ³ /分	17 m ³ /分	
4	493.9	83.3	8.8	0.0	586.0
5	20.2	292.9	0.0	4.9	318.0
6	234.3	31.8	5.0	0.0	271.1
7	42.3	296.4	0.7	25.1	364.5
8	266.2	124.1	23.4	0.1	413.8
9	51.1	275.6	0.0	13.1	339.8
10	419.5	87.1	43.6	0.0	550.2
11	512.6	113.5	0.0	29.1	655.2
12	308.5	0.8	0.0	0.0	309.3
1	37.2	233.1	0.0	0.0	270.3
2	313.6	37.2	2.2	0.1	353.1
3	285.3	602.4	1.7	54.2	943.6
合計	2,984.7	2,178.2	85.4	126.6	5,374.9
平均	248.7	181.5	7.1	10.6	447.9
最大	512.6	602.4	43.6	54.2	943.6
最小	20.2	0.8	0.0	0.0	270.3

月	雨水ポンプ運転時間(h)								自家発電機	
	電動 φ 500		No. 1 φ 1,000		No. 2 φ 1,000		計		運転時間(h)	
	36 m³/分		140 m³/分		140 m³/分				500 kVA	
	実運転	試運転	実運転	試運転	実運転	試運転	実運転	試運転	実運転	試運転
4	0.1	0.0	0.0	0.5	0.0	0.5	0.1	1.0	0.0	0.5
5	1.5	0.0	0.0	0.5	0.0	0.6	1.5	1.1	0.0	0.5
6	1.7	0.0	0.0	0.5	0.0	0.5	1.7	1.0	0.0	0.5
7	10.5	0.0	5.0	0.5	0.0	0.5	15.5	1.0	0.0	0.5
8	4.2	0.0	0.1	0.5	0.9	0.5	5.2	1.0	0.0	0.6
9	6.0	0.0	4.4	0.5	0.0	0.5	10.4	1.0	0.0	0.5
10	7.9	0.0	0.0	0.5	0.0	0.5	7.9	1.0	0.0	0.5
11	1.6	0.0	0.0	0.5	0.0	0.5	1.6	1.0	0.0	0.5
12	0.0	0.0	0.0	0.5	0.0	0.5	0.0	1.0	0.0	0.5
1	0.0	0.0	0.0	0.5	0.0	0.5	0.0	1.0	0.0	0.5
2	0.0	0.0	0.0	0.5	0.0	0.5	0.0	1.0	0.0	0.6
3	0.5	0.0	0.0	0.5	0.0	0.5	0.5	1.0	0.0	0.5
合計	34.0	0.0	9.5	6.0	0.9	6.1	44.4	12.1	0.0	6.2
平均	2.8	0.0	0.8	0.5	0.1	0.5	3.7	1.0	0.0	0.5
最大	10.5	0.0	5.0	0.5	0.9	0.6	15.5	1.1	0.0	0.6
最小	0.0	0.0	0.0	0.5	0.0	0.5	0.0	1.0	0.0	0.5

(3) 電力使用量

月	動力							
	水処理							
	揚水							
	汚水ポンプ				雨水ポンプ			
	水量 (m ³)	買電 (kWh)	発電 (kWh)	使用量 ／水量	水量 (m ³)	買電 (kWh)	発電 (kWh)	使用量 ／水量
4	143,770	9,146	0	0.0636	320	13	0	0.0406
5	76,580	4,966	0	0.0648	3,840	132	0	0.0344
6	64,280	4,264	0	0.0663	4,200	141	0	0.0336
7	100,790	6,490	0	0.0644	26,270	885	0	0.0337
8	111,810	7,129	0	0.0638	10,400	352	0	0.0338
9	86,830	5,618	0	0.0647	15,770	513	0	0.0325
10	154,970	4,467	0	0.0288	19,280	668	0	0.0346
11	172,110	10,983	0	0.0638	3,450	131	0	0.0380
12	69,930	4,636	0	0.0663	0	2	0	—
1	65,790	4,051	0	0.0616	0	0	0	—
2	85,000	5,382	0	0.0633	0	1	0	—
3	271,260	16,388	0	0.0604	1,330	44	0	0.0331
合計	1,403,120	83,520	0	—	84,860	2,882	0	—
平均	116,930	6,960	0	0.0595	7,070	240	0	0.0340
最大	271,260	16,388	—	0.0663	26,270	885	—	0.0406
最小	64,280	4,051	—	0.0288	0	0	—	0.0325

月	動 力		光熱水費	電 力 量 合 計				
	水 処 理			買 電 (kWh)	買 電 (kWh)	発 電 (kWh)	使 用 量 (kWh)	発電量のうち 試運転分 (kWh)
	そ の 他							
	買 電 (kWh)	発 電 (kWh)						
4	6,568	0	2,695	18,422	0	18,422	0	
5	6,742	0	1,557	13,397	0	13,397	0	
6	6,562	0	1,467	12,434	0	12,434	0	
7	7,545	0	1,549	16,469	0	16,469	0	
8	8,351	0	1,571	17,403	0	17,403	0	
9	5,974	0	1,502	13,607	0	13,607	0	
10	10,742	0	1,554	17,431	0	17,431	0	
11	5,969	0	1,764	18,847	0	18,847	0	
12	7,643	0	4,640	16,921	0	16,921	0	
1	7,373	0	5,722	17,146	0	17,146	0	
2	6,280	0	5,132	16,795	0	16,795	0	
3	3,721	0	4,638	24,791	0	24,791	0	
合計	83,470	0	33,791	203,663	0	203,663	0	
平均	6,956	0	2,816	16,972	0	16,972	0	
最大	10,742	—	5,722	24,791	—	24,791	—	
最小	3,721	—	1,467	12,434	—	12,434	—	

(4) 重油使用量・その他

月	重油							
	動力						合計	
	汚水・雨水ポンプ				自家発電機			
	水 量 (m³)	燃料使用量(L)		使用量 ／水量	燃料使用量(L)		重油使用量(L)	
		実運転	試運転		実運転	試運転	実運転	試運転
4	0	0	55	－	0	72	0	127
5	0	0	51	－	0	72	0	123
6	0	0	50	－	0	71	0	121
7	18,940	340	48	0.0180	0	69	340	117
8	970	64	50	0.0660	0	77	64	127
9	9,890	303	22	0.0306	0	73	303	95
10	0	0	44	－	0	73	0	117
11	0	0	51	－	0	72	0	123
12	0	0	54	－	0	74	0	128
1	0	0	50	－	0	70	0	120
2	0	0	55	－	0	89	0	144
3	0	0	52	－	0	72	0	124
合計	29,800	707	582	－	0	884	707	1,466
平均	2,480	59	49	0.0237	0	74	59	122
最大	18,940	340	55	0.0660	0	89	340	144
最小	0	0	22	0.0180	0	69	0	95

月	そ の 他		
	油 類	用 水	
	白 灯 油	水 道 水	井 戸 水
	使用量 (L)	使用量 (m ³)	使用量 (m ³)
4	1	0	696
5	0	0	817
6	0	0	441
7	0	0	1,173
8	0	0	1,013
9	0	0	832
10	0	2	1,283
11	2	0	1,003
12	20	0	680
1	26	0	633
2	18	0	737
3	7	0	967
合計	74	2	10,275
平均	6	0	856
最大	26	2	1,283
最小	0	0	441

2 決 算 状 況 調

(1) 処理区分別決算内訳

(単位 円)

項 目	管 理 費	水 処 理 費	計	比 率
職 員 数	0 人	0 人	0 人	-
給 料	0	0	0	0.0%
手 当 等	0	0	0	0.0%
法 定 福 利 費	0	0	0	0.0%
人 件 費 計	0	0	0	0.0%
被 服 費	0	0	0	0.0%
備 消 耗 品 費	0	0	0	0.0%
光 熱 水 費	0	0	0	0.0%
印 刷 製 本 費	0	0	0	0.0%
通 信 運 搬 費	0	-	0	0.0%
賃 借 料	0	0	0	0.0%
手 数 料	0	-	0	0.0%
委 託 料	0	0	0	0.0%
修 繕 費	1,012,550	2,195,050	3,207,600	29.7%
動 力 費	0	7,607,214	7,607,214	70.3%
薬 品 費	0	0	0	0.0%
損 害 保 険 料	0	0	0	0.0%
負 担 金	0	0	0	0.0%
自 動 車 重 量 税	0	0	0	0.0%
経 費 計	1,012,550	9,802,264	10,814,814	100.0%
合 計	1,012,550	9,802,264	10,814,814	100.0%
比 率	9.4%	90.6%	100.0%	-

(2) 修繕工事内訳

直 接 修 繕

場所	区分	修 繕 件 名	金額 (千円)	工 期	修 繕 内 容
沈砂池・ポンプ	C	封水用高架水槽揚水ポンプNo. 1修繕	52	5/8	ポンプ交換
その他	C	放流ゲート修繕	2	10/25	補修塗装
計			54		

区分別集計	A	0 件	0 千円	建物
	B	0 件	0 千円	構築物
	C	2 件	54 千円	機械及び装置
	D	0 件	0 千円	車両運搬具
	E	0 件	0 千円	工具及び備品

請 負 修 繕

場所	区分	修 繕 件 名	金額 (千円)	工 期	修 繕 内 容
その他	A	米里中継ポンプ場灯油タンク室ドア修繕工事	924	2024 10/1 ~ 2024 12/24	灯油タンク室ドアの交換
計			924		

区分別集計	A	1 件	924 千円	建物
	B	0 件	0 千円	構築物
	C	0 件	0 千円	機械及び装置
	D	0 件	0 千円	車両運搬具
	E	0 件	0 千円	工具及び備品
