


厚別川雨水ポンプ場

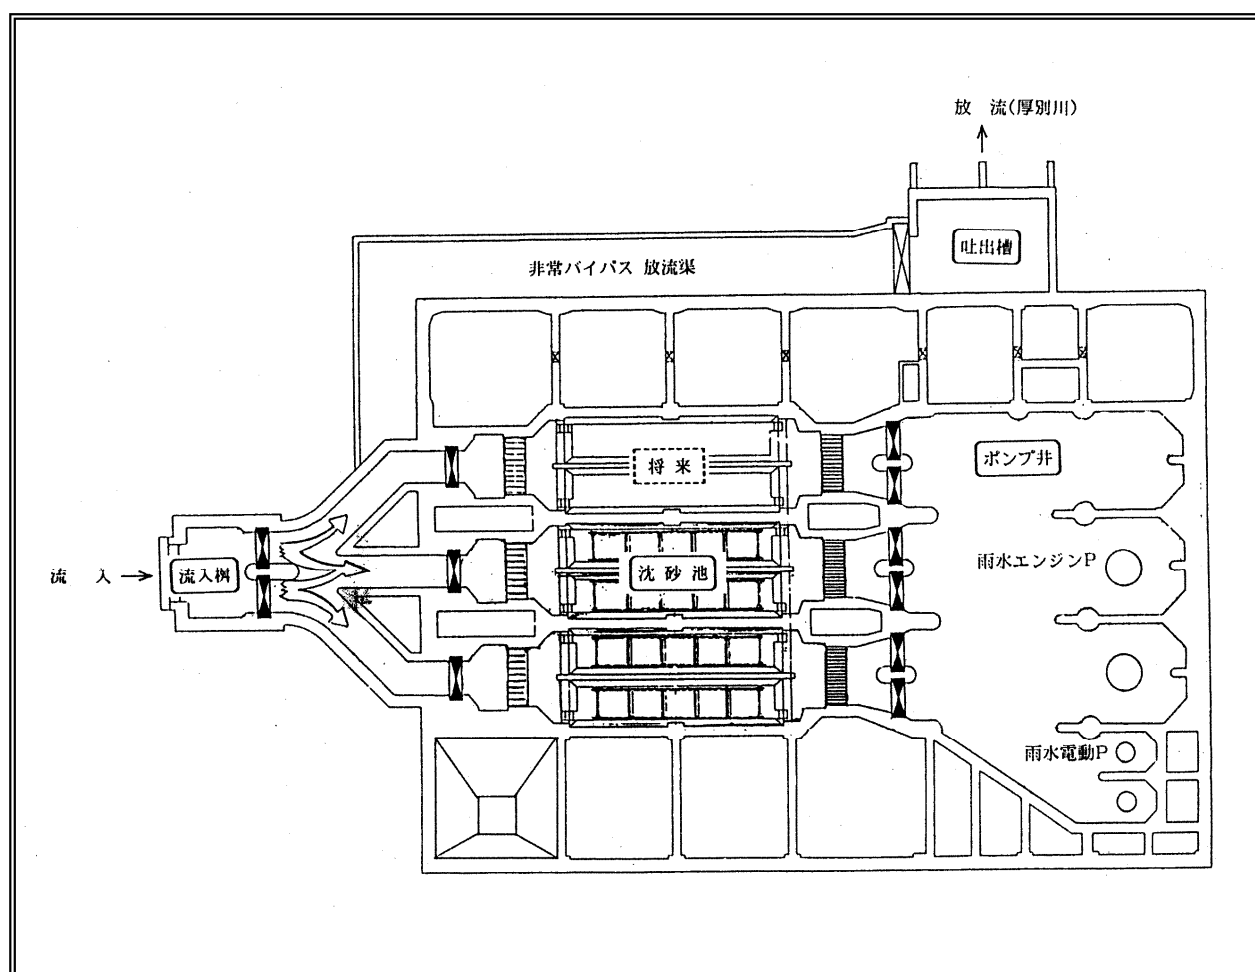

1 運 転 実 績 調

(1) 揚 水 量 等

月	降水量 (mm/月)	総 揚 水 量 (m ³)		雨 水 放 流 量 (m ³)							
		月 量	日 量	雨 水 ポ ン プ			ポンプ井排水ポンプ			計	
				日数	月 量	日 量	日数	月 量	日 量	月 量	日 量
4	20.5	165,670	5,520	14	77,900	2,600	0	0	0	77,900	2,600
5	24.0	83,460	2,690	6	27,400	880	0	0	0	27,400	880
6	26.0	68,840	2,290	5	29,200	970	0	0	0	29,200	970
7	96.5	214,640	6,920	7	173,200	5,590	0	0	0	173,200	5,590
8	138.0	264,930	8,550	11	203,500	6,560	0	0	0	203,500	6,560
9	64.5	160,980	5,370	5	104,800	3,490	0	0	0	104,800	3,490
10	100.0	248,260	8,010	10	176,600	5,700	0	0	0	176,600	5,700
11	70.5	216,190	7,210	17	130,900	4,360	0	0	0	130,900	4,360
12	54.0	55,590	1,790	1	2,300	70	0	0	0	2,300	70
1	68.5	51,750	1,670	0	0	0	0	0	0	0	0
2	118.0	76,360	2,730	5	10,500	380	0	0	0	10,500	380
3	94.5	296,420	9,560	26	213,400	6,880	0	0	0	213,400	6,880
合計	875.0	1,903,090	—	107	1,149,700	—	0	0	—	1,149,700	—
平均	72.9	158,590	5,210	9	95,810	3,150	0	0	0	95,810	3,150
最大	8/27 65.5	—	7/28 104,310	26	—	7/28 102,400	—	—	—	—	—
最小	—	—	7/21 780	0	—	—	—	—	—	—	—

月	送 水 量 (m ³)		動 力 別 雨 水 放 流 量 (m ³)			沈砂・スクリーンかす量(m ³)		
	ポンプ井排水ポンプ		電動機による 放 流 量	エンジンによる 放 流 量	計	沈砂	スクリー ンかす	計
	月 量	日 量						
4	87,770	2,920	77,900	0	77,900	0.0	0.0	0.0
5	56,060	1,810	27,400	0	27,400	0.0	0.0	0.0
6	39,640	1,320	20,500	8,700	29,200	0.0	0.0	0.0
7	41,440	1,330	66,000	107,200	173,200	9.6	0.0	9.6
8	61,430	1,990	115,900	87,600	203,500	6.5	0.0	6.5
9	56,180	1,880	24,700	80,100	104,800	0.0	0.0	0.0
10	71,660	2,310	160,500	16,100	176,600	6.0	0.0	6.0
11	85,290	2,850	124,200	6,700	130,900	5.1	0.0	5.1
12	53,290	1,720	2,300	0	2,300	0.0	0.0	0.0
1	51,750	1,670	0	0	0	0.0	0.0	0.0
2	65,860	2,350	10,500	0	10,500	0.0	0.0	0.0
3	83,020	2,680	213,400	0	213,400	0.0	0.0	0.0
合計	753,390	—	843,300	306,400	1,149,700	27.2	0.0	27.2
平均	62,780	2,060	70,280	25,530	95,810	2.3	0.0	2.3
最大	—	4/10 3,460	—	—	—	—	—	—
最小	—	7/21 780	—	—	—	—	—	—

※ 雑排水量は、総揚水量、動力別揚水量に含まない。

(2) 運 転 時 間

月	ポンプ井排水ポンプ運転時間(h)			雨 水 電 動 ポ ン プ 運 転 時 間 (h)		
	送 水	放 流	計	No. 1	No. 2	計
				実運転+試運転	実運転+試運転	実運転+試運転
4	609.5	0.0	609.5	0.5	11.8	12.3
5	389.8	0.0	389.8	0.0	4.1	4.1
6	275.0	0.0	275.0	0.0	3.0	3.0
7	288.1	0.0	288.1	0.0	10.0	10.0
8	426.5	0.0	426.5	9.3	8.3	17.6
9	390.1	0.0	390.1	3.9	0.0	3.9
10	497.8	0.0	497.8	24.1	0.0	24.1
11	592.3	0.0	592.3	19.2	0.0	19.2
12	369.9	0.0	369.9	0.4	0.0	0.4
1	359.6	0.0	359.6	0.0	0.0	0.0
2	457.4	0.0	457.4	1.6	0.0	1.6
3	576.6	0.0	576.6	33.8	0.0	33.8
合計	5,232.6	0.0	5,232.6	92.8	37.2	130.0
平均	436.1	0.0	436.1	7.7	3.1	10.8
最大	609.5	—	609.5	33.8	11.8	33.8
最小	275.0	—	275.0	0.0	0.0	0.0

月	雨水エンジンポンプ運転時間 (h)						自家発電機 運転時間 625 kVA(h)	
	No. 1		No. 2		計			
	実運転	試運転	実運転	試運転	実運転	試運転	実運転	試運転
4	0.0	0.3	0	0.2	0.0	0.5	0.0	0.1
5	0.0	0.3	0.0	0.3	0.0	0.6	0.0	0.2
6	0.0	0.2	1.5	0.2	1.5	0.4	0.0	0.1
7	8.6	0.2	0.7	0.2	9.3	0.4	0.0	0.1
8	0.6	0.2	7.4	0.2	8.0	0.4	0.0	0.1
9	6.6	0.2	0.0	0.2	6.6	0.4	0.0	0.1
10	0.0	0.3	2.6	0.3	2.6	0.6	0.0	0.1
11	1.2	0.2	0.0	0.2	1.2	0.4	0.0	0.1
12	0.0	0.2	0.0	0.2	0.0	0.4	0.0	0.1
1	0.0	0.3	0.0	0.3	0.0	0.6	0.0	0.1
2	0.0	0.2	0.0	0.2	0.0	0.4	0.0	0.1
3	0.0	0.2	0.0	0.3	0.0	0.5	0.0	0.1
合 計	17.0	2.8	12.2	2.8	29.2	5.6	0.0	1.3
平 均	1.4	0.2	1.0	0.2	2.4	0.5	0.0	0.1
最 大	8.6	0.3	7.4	0.3	9.3	0.6	0.0	0.2
最 小	0.0	0.2	0.0	0.2	0.0	0.4	0.0	0.1

(3) 電力使用量

月	電 力 量					
	動 力					
	雨 水 揚 水				その他	
	雨水電動ポンプ					
	揚水量 (m ³)	買 電 (kWh)	発電量 (kWh)	使用量 /揚水量	買 電 (kWh)	発電量 (kWh)
4	77,900	3,610	0	0.0463	22,210	0
5	27,400	1,220	0	0.0445	14,772	0
6	20,500	890	0	0.0434	14,272	0
7	66,000	2,850	0	0.0432	17,006	0
8	115,900	5,150	0	0.0444	20,301	0
9	24,700	1,160	0	0.0470	17,138	0
10	160,500	7,340	0	0.0457	18,876	0
11	124,200	5,800	0	0.0467	22,097	0
12	2,300	120	0	0.0522	23,393	0
1	0	0	0	—	23,873	0
2	10,500	470	0	0.0448	23,914	0
3	213,400	9,750	0	0.0457	29,807	0
合計	843,300	38,360	0	—	247,659	0
平均	70,280	3,197	0	0.0455	20,638	0
最大	213,400	9,750	0	0.0522	29,807	—
最小	0	0	0	0.0432	14,272	—

月	電 力 量							
	動 力			光 熱	電 力 収 支			
	合 計							
	買電 (kWh)	発電 (kWh)	使用量 (kWh)	買電 (kWh)	買電 (kWh)	発電 (kWh)	試運転内数 (kWh)	合計 (kWh)
4	25,820	0	25,820	1,560	27,380	0	0	27,380
5	15,992	0	15,992	1,840	17,832	0	0	17,832
6	15,162	0	15,162	1,820	16,982	0	0	16,982
7	19,856	0	19,856	1,540	21,396	0	0	21,396
8	25,451	0	25,451	1,910	27,361	0	0	27,361
9	18,298	0	18,298	1,660	19,958	0	0	19,958
10	26,216	0	26,216	1,590	27,806	0	0	27,806
11	27,897	0	27,897	1,500	29,397	0	0	29,397
12	23,513	0	23,513	2,430	25,943	0	0	25,943
1	23,873	0	23,873	3,210	27,083	0	0	27,083
2	24,384	0	24,384	2,390	26,774	0	0	26,774
3	39,557	0	39,557	1,900	41,457	0	0	41,457
合計	286,019	0	286,019	23,350	309,369	0	0	309,369
平均	23,835	0	23,835	1,946	25,781	0	0	25,781
最大	39,557	0	39,557	3,210	41,457	0	—	41,457
最小	15,162	0	15,162	1,500	16,982	0	—	16,982

(4) 重油使用量・その他

月	重 油								
	動 力								
	雨水ポンプ				自家発電機		使用量計 (L)		
	水量 (m^3)	燃料使用量 (L)		使用量 /水量	燃料使用量(L)				
実運転		試運転	実運転		試運転	実運転	試運転	合計	
4	0	0	100	—	0	3	0	103	103
5	0	0	100	—	0	4	0	104	104
6	8,700	310	100	0.0356	0	4	310	104	414
7	107,200	2,080	100	0.0194	0	2	2,080	102	2,182
8	87,600	1,800	100	0.0205	0	3	1,800	103	1,903
9	80,100	1,490	100	0.0186	0	3	1,490	103	1,593
10	16,100	550	110	0.0342	0	4	550	114	664
11	6,700	260	100	0.0388	0	3	260	103	363
12	0	0	100	—	0	3	0	103	103
1	0	0	100	—	0	3	0	103	103
2	0	0	110	—	0	4	0	114	114
3	0	0	100	—	0	3	0	103	103
合計	306,400	6,490	1,220	—	0	39	6,490	1,259	7,749
平均	25,500	540	102	0.0212	0	3	541	105	646
最大	107,200	2,080	110	0.0388	0	4	2,080	114	2,182
最小	0	0	100	0.0186	0	2	0	102	103

月	そ の 他	
	水 道 水 使 用 量 (m ³)	井 水 使 用 量 (m ³)
4	0	396
5	0	123
6	0	373
7	0	645
8	0	753
9	0	305
10	0	796
11	0	528
12	0	134
1	0	202
2	0	108
3	0	887
合計	0	5,250
平均	0	438
最大	0	887
最小	0	108

2 決 算 状 況 調

(1) 処理区分別決算内訳

(単位 円)

項 目	管 理 費	水 処 理 費	計	比 率
職 員 数	0 人	0 人	0 人	-
給 料	0	0	0	0.0%
手 当 等	0	0	0	0.0%
法 定 福 利 費	0	0	0	0.0%
人 件 費 計	0	0	0	0.0%
被 服 費	0	0	0	0.0%
備 消 耗 品 費	0	0	0	0.0%
光 熱 水 費	0	0	0	0.0%
印 刷 製 本 費	0	0	0	0.0%
通 信 運 搬 費	0	-	0	0.0%
賃 借 料	0	0	0	0.0%
手 数 料	0	-	0	0.0%
委 託 料	0	0	0	0.0%
修 繕 費	0	0	0	0.0%
動 力 費	0	12,939,503	12,939,503	100.0%
薬 品 費	0	0	0	0.0%
損 害 保 険 料	0	0	0	0.0%
負 担 金	0	0	0	0.0%
自 動 車 重 量 税	0	0	0	0.0%
経 費 計	0	12,939,503	12,939,503	100.0%
合 計	0	12,939,503	12,939,503	100.0%
比 率	0.0%	100.0%	100.0%	-

(2) 修繕工事内訳

直 接 修 繕

場所	区分	修 繕 件 名	金額 (千円)	工 期	修 繕 内 容
		なし			
計			0		

区 分 別 集 計	A	0 件	0 千円	建物
	B	0 件	0 千円	構築物
	C	0 件	0 千円	機械及び装置
	D	0 件	0 千円	車両運搬具
	E	0 件	0 千円	工具及び備品

請 負 修 繕

(市発注分)

場所	区分	修 繕 件 名	金額 (千円)	工 期	修 繕 内 容
		なし			
計			0		

区 分 別 集 計	A	0 件	0 千円	建物
	B	0 件	0 千円	構築物
	C	0 件	0 千円	機械及び装置
	D	0 件	0 千円	車両運搬具
	E	0 件	0 千円	工具及び備品

(公社発注分)

場所	区分	修 繕 件 名	金額 (千円)	工 期	修 繕 内 容
そ の 他	C	厚別川雨水ポンプ場 ポンプ井排水ポンプ補修	—	2024 4/19 ~ 2024 6/28	長期使用によるメカニカルシールの摩耗が著しく、浸水検知器が作動したためメカニカルシールの交換
	C	厚別川雨水ポンプ場 監視制御装置補修	—	2025 2/10 ~ 2025 3/21	監視制御装置CPUユニット故障のため交換

区 分 別 集 計	A	0 件	—	建物
	B	0 件	—	構築物
	C	2 件	—	機械及び装置
	D	0 件	—	車両運搬具
	E	0 件	—	工具及び備品

