


定山溪中継ポンプ場

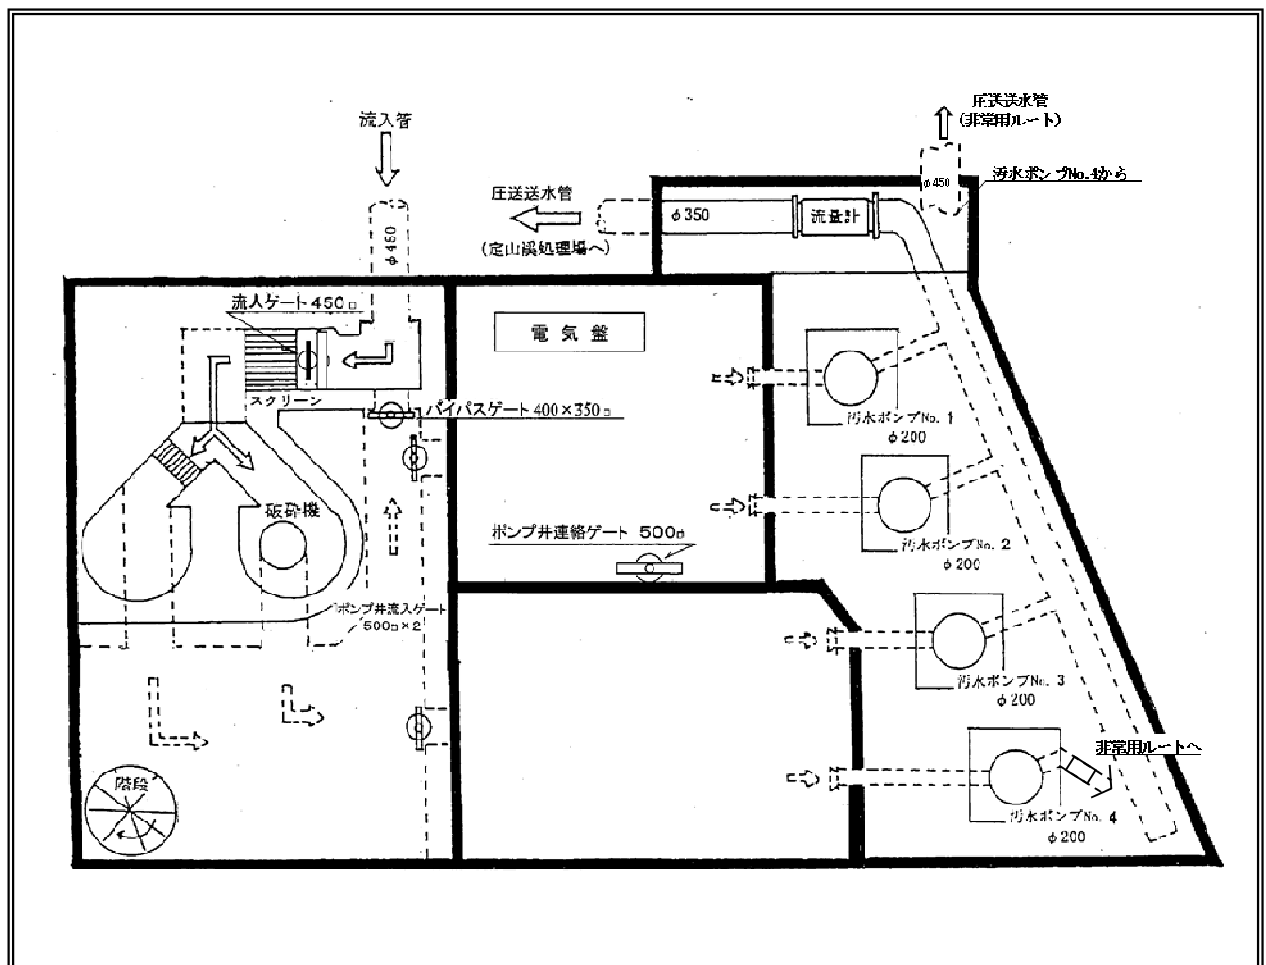

1 運 転 実 績 調

(1) 揚水量等

月	降水量 (mm/月)	総揚水量（送水量）		晴天時汚水量		電動機 による 揚水量 (m ³)	沈砂・スクリーнкаす量		
		(m ³)		(m ³)			沈砂 (m ³)	スクリーнкаす (m ³)	計 (m ³)
		月量	日量	月量	日量				
4	40.5	89,920	3,000	89,920	3,040	89,920	0	0	0
5	57.0	82,530	2,660	82,530	2,690	82,530	0	0	0
6	44.5	74,720	2,490	74,100	2,470	74,720	0	0	0
7	149.0	80,050	2,580	78,120	2,520	80,050	0	0	0
8	124.5	85,480	2,760	85,480	2,880	85,480	0	0	0
9	39.5	79,570	2,650	79,200	2,640	79,570	0	0	0
10	130.5	92,060	2,970	87,110	2,810	92,060	0	0	0
11	117.5	95,770	3,190	93,000	3,100	95,770	0	0	0
12	62.0	106,670	3,440	104,780	3,380	106,670	0	0	0
1	49.5	103,580	3,340	103,580	3,340	103,580	0	0	0
2	105.0	92,680	3,310	92,680	3,310	92,680	0	0	0
3	89.0	107,300	3,460	104,780	3,380	107,300	0	0	0
合計	1,008.5	1,090,330	—	1,075,280	—	1,090,330	0	0	0
平均	84.0	90,860	2,990	89,610	2,950	90,860	0	0	0
最大	7/28 58.0	—	3/26 4,100	—	12/18 3,630	3/26 4,100	—	—	—
最小	—	—	4/30 2,260	—	6/26 2,280	4/30 2,260	—	—	—

(2) 運転時間

月	汚水ポンプ運転時間 (h) 4.33m ³ /分×4台					自家用発電機 運転時間(h) 500 kVA		
	No. 1	No. 2	No. 3	No. 4	計	実運転	試運転	計
4	300.2	235.9	0.0	8.5	544.6	0.0	0.3	0.3
5	392.0	4.6	200.4	0.3	597.3	0.0	0.2	0.2
6	81.4	203.8	244.9	0.0	530.1	0.0	0.2	0.2
7	348.8	246.4	6.3	0.4	601.9	0.0	3.0	3.0
8	396.9	4.0	293.5	0.0	694.4	0.0	0.6	0.6
9	33.6	247.4	278.3	0.3	559.6	0.0	0.2	0.2
10	332.3	321.0	12.7	0.0	666.0	0.0	2.2	2.2
11	368.7	6.9	283.3	0.3	659.2	0.0	0.3	0.3
12	33.7	296.7	332.1	0.0	662.5	0.0	0.3	0.3
1	0.4	430.2	119.6	1.0	551.2	0.0	0.2	0.2
2	292.3	99.9	0.0	99.3	491.5	0.0	0.3	0.3
3	0.4	287.3	0.2	278.0	565.9	0.0	0.2	0.2
合計	2,580.7	2,384.1	1,771.3	388.1	7,124.2	0.0	8.0	8.0
平均	138.6	198.7	147.6	32.3	593.7	0.0	0.7	0.7
最大	369.7	430.2	332.1	278.0	694.4	0.0	3.0	3.0
最小	0.4	4.0	0.0	0.0	491.5	0.0	0.2	0.2

(3) 電力使用量等

月	電 力 量							
	動 力 費							
	汚 水 ポ ン プ			そ の 他		合 計		
	買 電 (kWh)	発 電 (kWh)	使用量 ／水量	買 電 (kWh)	発 電 (kWh)	買 電 (kWh)	発 電 (kWh)	使用量計 (kWh)
4	14,960	0	0.1664	4,761	0	19,721	0	19,721
5	15,500	0	0.1878	5,542	0	21,042	0	21,042
6	14,150	0	0.1894	6,080	0	20,230	0	20,230
7	15,122	108	0.1903	6,747	0	21,869	108	21,977
8	17,477	23	0.2047	6,937	0	24,414	23	24,437
9	14,900	0	0.1873	6,370	0	21,270	0	21,270
10	17,013	67	0.1855	6,375	0	23,388	67	23,455
11	17,490	0	0.1826	4,719	0	22,209	0	22,209
12	18,310	0	0.1717	4,587	0	22,897	0	22,897
1	16,180	0	0.1562	5,224	0	21,404	0	21,404
2	14,280	0	0.1541	4,691	0	18,971	0	18,971
3	16,160	0	0.1506	5,672	0	21,832	0	21,832
合計	191,542	198	—	67,705	0	259,247	198	259,445
平均	15,962	17	0.1759	5,642	0	21,604	17	21,620
最大	18,310	108	0.2047	6,937	0	24,414	108	24,437
最小	14,150	0	0.1506	4,587	0	18,971	0	18,971

月	電 力 量					灯 油 使 用 量			その他
	光熱水費	電 力 使 用 量 合 計				自 家 用 発 電 機			用 水 水 道
	買 電 (kWh)	買 電 (kWh)	発 電 (kWh)	使用量計 (kWh)	発電使用量の うち試運転分 (再掲) (kWh)	実運転 (L)	試運転 (L)	合 計 (L)	使用量 (m ³)
4	340	20,061	0	20,061	0	0	39	39	1
5	340	21,382	0	21,382	0	0	34	34	1
6	340	20,570	0	20,570	0	0	31	31	1
7	340	22,209	108	22,317	108	0	431	431	0
8	340	24,754	23	24,777	23	0	87	87	0
9	340	21,610	0	21,610	0	0	37	37	0
10	340	23,728	67	23,795	67	0	355	355	0
11	340	22,549	0	22,549	0	0	36	36	1
12	340	23,237	0	23,237	0	0	39	39	1
1	340	21,744	0	21,744	0	0	36	36	1
2	340	19,311	0	19,311	0	0	33	33	1
3	340	22,172	0	22,172	0	0	38	38	0
合計	4,080	263,327	198	263,525	198	0	1,196	1,196	7
平均	340	21,944	17	21,960	17	0	100	100	1
最大	340	24,754	108	24,777	108	0	431	431	1
最小	340	19,311	0	19,311	0	0	31	31	0

2 決 算 状 況 調

(1) 処理区分別決算内訳

(単位 円)

項 目	管 理 費	水 処 理 費	計	比 率
職 員 数	0 人	0 人	0 人	-
給 料	0	0	0	0.0%
手 当 等	0	0	0	0.0%
法 定 福 利 費	0	0	0	0.0%
人 件 費 計	0	0	0	0.0%
被 服 費	0	0	0	0.0%
備 消 耗 品 費	0	0	0	0.0%
光 熱 水 費	0	0	0	0.0%
印 刷 製 本 費	0	0	0	0.0%
通 信 運 搬 費	0	-	0	0.0%
賃 借 料	0	0	0	0.0%
手 数 料	0	-	0	0.0%
委 託 料	0	0	0	0.0%
修 繕 費	0	28,785,240	28,785,240	78.3%
動 力 費	0	8,000,200	8,000,200	21.7%
薬 品 費	0	0	0	0.0%
損 害 保 険 料	0	0	0	0.0%
負 担 金	0	0	0	0.0%
自 動 車 重 量 税	0	0	0	0.0%
経 費 計	0	36,785,440	36,785,440	100.0%
合 計	0	36,785,440	36,785,440	100.0%
比 率	0.0%	100.0%	100.0%	-

(2) 修繕工事内訳

直 接 修 繕

場所	区分	修 繕 件 名	金額 (千円)	工 期	修 繕 内 容
自家発	C	自家発室温度センサー交換	受託	9/26	不具合が発生し離線対応していたため交換
計					

区分別集計	A	0 件	0 千円	建物
	B	0 件	0 千円	構築物
	C	1 件	0 千円	機械及び装置
	D	0 件	0 千円	車両運搬具
	E	0 件	0 千円	工具及び備品

請 負 修 繕

(市発注分)

場所	区分	修 繕 件 名	金額 (千円)	工 期	修 繕 内 容
その他	C	新川水再生プラザ第1処理施設 コントロールセンタほか修繕工事	28,117	2024 11/13 ~ 2025 1/29	受変電設備修繕
計			28,117		

区分別集計	A	0 件	0 千円	建物
	B	0 件	0 千円	構築物
	C	1 件	28,117 千円	機械及び装置
	D	0 件	0 千円	車両運搬具
	E	0 件	0 千円	工具及び備品

(公社発注分)

場所	区分	修 繕 件 名	金額 (千円)	工 期	修 繕 内 容
		なし			

区分別集計	A	0 件	—	建物
	B	0 件	—	構築物
	C	0 件	—	機械及び装置
	D	0 件	—	車両運搬具
	E	0 件	—	工具及び備品
