


# 簾舞中継ポンプ場



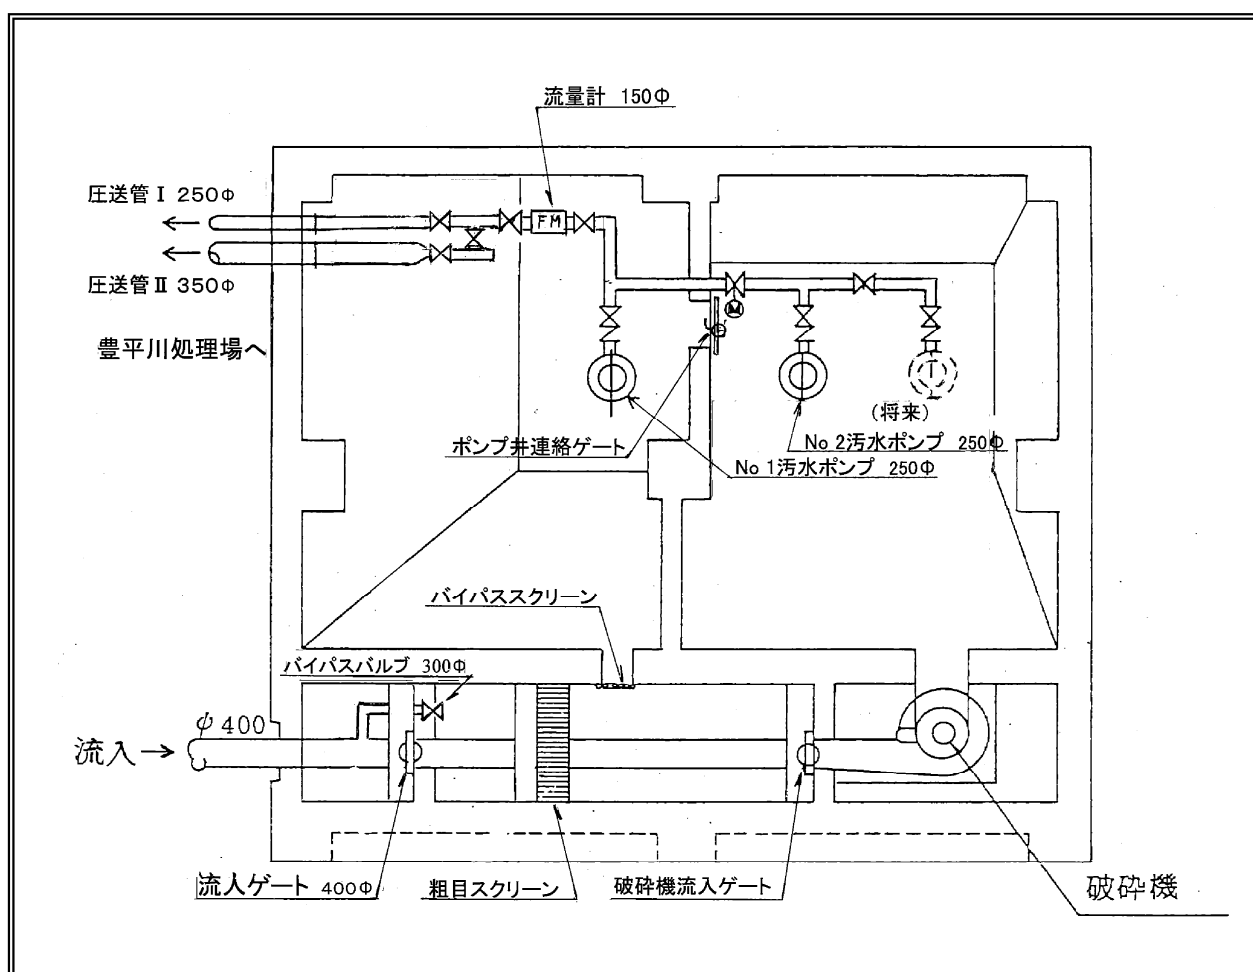

## 1 運 転 実 績 調

## (1) 揚水量等

| 月  | 降水量<br>(mm/月) | 総揚水量（送水量）        |               | 晴天時汚水量           |              | 電動機<br>による<br>揚水量<br>( $\text{m}^3$ ) | 沈砂・スクリーンかす量            |                             |                       |
|----|---------------|------------------|---------------|------------------|--------------|---------------------------------------|------------------------|-----------------------------|-----------------------|
|    |               | ( $\text{m}^3$ ) |               | ( $\text{m}^3$ ) |              |                                       | 沈砂<br>( $\text{m}^3$ ) | スクリーンかす<br>( $\text{m}^3$ ) | 計<br>( $\text{m}^3$ ) |
|    |               | 月量               | 日量            | 月量               | 日量           |                                       |                        |                             |                       |
| 4  | 42.0          | 43,850           | 1,460         | 41,700           | 1,390        | 43,850                                | 0                      | 0                           | 0                     |
| 5  | 38.0          | 26,070           | 840           | 25,420           | 820          | 26,070                                | 0                      | 0                           | 0                     |
| 6  | 44.5          | 22,870           | 760           | 22,200           | 740          | 22,870                                | 0                      | 0                           | 0                     |
| 7  | 110.5         | 24,650           | 800           | 20,150           | 650          | 24,650                                | 0                      | 0                           | 0                     |
| 8  | 127.5         | 28,910           | 930           | 24,490           | 790          | 28,910                                | 0                      | 0                           | 0                     |
| 9  | 55.0          | 23,730           | 790           | 21,300           | 710          | 23,730                                | 0                      | 0                           | 0                     |
| 10 | 107.5         | 26,980           | 870           | 22,630           | 730          | 26,980                                | 0                      | 0                           | 0                     |
| 11 | 117.0         | 28,250           | 940           | 27,300           | 910          | 28,250                                | 0                      | 0                           | 0                     |
| 12 | 62.0          | 25,010           | 810           | 22,320           | 720          | 25,010                                | 0                      | 0                           | 0                     |
| 1  | 49.5          | 20,570           | 660           | 20,570           | 660          | 20,570                                | 0                      | 0                           | 0                     |
| 2  | 105.0         | 18,180           | 650           | 18,180           | 650          | 18,180                                | 0                      | 0                           | 0                     |
| 3  | 89.0          | 37,920           | 1,220         | 22,320           | 720          | 37,920                                | 0                      | 0                           | 0                     |
| 合計 | 947.5         | 326,990          | —             | 288,580          | —            | 326,990                               | 0                      | 0                           | 0                     |
| 平均 | 79.0          | 27,250           | 900           | 24,050           | 790          | 27,250                                | 0                      | 0                           | 0                     |
| 最大 | 7/28<br>50.0  | —                | 7/29<br>2,340 | —                | 4/8<br>2,140 | 7/29<br>2,340                         | —                      | —                           | —                     |
| 最小 | —             | —                | 2/13<br>580   | —                | 7/3<br>590   | 2/13<br>580                           | —                      | —                           | —                     |

## (2) 運転時間

| 月  | 汚水ポンプ運転時間(h)<br>4.0 $\text{m}^3$ /分×2台 |       |       | 自家用発電機<br>運転時間(h)<br>400 kVA |     |     |
|----|----------------------------------------|-------|-------|------------------------------|-----|-----|
|    | No. 1                                  | No. 2 | 計     | 実運転                          | 試運転 | 計   |
| 4  | 1.6                                    | 117.6 | 119.2 | 0.0                          | 0.1 | 0.1 |
| 5  | 53.9                                   | 1.1   | 55.0  | 0.0                          | 0.1 | 0.1 |
| 6  | 3.9                                    | 45.9  | 49.8  | 0.0                          | 0.1 | 0.1 |
| 7  | 49.5                                   | 0.6   | 50.1  | 0.0                          | 0.1 | 0.1 |
| 8  | 0.6                                    | 62.7  | 63.3  | 0.0                          | 0.6 | 0.6 |
| 9  | 45.8                                   | 3.1   | 48.9  | 0.0                          | 0.1 | 0.1 |
| 10 | 0.7                                    | 58.1  | 58.8  | 0.0                          | 0.1 | 0.1 |
| 11 | 56.3                                   | 0.6   | 56.9  | 0.0                          | 0.1 | 0.1 |
| 12 | 3.0                                    | 52.2  | 55.2  | 0.0                          | 0.1 | 0.1 |
| 1  | 0.0                                    | 44.3  | 44.3  | 0.0                          | 0.1 | 0.1 |
| 2  | 0.0                                    | 38.4  | 38.4  | 0.0                          | 0.1 | 0.1 |
| 3  | 55.6                                   | 23.4  | 79.0  | 0.0                          | 0.1 | 0.1 |
| 合計 | 270.9                                  | 448.0 | 718.9 | 0.0                          | 1.7 | 1.7 |
| 平均 | 22.6                                   | 37.3  | 59.9  | 0.0                          | 0.1 | 0.1 |
| 最大 | 56.3                                   | 117.6 | 119.2 | 0.0                          | 0.6 | 0.6 |
| 最小 | 0.0                                    | 0.6   | 38.4  | 0.0                          | 0.1 | 0.1 |

## (3) 電力使用量等

| 月  | 電 力 量        |              |            |              |              |              |              |               |
|----|--------------|--------------|------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|
|    | 動 力 費        |              |            |              |              |              |              |               |
|    | 汚水ポンプ        |              |            | その他          |              | 合計           |              |               |
|    | 買 電<br>(kWh) | 発 電<br>(kWh) | 使用量<br>／水量 | 買 電<br>(kWh) | 発 電<br>(kWh) | 買 電<br>(kWh) | 発 電<br>(kWh) | 使用量計<br>(kWh) |
| 4  | 8,046        | 0            | 0.1835     | 1,879        | 0            | 9,925        | 0            | 9,925         |
| 5  | 3,712        | 0            | 0.1424     | 2,507        | 0            | 6,219        | 0            | 6,219         |
| 6  | 3,361        | 0            | 0.1470     | 2,336        | 0            | 5,697        | 0            | 5,697         |
| 7  | 3,382        | 0            | 0.1372     | 2,780        | 0            | 6,162        | 0            | 6,162         |
| 8  | 4,153        | 120          | 0.1478     | 3,080        | 0            | 7,233        | 120          | 7,353         |
| 9  | 3,301        | 0            | 0.1391     | 2,454        | 0            | 5,755        | 0            | 5,755         |
| 10 | 3,969        | 0            | 0.1471     | 2,664        | 0            | 6,633        | 0            | 6,633         |
| 11 | 3,841        | 0            | 0.1360     | 2,679        | 0            | 6,520        | 0            | 6,520         |
| 12 | 3,727        | 0            | 0.1490     | 2,570        | 0            | 6,297        | 0            | 6,297         |
| 1  | 2,990        | 0            | 0.1454     | 2,273        | 0            | 5,263        | 0            | 5,263         |
| 2  | 2,592        | 0            | 0.1426     | 2,069        | 0            | 4,661        | 0            | 4,661         |
| 3  | 5,333        | 0            | 0.1406     | 2,801        | 0            | 8,134        | 0            | 8,134         |
| 合計 | 48,407       | 120          | —          | 30,092       | 0            | 78,499       | 120          | 78,619        |
| 平均 | 4,034        | 10           | 0.1484     | 2,508        | 0            | 6,542        | 10           | 6,552         |
| 最大 | 8,046        | 120          | 0.1835     | 3,080        | 0            | 9,925        | 120          | 9,925         |
| 最小 | 2,592        | 0            | 0.1360     | 1,879        | 0            | 4,661        | 0            | 4,661         |

| 月  | 電 力 量        |              |              |               |                               | 重油使用量      |            |           | その他                      |
|----|--------------|--------------|--------------|---------------|-------------------------------|------------|------------|-----------|--------------------------|
|    | 光熱水費<br>水処理  | 使用量合計        |              |               |                               | 自家発電電機     |            |           | 用 水<br>水 道               |
|    | 買 電<br>(kWh) | 買 電<br>(kWh) | 発 電<br>(kWh) | 使用量計<br>(kWh) | 発電使用量の<br>うち試運転分<br>(再掲)(kWh) | 実運転<br>(L) | 試運転<br>(L) | 合計<br>(L) | 使用量<br>(m <sup>3</sup> ) |
| 4  | 313          | 10,238       | 0            | 10,238        | 0                             | 0          | 7          | 7         | 4                        |
| 5  | 244          | 6,463        | 0            | 6,463         | 0                             | 0          | 7          | 7         | 4                        |
| 6  | 191          | 5,888        | 0            | 5,888         | 0                             | 0          | 11         | 11        | 3                        |
| 7  | 176          | 6,338        | 0            | 6,338         | 0                             | 0          | 9          | 9         | 4                        |
| 8  | 185          | 7,418        | 120          | 7,538         | 120                           | 0          | 45         | 45        | 4                        |
| 9  | 186          | 5,941        | 0            | 5,941         | 0                             | 0          | 10         | 10        | 2                        |
| 10 | 238          | 6,871        | 0            | 6,871         | 0                             | 0          | 7          | 7         | 2                        |
| 11 | 241          | 6,761        | 0            | 6,761         | 0                             | 0          | 8          | 8         | 2                        |
| 12 | 293          | 6,590        | 0            | 6,590         | 0                             | 0          | 10         | 10        | 3                        |
| 1  | 289          | 5,552        | 0            | 5,552         | 0                             | 0          | 11         | 11        | 2                        |
| 2  | 224          | 4,885        | 0            | 4,885         | 0                             | 0          | 4          | 4         | 2                        |
| 3  | 447          | 8,581        | 0            | 8,581         | 0                             | 0          | 8          | 8         | 3                        |
| 合計 | 3,027        | 81,526       | 120          | 81,646        | 120                           | 0          | 137        | 137       | 35                       |
| 平均 | 252          | 6,794        | 10           | 6,804         | 10                            | 0          | 11         | 11        | 3                        |
| 最大 | 447          | 10,238       | 120          | 10,238        | 120                           | 0          | 45         | 45        | 4                        |
| 最小 | 176          | 4,885        | 0            | 4,885         | 0                             | 0          | 4          | 4         | 2                        |

## 2 決 算 状 況 調

## (1) 処理区分別決算内訳

(単位 円)

| 項 目         | 管 理 費 | 水 処 理 費    | 計          | 比 率    |
|-------------|-------|------------|------------|--------|
| 職 員 数       | 0 人   | 0 人        | 0 人        | -      |
| 給 料         | 0     | 0          | 0          | 0.0%   |
| 手 当 等       | 0     | 0          | 0          | 0.0%   |
| 法 定 福 利 費   | 0     | 0          | 0          | 0.0%   |
| 人 件 費 計     | 0     | 0          | 0          | 0.0%   |
| 被 服 費       | 0     | 0          | 0          | 0.0%   |
| 備 消 耗 品 費   | 0     | 0          | 0          | 0.0%   |
| 光 熱 水 費     | 0     | 0          | 0          | 0.0%   |
| 印 刷 製 本 費   | 0     | 0          | 0          | 0.0%   |
| 通 信 運 搬 費   | 0     | -          | 0          | 0.0%   |
| 賃 借 料       | 0     | 0          | 0          | 0.0%   |
| 手 数 料       | 0     | -          | 0          | 0.0%   |
| 委 託 料       | 0     | 0          | 0          | 0.0%   |
| 修 繕 費       | 0     | 14,685,000 | 14,685,000 | 82.2%  |
| 動 力 費       | 0     | 3,170,924  | 3,170,924  | 17.8%  |
| 薬 品 費       | 0     | 0          | 0          | 0.0%   |
| 損 害 保 険 料   | 0     | 0          | 0          | 0.0%   |
| 負 担 金       | 0     | 0          | 0          | 0.0%   |
| 自 動 車 重 量 税 | 0     | 0          | 0          | 0.0%   |
| 経 費 計       | 0     | 17,855,924 | 17,855,924 | 100.0% |
| 合 計         | 0     | 17,855,924 | 17,855,924 | 100.0% |
| 比 率         | 0.0%  | 100.0%     | 100.0%     | -      |

## (2) 修繕工事内訳

## 直接修繕

| 場所 | 区分 | 修繕件名 | 金額<br>(千円) | 工期 | 修繕内容 |
|----|----|------|------------|----|------|
|    |    | なし   |            |    |      |
| 計  |    |      | 0          |    |      |

|       |   |     |      |        |
|-------|---|-----|------|--------|
| 区分別集計 | A | 0 件 | 0 千円 | 建物     |
|       | B | 0 件 | 0 千円 | 構築物    |
|       | C | 0 件 | 0 千円 | 機械及び装置 |
|       | D | 0 件 | 0 千円 | 車両運搬具  |
|       | E | 0 件 | 0 千円 | 工具及び備品 |

## 請負修繕

(市発注分)

| 場所  | 区分 | 修繕件名                      | 金額<br>(千円) | 工期                         | 修繕内容          |
|-----|----|---------------------------|------------|----------------------------|---------------|
| ポンプ | C  | 簾舞中継ポンプ場<br>No.1汚水ポンプ修繕工事 | 14,685     | 2024<br>9/9 ~ 2025<br>3/14 | No.1汚水ポンプ修繕工事 |
| 計   |    |                           | 14,685     |                            |               |

|       |   |     |           |        |
|-------|---|-----|-----------|--------|
| 区分別集計 | A | 0 件 | 0 千円      | 建物     |
|       | B | 0 件 | 0 千円      | 構築物    |
|       | C | 1 件 | 14,685 千円 | 機械及び装置 |
|       | D | 0 件 | 0 千円      | 車両運搬具  |
|       | E | 0 件 | 0 千円      | 工具及び備品 |

(公社発注分)

| 場所  | 区分 | 修繕件名                  | 金額<br>(千円) | 工期                           | 修繕内容                        |
|-----|----|-----------------------|------------|------------------------------|-----------------------------|
| その他 | C  | 藤野中継ポンプ場<br>接地端子盤ほか補修 | —          | 2024<br>10/29 ~ 2025<br>1/20 | 構内PASの電柱に設置している<br>碍子の交換を行う |
|     | B  | 簾舞中継ポンプ場<br>覆蓋補修      | —          | 2024<br>11/5 ~ 2025<br>1/31  | 覆蓋の交換を行う                    |

|       |   |     |   |        |
|-------|---|-----|---|--------|
| 区分別集計 | A | 0 件 | — | 建物     |
|       | B | 1 件 | — | 構築物    |
|       | C | 1 件 | — | 機械及び装置 |
|       | D | 0 件 | — | 車両運搬具  |
|       | E | 0 件 | — | 工具及び備品 |
