


厚別川雨水ポンプ場

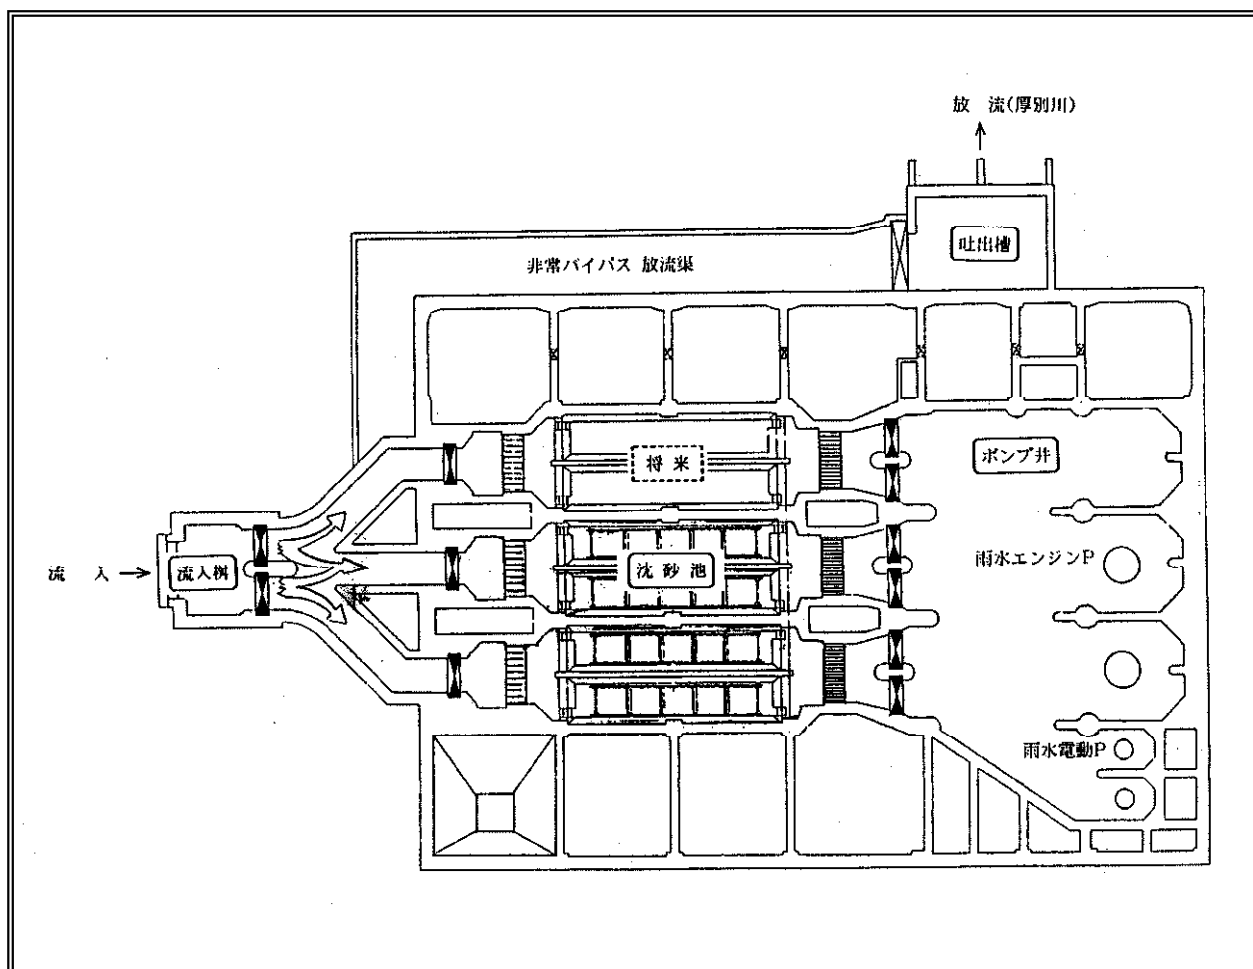

1 運 転 実 績 調

(1) 揚 水 量 等

月	降水量 (mm/月)	総 揚 水 量 (m ³)		雨 水 放 流 量 (m ³)							
		月 量	日 量	雨 水 ポ ン プ			ポンプ井排水ポンプ			計	
				日数	月 量	日 量	日数	月 量	日 量	月 量	日 量
4	33.0	254,050	8,470	18	163,800	5,460	0	0	0	163,800	5,460
5	33.0	145,260	4,690	9	70,900	2,290	0	0	0	70,900	2,290
6	18.5	67,840	2,260	4	17,400	580	0	0	0	17,400	580
7	57.5	136,740	4,410	7	91,000	2,940	0	0	0	91,000	2,940
8	83.0	170,120	5,490	11	112,500	3,630	0	0	0	112,500	3,630
9	125.0	312,590	10,420	11	253,400	8,450	0	0	0	253,400	8,450
10	31.5	82,020	2,650	7	27,000	870	0	0	0	27,000	870
11	103.5	291,720	9,720	15	213,800	7,130	0	0	0	213,800	7,130
12	105.0	151,890	4,900	10	71,800	2,320	0	0	0	71,800	2,320
1	183.5	86,710	2,800	3	21,300	690	0	0	0	21,300	690
2	93.0	206,070	7,360	10	143,800	5,140	0	0	0	143,800	5,140
3	54.5	264,270	8,520	31	174,100	5,620	0	0	0	174,100	5,620
合計	921.0	2,169,280	—	136	1,360,800	—	0	0	—	1,360,800	—
平均	76.8	180,770	5,940	11	113,400	3,730	0	0	0	113,400	3,730
最大	11/1 53.0	—	11/1 118,020	31	—	11/1 117,300	—	—	—	—	—
最小	—	—	7/9 460	3	—	—	—	—	—	—	—

月	送 水 量 (m ³)		動 力 別 雨 水 放 流 量 (m ³)			沈砂・スクリーンかす量(m ³)		
	ポンプ井排水ポンプ		電動機による 放 流 量	エンジンによる 放 流 量	計	沈砂	スクリー ンかす	計
	月 量	日 量						
4	90,250	3,010	140,800	23,000	163,800	0.0	0.0	0.0
5	74,360	2,400	59,100	11,800	70,900	0.0	0.0	0.0
6	50,440	1,680	17,400	0	17,400	0.0	0.0	0.0
7	45,740	1,470	54,300	36,700	91,000	0.0	0.0	0.0
8	57,620	1,860	56,800	55,700	112,500	6.6	0.0	6.6
9	59,190	1,970	74,300	179,100	253,400	7.5	0.0	7.5
10	55,020	1,780	27,000	0	27,000	7.5	0.0	7.5
11	77,920	2,590	141,200	72,600	213,800	0.0	0.0	0.0
12	80,090	2,580	71,800	0	71,800	0.0	0.0	0.0
1	65,410	2,110	21,300	0	21,300	0.0	0.0	0.0
2	62,270	2,220	143,800	0	143,800	6.6	0.0	6.6
3	90,170	2,900	174,100	0	174,100	0.0	0.0	0.0
合計	808,480	—	981,900	378,900	1,360,800	28.2	0.0	28.2
平均	67,370	2,210	81,830	31,580	113,400	2.4	0.0	2.4
最大	—	4/2 3,460	—	—	—	—	—	—
最小	—	7/9 460	—	—	—	—	—	—

※ 雑排水量は、総揚水量、動力別揚水量に含まない。

(2) 運 転 時 間

月	ポンプ井排水ポンプ運転時間(h)			雨 水 電 動 ポ ン プ 運 転 時 間 (h)		
	送 水	放 流	計	No. 1	No. 2	計
				実運転+試運転	実運転+試運転	実運転+試運転
4	626.9	0.0	626.9	21.5	0.0	21.5
5	516.6	0.0	516.6	9.0	0.0	9.0
6	350.5	0.0	350.5	2.6	0.0	2.6
7	318.0	0.0	318.0	8.2	0.0	8.2
8	400.3	0.0	400.3	8.3	0.0	8.3
9	411.0	0.0	411.0	11.4	0.0	11.4
10	382.1	0.0	382.1	4.3	0.0	4.3
11	540.9	0.0	540.9	21.5	0.0	21.5
12	556.1	0.0	556.1	11.1	0.0	11.1
1	454.2	0.0	454.2	3.4	0.0	3.4
2	432.1	0.0	432.1	22.0	0.0	22.0
3	626.4	0.0	626.4	27.2	0.0	27.2
合計	5,615.1	0.0	5,615.1	150.5	0.0	150.5
平均	467.9	0.0	467.9	12.5	0.0	12.5
最大	626.9	—	626.9	27.2	0.0	27.2
最小	318.0	—	318.0	2.6	0.0	2.6

月	雨水エンジンポンプ運転時間 (h)						自家発電機 運転時間 625 kVA(h)	
	No. 1		No. 2		計			
	実運転	試運転	実運転	試運転	実運転	試運転	実運転	試運転
4	0.0	0.3	2.1	0.2	2.1	0.5	0.0	0.1
5	2.3	0.3	0.0	0.3	2.3	0.6	0.0	0.1
6	0.0	0.2	0.0	0.2	0.0	0.4	0.0	0.1
7	4.5	0.2	0.0	0.3	4.5	0.5	0.0	0.1
8	0.5	0.2	4.5	4.7	5.0	4.9	0.0	0.1
9	11.6	0.2	0.8	0.2	12.4	0.4	0.0	0.1
10	0.0	0.2	0.0	0.2	0.0	0.4	0.0	0.2
11	0.0	0.2	7.2	0.2	7.2	0.4	0.0	0.1
12	0.0	0.2	0.0	0.2	0.0	0.4	0.0	0.1
1	0.0	0.2	0.0	0.2	0.0	0.4	0.0	0.1
2	0.0	0.2	0.0	0.2	0.0	0.4	0.0	0.2
3	0.0	0.2	0.0	0.2	0.0	0.4	0.0	0.1
合計	18.9	2.6	14.6	7.1	33.5	9.7	0.0	1.4
平均	1.6	0.2	1.2	0.6	2.8	0.8	0.0	0.1
最大	11.6	0.3	7.2	4.7	12.4	4.9	0.0	0.2
最小	0.0	0.2	0.0	0.2	0.0	0.4	0.0	0.1

(3) 電力使用量

月	電 力 量					
	動 力					
	雨 水 揚 水 雨水電動ポンプ				その他	
	揚水量 (m ³)	買 電 (kWh)	発電量 (kWh)	使用量 /揚水量	買 電 (kWh)	発電量 (kWh)
4	140,800	6,220	0	0.0442	24,611	0
5	59,100	2,680	0	0.0453	18,099	0
6	17,400	760	0	0.0437	16,072	0
7	54,300	2,350	0	0.0433	18,206	0
8	56,800	2,460	0	0.0433	19,974	0
9	74,300	3,410	0	0.0459	18,760	0
10	27,000	1,230	0	0.0456	15,601	0
11	141,200	6,230	0	0.0441	22,496	0
12	71,800	3,210	0	0.0447	26,590	0
1	21,300	960	0	0.0451	26,111	0
2	143,800	6,430	0	0.0447	25,391	0
3	174,100	7,940	0	0.0456	29,237	0
合計	981,900	43,880	0	—	261,148	0
平均	81,830	3,657	0	0.0447	21,762	0
最大	174,100	7,940	0	0.0459	29,237	—
最小	17,400	760	0	0.0433	15,601	—

月	電 力 量								
	動 力			光 熱	電 力 収 支				
	合 計				買電 (kWh)	買電 (kWh)	発電 (kWh)	試運転内数 (kWh)	合計 (kWh)
	買電 (kWh)	発電 (kWh)	使用量 (kWh)						
4	30,831	0	30,831	1,770	32,601	0	0	32,601	
5	20,779	0	20,779	1,620	22,399	0	0	22,399	
6	16,832	0	16,832	1,700	18,532	0	0	18,532	
7	20,556	0	20,556	2,230	22,786	0	0	22,786	
8	22,434	0	22,434	1,700	24,134	0	0	24,134	
9	22,170	0	22,170	1,510	23,680	0	0	23,680	
10	16,831	0	16,831	1,590	18,421	0	0	18,421	
11	28,726	0	28,726	1,530	30,256	0	0	30,256	
12	29,800	0	29,800	2,490	32,290	0	0	32,290	
1	27,071	0	27,071	2,140	29,211	0	0	29,211	
2	31,821	0	31,821	2,060	33,881	0	0	33,881	
3	37,177	0	37,177	1,480	38,657	0	0	38,657	
合計	305,028	0	305,028	21,820	326,848	0	0	326,848	
平均	25,419	0	25,419	1,818	27,237	0	0	27,237	
最大	37,177	0	37,177	2,490	38,657	0	—	38,657	
最小	16,831	0	16,831	1,480	18,421	0	—	18,421	

(4) 重油使用量・その他

月	重 油								
	動 力								
	雨水ポンプ				自家発電機		使用量計 (L)		
	水量 (m ³)	燃料使用量 (L)		使用量 /水量	燃料使用量(L)				
実運転		試運転	実運転		試運転	実運転	試運転	合計	
4	23,000	480	100	0.0209	0	3	480	103	583
5	11,800	460	100	0.0390	0	3	460	103	563
6	0	0	100	—	0	3	0	103	103
7	36,700	960	100	0.0262	0	3	960	103	1,063
8	55,700	1,130	90	0.0203	0	3	1,130	93	1,223
9	179,100	2,950	100	0.0165	0	3	2,950	103	3,053
10	0	0	100	—	0	6	0	106	106
11	72,600	1,510	100	0.0208	0	3	1,510	103	1,613
12	0	0	90	—	0	3	0	93	93
1	0	0	110	—	0	3	0	113	113
2	0	0	110	—	0	6	0	116	116
3	0	0	100	—	0	3	0	103	103
合計	378,900	7,490	1,200	—	0	42	7,490	1,242	8,732
平均	31,600	620	100	0.0198	0	4	624	104	728
最大	179,100	2,950	110	0.0390	0	6	2,950	116	3,053
最小	0	0	90	0.0165	0	3	0	93	93

月	そ の 他	
	水 道 水 使 用 量 (m^3)	井 水 使 用 量 (m^3)
4	0	705
5	0	325
6	0	135
7	0	380
8	0	280
9	0	538
10	0	139
11	0	681
12	0	247
1	0	351
2	0	767
3	0	631
合計	0	5,179
平均	0	432
最大	0	767
最小	0	135

2 決 算 状 況 調

(1) 処理区分別決算内訳

(単位 円)

項 目	管 理 費	水 処 理 費	計	比 率
職 員 数	0 人	0 人	0 人	-
給 料	0	0	0	0.0%
手 当 等	0	0	0	0.0%
法 定 福 利 費	0	0	0	0.0%
人 件 費 計	0	0	0	0.0%
被 服 費	0	0	0	0.0%
備 消 耗 品 費	0	0	0	0.0%
光 熱 水 費	0	0	0	0.0%
印 刷 製 本 費	0	0	0	0.0%
通 信 運 搬 費	0	-	0	0.0%
賃 借 料	0	0	0	0.0%
手 数 料	0	-	0	0.0%
委 託 料	0	0	0	0.0%
修 繕 費	0	0	0	0.0%
動 力 費	0	11,613,861	11,613,861	100.0%
薬 品 費	0	0	0	0.0%
損 害 保 険 料	0	0	0	0.0%
負 担 金	0	0	0	0.0%
自 動 車 重 量 税	0	0	0	0.0%
経 費 計	0	11,613,861	11,613,861	100.0%
合 計	0	11,613,861	11,613,861	100.0%
比 率	0.0%	100.0%	100.0%	-

(2) 修繕工事内訳

直 接 修 繕

場所	区分	修 繕 件 名	金額 (千円)	工 期	修 繕 内 容
沈砂池	C	沈砂池排気ファンVベルト交換	受託	8/4	Vベルトに著しい摩耗が見られたため新品と交換した。
計			0		

区 分 別 集 計	A	0 件	0 千円	建物
	B	0 件	0 千円	構築物
	C	1 件	0 千円	機械及び装置
	D	0 件	0 千円	車両運搬具
	E	0 件	0 千円	工具及び備品

請 負 修 繕

(市発注分)

場所	区分	修 繕 件 名	金額 (千円)	工 期	修 繕 内 容
		なし			
計			0		

区 分 別 集 計	A	0 件	0 千円	建物	
	B	0 件	0 千円	構築物	
	C	0 件	0 千円	機械及び装置	
	D	0 件	0 千円	車両運搬具	
	E	0 件	0 千円	工具及び備品	

(公社発注分)

場所	区分	修 繕 件 名	金額 (千円)	工 期	修 繕 内 容
その他	C	厚別川雨水ポンプ場 監視制御装置補修	—	2026 1/9 ~ 2026 3/19	中央監視ミラーディスク故障のため交換

区 分 別 集 計	A	0 件	—	建物	
	B	0 件	—	構築物	
	C	1 件	—	機械及び装置	
	D	0 件	—	車両運搬具	
	E	0 件	—	工具及び備品	

