


定山溪中継ポンプ場

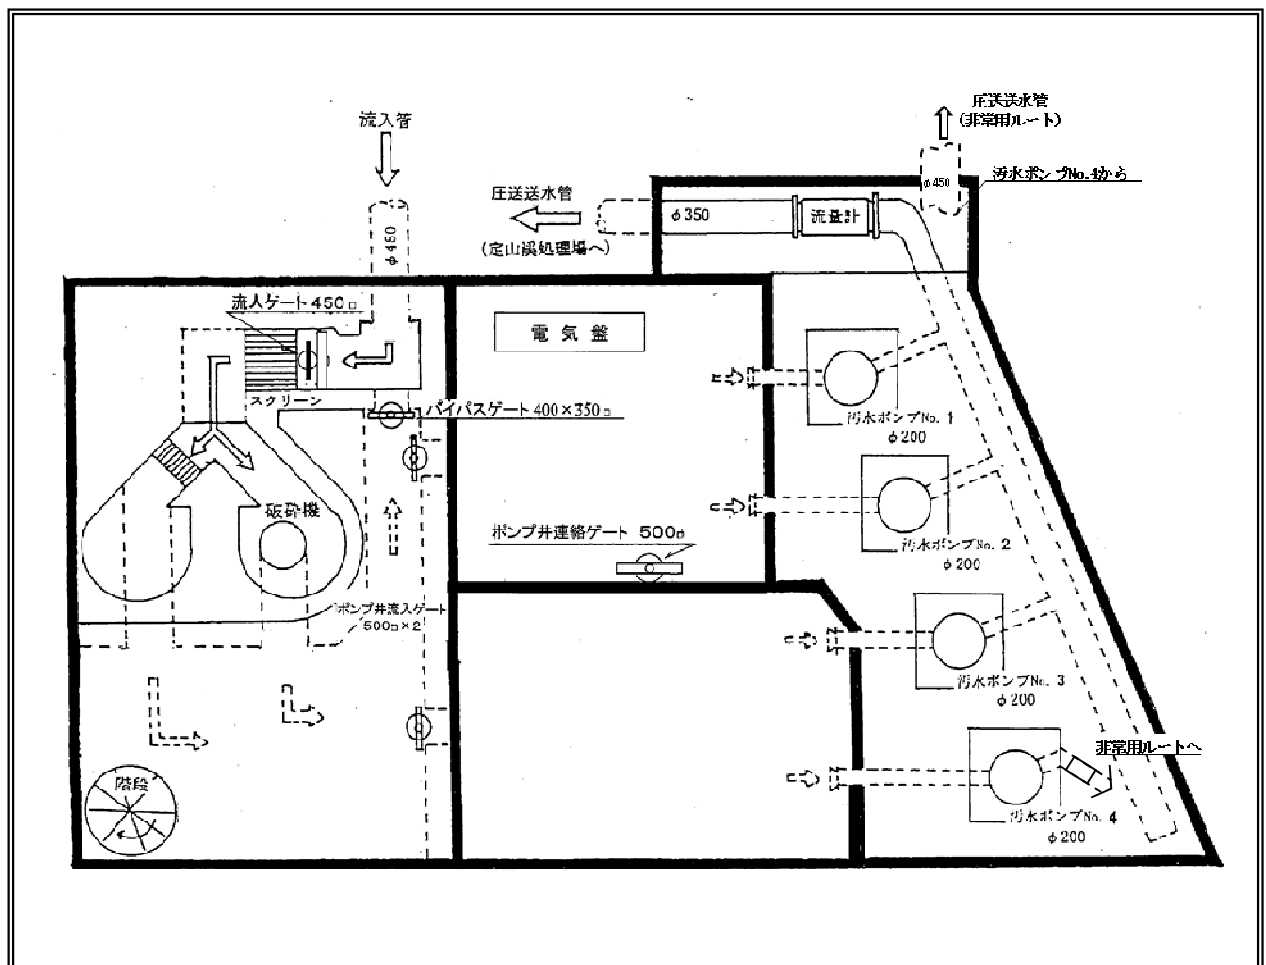

1 運 転 実 績 調

(1) 揚水量等

月	降水量 (mm/月)	総揚水量 (送水量) (m ³)		晴天時汚水量 (m ³)		電動機 による 揚水量 (m ³)	沈砂・スクリーンかす量		
		月量	日量	月量	日量		沈砂 (m ³)	スクリーンかす (m ³)	計 (m ³)
4	79.5	102,210	3,410	96,300	3,210	102,210	0	0	0
5	52.5	97,460	3,140	94,860	3,060	97,460	0	0	0
6	48.0	89,720	2,990	88,800	2,960	89,720	0	0	0
7	86.0	92,470	2,980	91,140	2,940	92,470	0	0	0
8	95.5	91,660	2,960	91,660	2,960	91,660	0	0	0
9	135.0	88,640	2,950	83,700	2,790	88,640	0	0	0
10	53.5	99,920	3,220	95,790	3,090	99,920	0	0	0
11	154.5	108,720	3,620	108,720	3,620	108,720	0	0	0
12	115.0	112,160	3,620	108,500	3,500	112,160	0	0	0
1	56.5	105,780	3,410	104,780	3,380	105,780	0	0	0
2	71.5	89,810	3,210	87,920	3,140	89,810	0	0	0
3	49.5	104,190	3,360	97,340	3,140	104,190	0	0	0
合計	997.0	1,182,740	—	1,149,510	—	1,182,740	0	0	0
平均	83.1	98,560	3,240	95,790	3,150	98,560	0	0	0
最大	11/1 108.0	— 11/1 5,220	— 11/1 5,220	— 11/1 3,660	— 11/1 3,660	11/1 5,220	—	—	—
最小	—	— 8/30 2,630	— 8/30 2,630	— 9/5 2,680	— 9/5 2,680	8/30 2,630	—	—	—

(2) 運転時間

月	汚水ポンプ運転時間 (h) 4.33m ³ /分×4台					自家用発電機 運転時間 (h) 500 kVA		
	No. 1	No. 2	No. 3	No. 4	計	実運転	試運転	計
4	0.0	244.5	0.0	299.2	543.7	0.0	0.2	0.2
5	390.9	5.6	236.2	0.3	633.0	0.0	0.2	0.2
6	34.2	263.1	300.5	0.0	597.8	0.0	0.2	0.2
7	334.7	326.3	6.1	0.1	667.2	0.0	0.3	0.3
8	144.0	5.8	0.0	433.1	582.9	0.4	0.0	0.4
9	0.5	0.8	378.4	176.8	556.5	0.0	0.2	0.2
10	0.0	287.3	357.9	0.0	645.2	0.0	0.7	0.7
11	312.8	321.7	77.6	0.4	712.5	1.9	0.3	2.2
12	335.5	9.1	370.3	0.0	714.9	0.0	1.2	1.2
1	351.4	0.6	98.1	204.8	654.9	0.0	0.2	0.2
2	28.7	191.7	0.0	275.0	495.4	0.0	0.2	0.2
3	0.1	23.1	268.0	274.4	565.6	0.0	0.3	0.3
合計	1,932.8	1,679.6	2,093.1	1,664.1	7,369.6	2.3	4.0	6.3
平均	161.1	140.0	174.4	138.7	614.1	0.2	0.3	0.5
最大	390.9	326.3	378.4	433.1	714.9	1.9	1.2	2.2
最小	0.0	0.6	0.0	0.0	495.4	0.0	0.0	0.2

(2) 運転時間

月	汚水ポンプ運転時間 (h) 4.33m ³ /分×4台					自家用発電機 運転時間(h) 500 kVA		
	No. 1	No. 2	No. 3	No. 4	計	実運転	試運転	計
4	0.0	244.5	0.0	299.2	543.7	0.0	0.2	0.2
5	390.9	5.6	236.2	0.3	633.0	0.0	0.2	0.2
6	34.2	263.1	300.5	0.0	597.8	0.0	0.2	0.2
7	334.7	326.3	6.1	0.1	667.2	0.0	0.3	0.3
8	144.0	5.8	0.0	433.1	582.9	0.4	0.0	0.4
9	0.5	0.8	378.4	176.8	556.5	0.0	0.2	0.2
10	0.0	287.3	357.9	0.0	645.2	0.0	0.7	0.7
11	312.8	321.7	77.6	0.4	712.5	1.9	0.3	2.2
12	335.5	9.1	370.3	0.0	714.9	0.0	1.2	1.2
1	351.4	0.6	98.1	204.8	654.9	0.0	0.2	0.2
2	28.7	191.7	0.0	275.0	495.4	0.0	0.2	0.2
3	0.1	23.1	268.0	274.4	565.6	0.0	0.3	0.3
合計	1,932.8	1,679.6	2,093.1	1,664.1	7,369.6	2.3	4.0	6.3
平均	161.1	140.0	174.4	138.7	614.1	0.2	0.3	0.5
最大	390.9	326.3	378.4	433.1	714.9	1.9	1.2	2.2
最小	0.0	0.6	0.0	0.0	495.4	0.0	0.0	0.2

(3) 電力使用量等

月	電 力 量							
	動 力 費							
	汚 水 ポ ン プ			そ の 他		合 計		
	買 電 (kWh)	発 電 (kWh)	使用量 ／水量	買 電 (kWh)	発 電 (kWh)	買 電 (kWh)	発 電 (kWh)	使用量計 (kWh)
4	15,530	0	0.1519	5,035	0	20,565	0	20,565
5	16,970	0	0.1741	5,816	0	22,786	0	22,786
6	15,640	0	0.1743	6,240	0	21,880	0	21,880
7	16,990	0	0.1837	7,007	0	23,997	0	23,997
8	15,448	2	0.1686	7,910	0	23,358	2	23,360
9	14,980	0	0.1690	6,186	0	21,166	0	21,166
10	17,530	0	0.1754	6,204	0	23,734	0	23,734
11	19,942	8	0.1835	5,415	0	25,357	8	25,365
12	20,050	0	0.1788	5,151	0	25,201	0	25,201
1	17,480	0	0.1652	4,898	0	22,378	0	22,378
2	13,740	0	0.1530	4,389	0	18,129	0	18,129
3	15,860	0	0.1522	5,425	0	21,285	0	21,285
合計	200,160	10	—	69,676	0	269,836	10	269,846
平均	16,680	1	0.1692	5,806	0	22,486	1	22,487
最大	20,050	8	0.1837	7,910	0	25,357	8	25,365
最小	13,740	0	0.1519	4,389	0	18,129	0	18,129

月	電 力 量					灯 油 使 用 量			その他
	光熱水費	電 力 使 用 量 合 計				自 家 用 発 電 機			用 水 水 道
	買 電 (kWh)	買 電 (kWh)	発 電 (kWh)	使用量計 (kWh)	発電使用量の うち試運転分 (再掲) (kWh)	実運転 (L)	試運転 (L)	合 計 (L)	使用量 (m³)
4	340	20,905	0	20,905	0	0	30	30	0
5	340	23,126	0	23,126	0	0	31	31	2
6	340	22,220	0	22,220	0	0	33	33	1
7	340	24,337	0	24,337	0	0	37	37	0
8	340	23,698	2	23,700	0	72	0	72	0
9	340	21,506	0	21,506	0	0	16	16	1
10	340	24,074	0	24,074	0	0	108	108	0
11	340	25,697	8	25,705	0	298	35	333	0
12	340	25,541	0	25,541	0	0	180	180	1
1	340	22,718	0	22,718	0	0	31	31	0
2	340	18,469	0	18,469	0	0	35	35	0
3	340	21,625	0	21,625	0	0	45	45	0
合計	4,080	273,916	10	273,926	0	370	581	951	5
平均	340	22,826	1	22,827	0	31	48	79	0
最大	340	25,697	8	25,705	0	298	180	333	2
最小	340	18,469	0	18,469	0	0	0	16	0

2 決 算 状 況 調

(1) 処理区分別決算内訳

(単位 円)

項 目	管 理 費	水 処 理 費	計	比 率
職 員 数	0 人	0 人	0 人	-
給 料	0	0	0	0.0%
手 当 等	0	0	0	0.0%
法 定 福 利 費	0	0	0	0.0%
人 件 費 計	0	0	0	0.0%
被 服 費	0	0	0	0.0%
備 消 耗 品 費	0	0	0	0.0%
光 熱 水 費	0	0	0	0.0%
印 刷 製 本 費	0	0	0	0.0%
通 信 運 搬 費	0	-	0	0.0%
賃 借 料	0	0	0	0.0%
手 数 料	0	-	0	0.0%
委 託 料	0	0	0	0.0%
修 繕 費	0	0	0	0.0%
動 力 費	0	7,471,623	7,471,623	100.0%
薬 品 費	0	0	0	0.0%
損 害 保 険 料	0	0	0	0.0%
負 担 金	0	0	0	0.0%
自動車重量税	0	0	0	0.0%
経 費 計	0	7,471,623	7,471,623	100.0%
合 計	0	7,471,623	7,471,623	100.0%
比 率	0.0%	100.0%	100.0%	-

(2) 修繕工事内訳

直 接 修 繕

場所	区分	修 繕 件 名	金額 (千円)	工 期	修 繕 内 容
		なし			
計					

区 分 別 集 計	A	0 件	0 千円	建物
	B	0 件	0 千円	構築物
	C	0 件	0 千円	機械及び装置
	D	0 件	0 千円	車両運搬具
	E	0 件	0 千円	工具及び備品

請 負 修 繕

(市発注分)

場所	区分	修 繕 件 名	金額 (千円)	工 期	修 繕 内 容
電気室	C	定山溪中継ポンプ場自家発用ガスタービンエンジン点検整備業務	63,591	2025/5/15 ~ 2026/3/19	自家発用ガスタービンエンジン点検修繕
計			63,591		

区 分 別 集 計	A	0 件	0 千円	建物
	B	0 件	0 千円	構築物
	C	1 件	63,591 千円	機械及び装置
	D	0 件	0 千円	車両運搬具
	E	0 件	0 千円	工具及び備品

(公社発注分)

場所	区分	修 繕 件 名	金額 (千円)	工 期	修 繕 内 容
		なし			

区 分 別 集 計	A	0 件	—	建物
	B	0 件	—	構築物
	C	0 件	—	機械及び装置
	D	0 件	—	車両運搬具
	E	0 件	—	工具及び備品

