


藤野中継ポンプ場

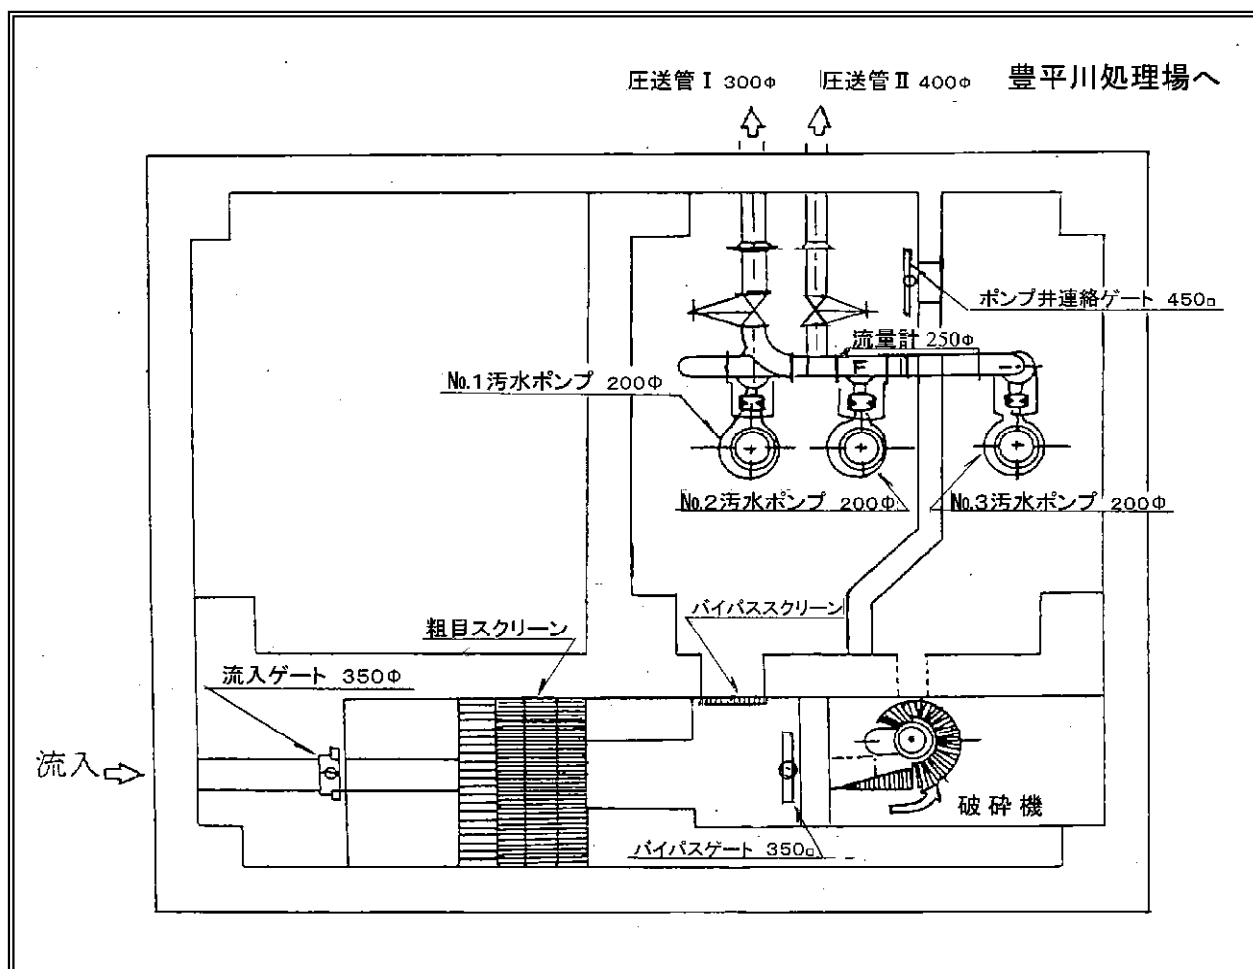

1 運 転 実 績 調

(1) 揚水量等

月	降水量 (mm/月)	総揚水量（送水量）		晴天時汚水量		電動機 による 揚水量 (m ³)	沈砂・スクリーンかす量		
		(m ³)		(m ³)			沈砂量 (m ³)	スクリーンかす (m ³)	計 (m ³)
		月量	日量	月量	日量				
4	105.0	52,020	1,730	44,100	1,470	52,020	0	0	0
5	70.0	41,910	1,350	36,270	1,170	41,910	0	0	0
6	37.5	31,800	1,060	31,200	1,040	31,800	0	0	0
7	66.5	33,440	1,080	31,620	1,020	33,440	0	0	0
8	78.0	33,100	1,070	31,310	1,010	33,100	0	0	0
9	173.5	39,640	1,320	31,500	1,050	39,640	0	0	0
10	50.5	33,510	1,080	33,170	1,070	33,510	0	0	0
11	135.5	48,090	1,600	39,300	1,310	48,090	0	0	0
12	115.0	37,400	1,210	37,400	1,210	37,400	0	0	0
1	56.5	35,340	1,140	35,030	1,130	35,340	0	0	0
2	71.5	35,330	1,260	30,800	1,100	35,330	0	0	0
3	49.5	52,430	1,690	34,100	1,100	52,430	0	0	0
合計	1,009.0	474,010	—	415,800	—	474,010	0	0	0
平均	84.1	39,500	1,300	34,650	1,140	39,500	0	0	0
最大	11/1 84.5	—	11/1 4,720	—	11/16 1,560	11/1 4,720	—	—	—
最小	—	—	7/25 970	—	7/25 970	7/25 970	—	—	—

(2) 運転時間

月	汚水ポンプ運転時間 (h) 4.75 m^3 /分×3台				自家用発電機 運転時間(h) 200 kVA		
	No. 1	No. 2	No. 3	計	実運転	試運転	計
4	0.0	1.8	164.0	165.8	0.0	0.2	0.2
5	132.5	0.0	4.8	137.3	0.0	0.2	0.2
6	5.8	79.7	22.5	108.0	0.0	0.3	0.3
7	2.2	0.0	111.4	113.6	0.0	0.2	0.2
8	0.2	0.0	112.3	112.5	0.4	0.0	0.4
9	3.0	0.0	128.7	131.7	0.0	0.2	0.2
10	0.0	0.0	112.4	112.4	0.1	0.2	0.3
11	0.9	0.0	153.8	154.7	0.0	0.2	0.2
12	0.0	0.0	124.8	124.8	0.0	0.2	0.2
1	101.3	0.0	17.7	119.0	0.0	0.2	0.2
2	5.2	0.0	111.7	116.9	0.0	0.2	0.2
3	0.0	0.0	167.1	167.1	0.0	0.3	0.3
合計	251.1	81.5	1,231.2	1,563.8	0.5	2.4	2.9
平均	20.9	6.8	102.6	130.3	0.0	0.2	0.2
最大	132.5	79.7	167.1	167.1	0.4	0.3	0.4
最小	0.0	0.0	4.8	108.0	0.0	0.0	0.2

(2) 運転時間

月	汚水ポンプ運転時間 (h) 4.75m ³ /分×3台				自家用発電機 運転時間(h) 200 kVA		
	No. 1	No. 2	No. 3	計	実運転	試運転	計
4	0.0	1.8	164.0	165.8	0.0	0.2	0.2
5	132.5	0.0	4.8	137.3	0.0	0.2	0.2
6	5.8	79.7	22.5	108.0	0.0	0.3	0.3
7	2.2	0.0	111.4	113.6	0.0	0.2	0.2
8	0.2	0.0	112.3	112.5	0.4	0.0	0.4
9	3.0	0.0	128.7	131.7	0.0	0.2	0.2
10	0.0	0.0	112.4	112.4	0.1	0.2	0.3
11	0.9	0.0	153.8	154.7	0.0	0.2	0.2
12	0.0	0.0	124.8	124.8	0.0	0.2	0.2
1	101.3	0.0	17.7	119.0	0.0	0.2	0.2
2	5.2	0.0	111.7	116.9	0.0	0.2	0.2
3	0.0	0.0	167.1	167.1	0.0	0.3	0.3
合計	251.1	81.5	1,231.2	1,563.8	0.5	2.4	2.9
平均	20.9	6.8	102.6	130.3	0.0	0.2	0.2
最大	132.5	79.7	167.1	167.1	0.4	0.3	0.4
最小	0.0	0.0	4.8	108.0	0.0	0.0	0.2

(3) 電力使用量等

月	電 力 量							
	動 力 費							
	汚水ポンプ			その他		合 計		
	買 電 (kWh)	発 電 (kWh)	使用量 ／水量	買 電 (kWh)	発 電 (kWh)	買 電 (kWh)	発 電 (kWh)	使用量計 (kWh)
4	7,461	0	0.1434	1,478	0	8,939	0	8,939
5	6,179	0	0.1474	1,441	0	7,620	0	7,620
6	4,861	0	0.1529	1,019	0	5,880	0	5,880
7	5,112	0	0.1529	1,097	0	6,209	0	6,209
8	5,056	7	0.1530	1,142	0	6,198	7	6,205
9	5,927	0	0.1495	1,167	0	7,094	0	7,094
10	5,058	0	0.1509	1,225	0	6,283	0	6,283
11	6,962	0	0.1448	1,417	0	8,379	0	8,379
12	5,616	0	0.1502	1,187	0	6,803	0	6,803
1	5,356	0	0.1516	1,401	0	6,757	0	6,757
2	5,261	0	0.1489	1,051	0	6,312	0	6,312
3	7,520	0	0.1434	1,436	0	8,956	0	8,956
合計	70,369	7	—	15,061	0	85,430	7	85,437
平均	5,864	1	0.1485	1,255	0	7,119	1	7,120
最大	7,520	7	0.1530	1,478	0	8,956	7	8,956
最小	4,861	0	0.1434	1,019	0	5,880	0	5,880

月	電 力 量					灯油使用量			その他
	光熱水費	使用量合計				自家用発電機			用 水 水道
	買 電 (kWh)	買 電 (kWh)	発 電 (kWh)	使用量計 (kWh)	発電使用量の うち試運転分 (再掲) (kWh)	実運転 (L)	試運転 (L)	合計 (L)	使用量 (m ³)
4	175	9,114	0	9,114	0	0	14	14	5
5	294	7,914	0	7,914	0	0	15	15	8
6	285	6,165	0	6,165	0	0	17	17	5
7	287	6,496	0	6,496	0	0	15	15	2
8	291	6,489	7	6,496	0	33	0	33	3
9	286	7,380	0	7,380	0	0	14	14	3
10	206	6,489	0	6,489	0	4	19	23	1
11	225	8,604	0	8,604	0	0	17	17	3
12	300	7,103	0	7,103	0	0	18	18	2
1	367	7,124	0	7,124	0	0	16	16	3
2	292	6,604	0	6,604	0	0	17	17	3
3	286	9,242	0	9,242	0	0	22	22	2
合計	3,294	88,724	7	88,731	0	37	184	221	40
平均	275	7,394	1	7,394	0	3	15	18	3
最大	367	9,242	7	9,242	0	33	22	33	8
最小	175	6,165	0	6,165	0	0	0	14	1

2 決 算 状 況 調

(1) 処理区分別決算内訳

(単位 円)

項 目	管 理 費	水 処 理 費	計	比 率
職 員 数	0 人	0 人	0 人	-
給 料	0	0	0	0.0%
手 当 等	0	0	0	0.0%
法 定 福 利 費	0	0	0	0.0%
人 件 費 計	0	0	0	0.0%
被 服 費	0	0	0	0.0%
備 消 耗 品 費	0	0	0	0.0%
光 熱 水 費	0	0	0	0.0%
印 刷 製 本 費	0	0	0	0.0%
通 信 運 搬 費	0	-	0	0.0%
賃 借 料	0	0	0	0.0%
手 数 料	0	-	0	0.0%
委 託 料	0	0	0	0.0%
修 繕 費	0	0	0	0.0%
動 力 費	0	2,972,614	2,972,614	100.0%
薬 品 費	0	0	0	0.0%
損 害 保 険 料	0	0	0	0.0%
負 担 金	0	0	0	0.0%
自 動 車 重 量 税	0	0	0	0.0%
経 費 計	0	2,972,614	2,972,614	100.0%
合 計	0	2,972,614	2,972,614	100.0%
比 率	0.0%	100.0%	100.0%	-

(2) 修繕工事内訳

直接修繕

場所	区分	修繕件名	金額 (千円)	工期	修繕内容
		なし			
計			0		

区分別集計	A	0 件	0 千円	建物
	B	0 件	0 千円	構築物
	C	0 件	0 千円	機械及び装置
	D	0 件	0 千円	車両運搬具
	E	0 件	0 千円	工具及び備品

請負修繕

(市発注分)

場所	区分	修繕件名	金額 (千円)	工期	修繕内容
ポンプ	C	藤野中継ポンプ場No. 2汚水ポンプ修繕工事	21,010	2025 11/17 ~ 2026 9/30	絶縁不良により使用が できない状態であるため 修繕を行う。
計			21,010		

区分別集計	A	0 件	0 千円	建物
	B	0 件	0 千円	構築物
	C	1 件	21,010 千円	機械及び装置
	D	0 件	0 千円	車両運搬具
	E	0 件	0 千円	工具及び備品

(公社発注分)

場所	区分	修繕件名	金額 (千円)	工期	修繕内容
		なし			

区分別集計	A	0 件	—	建物
	B	0 件	—	構築物
	C	0 件	—	機械及び装置
	D	0 件	—	車両運搬具
	E	0 件	—	工具及び備品

