


簾舞中継ポンプ場

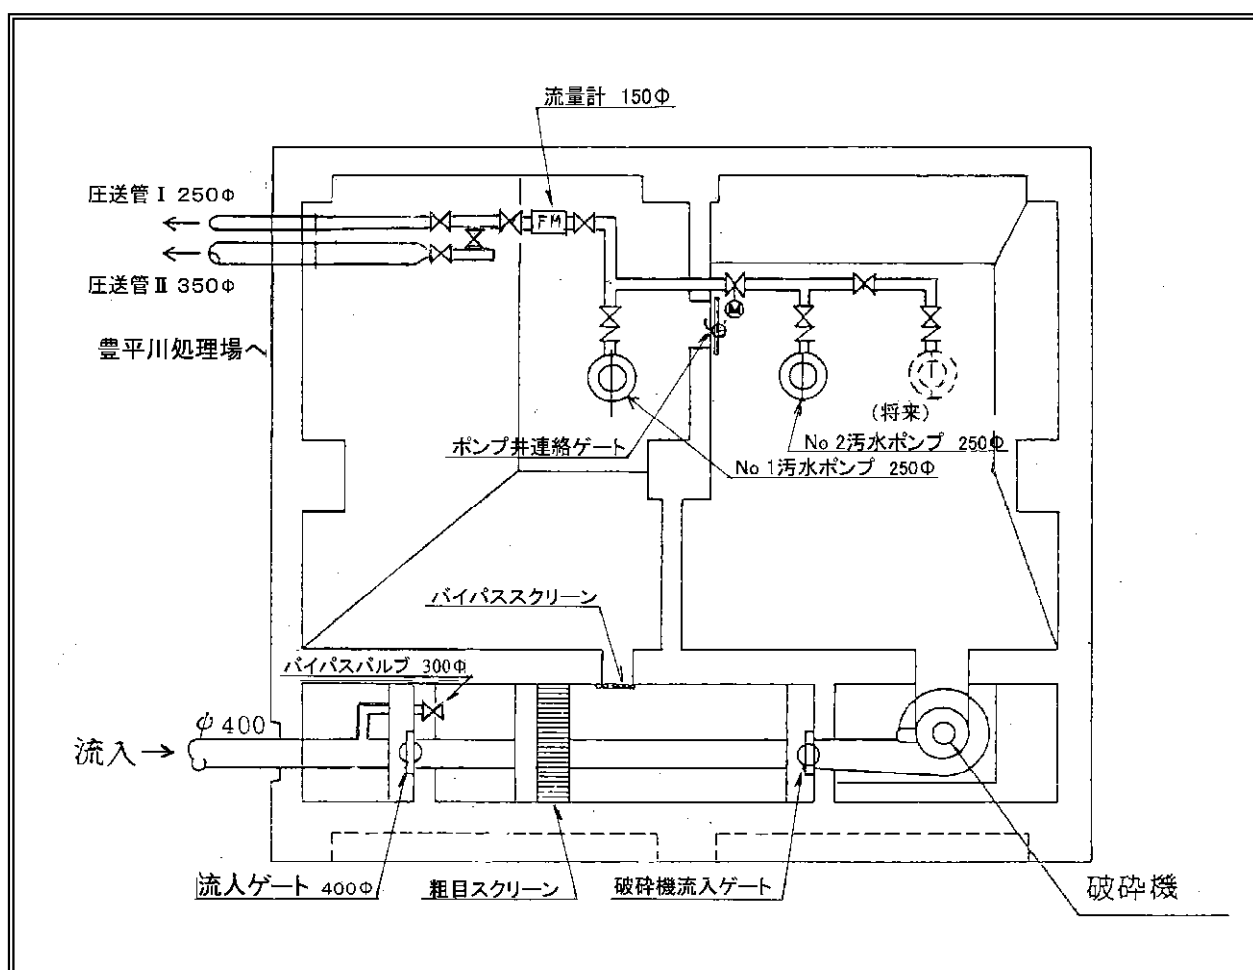

1 運 転 実 績 調

(1) 揚水量等

月	降水量 (mm/月)	総揚水量（送水量）		晴天時汚水量		電動機 による 揚水量 (m ³)	沈砂・スクリーンかす量		
		(m ³)		(m ³)			沈砂 (m ³)	スクリーンかす (m ³)	計 (m ³)
		月量	日量	月量	日量				
4	103.0	47,530	1,580	34,500	1,150	47,530	0	0	0
5	65.0	33,180	1,070	27,590	890	33,180	0	0	0
6	35.5	22,720	760	22,200	740	22,720	0	0	0
7	63.5	22,510	730	21,080	680	22,510	0	0	0
8	81.0	22,010	710	20,460	660	22,010	0	0	0
9	147.0	27,620	920	21,000	700	27,620	0	0	0
10	52.5	21,660	700	21,080	680	21,660	0	0	0
11	140.5	38,390	1,280	29,100	970	38,390	0	0	0
12	115.0	26,040	840	26,040	840	26,040	0	0	0
1	56.5	22,950	740	22,320	720	22,950	0	0	0
2	71.5	24,200	860	19,880	710	24,200	0	0	0
3	42.0	41,200	1,330	22,010	710	41,200	0	0	0
合計	973.0	350,010	—	287,260	—	350,010	0	0	0
平均	81.1	29,170	960	23,940	790	29,170	0	0	0
最大	11/1 92.0	—	11/1 5,010	—	4/22 1,150	11/1 5,010	—	—	—
最小	—	—	7/11 580	—	7/11 580	7/11 580	—	—	—

(2) 運転時間

月	汚水ポンプ運転時間(h) 4.0m ³ /分×2台			自家用発電機 運転時間(h) 400 kVA		
	No. 1	No. 2	計	実運転	試運転	計
4	1.1	126.1	127.2	0.0	0.1	0.1
5	68.0	1.1	69.1	0.0	0.4	0.4
6	2.3	46.0	48.3	0.0	0.1	0.1
7	45.7	0.9	46.6	0.0	0.1	0.1
8	0.4	45.3	45.7	0.6	0.0	0.6
9	55.4	0.4	55.8	0.0	0.4	0.4
10	0.6	44.4	45.0	0.0	0.1	0.1
11	57.9	22.4	80.3	0.1	0.1	0.2
12	35.2	19.4	54.6	0.0	0.1	0.1
1	47.5	0.0	47.5	0.0	0.1	0.1
2	42.7	6.6	49.3	0.0	0.1	0.1
3	0.3	80.6	80.9	0.0	0.1	0.1
合計	357.1	393.2	750.3	0.7	1.7	2.4
平均	29.8	32.8	62.5	0.1	0.1	0.2
最大	68.0	126.1	127.2	0.6	0.4	0.6
最小	0.3	0.0	45.0	0.0	0.0	0.1

(2) 運転時間

月	汚水ポンプ運転時間(h) 4.0m ³ /分×2台			自家用発電機 運転時間(h) 400 kVA		
	No. 1	No. 2	計	実運転	試運転	計
4	1.1	126.1	127.2	0.0	0.1	0.1
5	68.0	1.1	69.1	0.0	0.4	0.4
6	2.3	46.0	48.3	0.0	0.1	0.1
7	45.7	0.9	46.6	0.0	0.1	0.1
8	0.4	45.3	45.7	0.6	0.0	0.6
9	55.4	0.4	55.8	0.0	0.4	0.4
10	0.6	44.4	45.0	0.0	0.1	0.1
11	57.9	22.4	80.3	0.1	0.1	0.2
12	35.2	19.4	54.6	0.0	0.1	0.1
1	47.5	0.0	47.5	0.0	0.1	0.1
2	42.7	6.6	49.3	0.0	0.1	0.1
3	0.3	80.6	80.9	0.0	0.1	0.1
合計	357.1	393.2	750.3	0.7	1.7	2.4
平均	29.8	32.8	62.5	0.1	0.1	0.2
最大	68.0	126.1	127.2	0.6	0.4	0.6
最小	0.3	0.0	45.0	0.0	0.0	0.1

(3) 電力使用量等

月	電 力 量							
	動 力 費							
	汚水ポンプ			その他		合計		
	買 電 (kWh)	発 電 (kWh)	使用量 ／水量	買 電 (kWh)	発 電 (kWh)	買 電 (kWh)	発 電 (kWh)	使用量計 (kWh)
4	8,586	0	0.1806	1,822	0	10,408	0	10,408
5	4,664	0	0.1406	2,637	0	7,301	0	7,301
6	3,260	0	0.1435	2,155	0	5,415	0	5,415
7	3,146	0	0.1398	2,378	0	5,524	0	5,524
8	2,965	120	0.1402	2,719	0	5,684	120	5,804
9	3,767	0	0.1364	2,532	0	6,299	0	6,299
10	3,038	0	0.1403	2,552	0	5,590	0	5,590
11	5,420	0	0.1412	3,021	0	8,441	0	8,441
12	3,686	0	0.1416	2,840	0	6,526	0	6,526
1	3,206	0	0.1397	2,771	0	5,977	0	5,977
2	3,328	0	0.1375	2,623	0	5,951	0	5,951
3	5,461	0	0.1325	3,711	0	9,172	0	9,172
合計	50,527	120	—	31,761	0	82,288	120	82,408
平均	4,211	10	0.1447	2,647	0	6,857	10	6,867
最大	8,586	120	0.1806	3,711	0	10,408	120	10,408
最小	2,965	0	0.1325	1,822	0	5,415	0	5,415

月	電 力 量					重油使用量			その他
	光熱水費 水処理	使用量合計				自家発電電機			用 水 水 道
	買 電 (kWh)	買 電 (kWh)	発 電 (kWh)	使用量計 (kWh)	発電使用量の うち試運転分 (再掲) (kWh)	実運転 (L)	試運転 (L)	合計 (L)	使用量 (m ³)
4	247	10,655	0	10,655	0	0	8	8	4
5	236	7,537	0	7,537	0	0	28	28	4
6	172	5,587	0	5,587	0	0	8	8	3
7	316	5,840	0	5,840	0	0	10	10	4
8	164	5,848	120	5,968	0	44	0	44	3
9	176	6,475	0	6,475	0	0	26	26	3
10	224	5,814	0	5,814	0	0	7	7	2
11	242	8,683	0	8,683	0	1	7	8	3
12	366	6,892	0	6,892	0	0	8	8	3
1	265	6,242	0	6,242	0	0	7	7	2
2	271	6,222	0	6,222	0	0	5	5	2
3	349	9,521	0	9,521	0	0	10	10	7
合計	3,028	85,316	120	85,436	0	45	124	169	40
平均	252	7,110	10	7,120	0	4	10	14	3
最大	366	10,655	120	10,655	0	44	28	44	7
最小	164	5,587	0	5,587	0	0	0	5	2

2 決 算 状 況 調

(1) 処理区分別決算内訳

(単位 円)

項 目	管 理 費	水 処 理 費	計	比 率
職 員 数	0 人	0 人	0 人	-
給 料	0	0	0	0.0%
手 当 等	0	0	0	0.0%
法 定 福 利 費	0	0	0	0.0%
人 件 費 計	0	0	0	0.0%
被 服 費	0	0	0	0.0%
備 消 耗 品 費	0	0	0	0.0%
光 熱 水 費	0	0	0	0.0%
印 刷 製 本 費	0	0	0	0.0%
通 信 運 搬 費	0	-	0	0.0%
賃 借 料	0	0	0	0.0%
手 数 料	0	-	0	0.0%
委 託 料	0	0	0	0.0%
修 繕 費	0	20,214,150	20,214,150	87.7%
動 力 費	0	2,826,817	2,826,817	12.3%
薬 品 費	0	0	0	0.0%
損 害 保 険 料	0	0	0	0.0%
負 担 金	0	0	0	0.0%
自 動 車 重 量 税	0	0	0	0.0%
経 費 計	0	23,040,967	23,040,967	100.0%
合 計	0	23,040,967	23,040,967	100.0%
比 率	0.0%	100.0%	100.0%	-

(2) 修繕工事内訳

直 接 修 繕

場所	区分	修 繕 件 名	金額 (千円)	工 期	修 繕 内 容
		なし			
計			0		

区 分 別 集 計	A	0 件	0 千円	建物
	B	0 件	0 千円	構築物
	C	0 件	0 千円	機械及び装置
	D	0 件	0 千円	車両運搬具
	E	0 件	0 千円	工具及び備品

請 負 修 繕

(市発注分)

場所	区分	修 繕 件 名	金額 (千円)	工 期	修 繕 内 容
ポン プ	C	簾舞中継ポンプ場 No.2汚水ポンプ修繕工事	20,214	2025 7/7 ~ 2026 3/19	No. 2汚水ポンプ修繕工事
計			20,214		

区 分 別 集 計	A	0 件	0 千円	建物
	B	0 件	0 千円	構築物
	C	1 件	20,214 千円	機械及び装置
	D	0 件	0 千円	車両運搬具
	E	0 件	0 千円	工具及び備品

(公社発注分)

場所	区分	修 繕 件 名	金額 (千円)	工 期	修 繕 内 容
		なし			

区 分 別 集 計	A	0 件	—	建物
	B	0 件	—	構築物
	C	0 件	—	機械及び装置
	D	0 件	—	車両運搬具
	E	0 件	—	工具及び備品

