


藻岩下第2中継ポンプ場

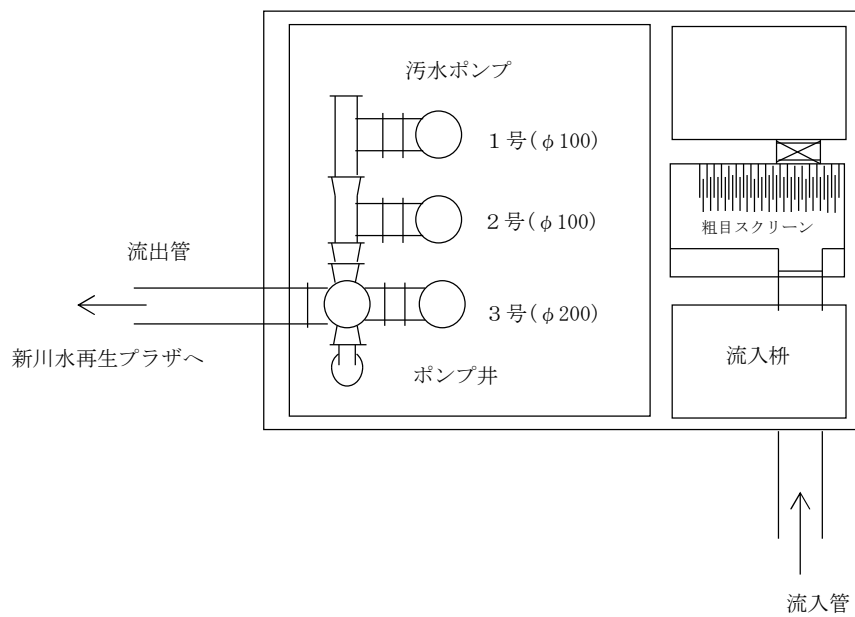

1 運 転 実 績 調

(1) 揚水量

月	総揚水(送水)量 (m ³)		晴天時汚水量 (m ³)		送水雨水量 (m ³)		電動機による 揚水量 (m ³)	沈砂・ スクリーンかす量(m ³)		
	月 量	日量	月 量	日量	月 量	日量		沈砂	スクリー んかす	計
4	14,980	400	1,800	60	13,180	340	14,980	0.0	0.0	0.0
5	6,390	210	1,860	60	4,530	150	6,390	0.0	0.0	0.0
6	3,740	120	1,800	60	1,940	60	3,740	0.0	0.0	0.0
7	3,660	120	1,860	60	1,800	60	3,660	0.0	0.0	0.0
8	4,000	130	1,860	60	2,140	70	4,000	0.0	0.0	0.0
9	8,670	270	1,800	60	6,870	210	8,670	0.0	0.0	0.0
10	7,260	230	1,860	60	5,400	170	7,260	0.0	0.0	0.0
11	3,570	130	1,800	60	1,770	70	3,570	0.0	0.0	0.0
12	3,180	100	1,860	60	1,320	40	3,180	0.0	0.0	0.0
1	3,110	100	1,860	60	1,250	40	3,110	0.0	0.0	0.0
2	3,210	110	1,680	60	1,530	50	3,210	0.0	0.0	0.0
3	5,780	210	1,860	60	3,920	150	5,780	0.0	0.0	0.0
合計	67,550	—	21,900	—	45,650	—	67,550	0.0	0.0	0.0
平均	5,630	190	1,830	60	3,800	130	5,630	0.0	0.0	0.0
最大	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
最小	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

(2) 運転時間

月	汚水ポンプ運転時間 (h)				自家発運転時間(h)	
	No.1 φ100 1.5m ³ /分	No.2 φ100 1.5m ³ /分	No.3 φ200 3.3m ³ /分	計	実運転	試運転
4	88.2	84.0	0.0	172.2	0.0	0.2
5	37.9	35.5	0.0	73.4	0.0	0.2
6	22.1	20.9	0.0	43.0	0.0	0.2
7	19.1	21.8	0.5	41.4	0.0	0.2
8	22.9	22.8	0.1	45.8	0.0	0.2
9	43.3	42.0	6.3	91.6	0.0	0.2
10	42.6	40.9	0.0	83.5	0.0	0.2
11	21.2	19.8	0.0	41.0	0.0	0.2
12	18.5	18.0	0.0	36.5	0.0	0.2
1	18.0	17.8	0.0	35.8	0.0	0.2
2	18.5	18.4	0.0	36.9	0.0	0.2
3	33.4	33.0	0.0	66.4	0.0	0.2
合計	385.7	374.9	6.9	767.5	0.0	2.4
平均	32.1	31.2	0.6	64.0	0.0	0.2
最大	88.2	84.0	6.3	172.2	0.0	0.2
最小	18.0	17.8	0.0	35.8	0.0	0.2

(3) 電力使用量

月	電力量											
	水処理（動力）							光熱 水費	電力量合計			
	揚水量			その他 （動力）		合計						
	汚水ポンプ											
	水量 (m^3)	買電 (kWh)	発電 (kWh)	使用量 ／水量	買電 (kWh)	発電 (kWh)	買電 (kWh)	買電 (kWh)	買電 (kWh)	発電 (kWh)	使用量 (kWh)	発電量のうち 試運転分 (kWh)
4	14,980	947	0	0.0632	-60	0	887	6	893	0	893	0
5	6,390	404	0	0.0632	393	0	797	7	804	0	804	0
6	3,740	237	0	0.0634	137	0	374	5	379	0	379	0
7	3,660	236	0	0.0645	277	0	513	6	519	0	519	0
8	4,000	254	0	0.0635	324	0	578	8	586	0	586	0
9	8,670	602	0	0.0694	-22	0	580	6	586	0	586	0
10	7,260	459	0	0.0632	212	0	671	6	677	0	677	0
11	3,570	226	0	0.0633	332	0	558	6	564	0	564	0
12	3,180	201	0	0.0632	142	0	343	6	349	0	349	0
1	3,110	197	0	0.0633	381	0	578	7	585	0	585	0
2	3,210	203	0	0.0632	259	0	462	5	467	0	467	0
3	5,780	365	0	0.0631	118	0	483	5	488	0	488	0
合計	67,550	4,329	0	—	2,495	0	6,824	73	6,897	0	6,897	0
平均	5,630	361	0	0.0641	209	0	570	10	570	0	570	0
最大	14,980	947	—	—	393	—	887	8	893	0	893	—
最小	3,110	197	—	—	-60	—	343	5	349	0	349	—

(4) 軽油使用量

月	軽油			
	自家発電機		合 計 使用量(L)	
	燃料使用量(L)			
	実運転	試運転	実運転	試運転
4	0.0	1.5	0.0	1.5
5	0.0	1.5	0.0	1.5
6	0.0	1.5	0.0	1.5
7	0.0	1.5	0.0	1.5
8	0.0	1.5	0.0	1.5
9	0.0	1.5	0.0	1.5
10	0.0	1.5	0.0	1.5
11	0.0	1.5	0.0	1.5
12	0.0	1.5	0.0	1.5
1	0.0	1.5	0.0	1.5
2	0.0	1.5	0.0	1.5
3	0.0	1.5	0.0	1.5
合計	0.0	18.0	0.0	18.0
平均	0.0	1.5	0.0	1.5
最大	0.0	1.5	0.0	1.5
最小	0.0	1.5	0.0	1.5

2 決 算 状 況 調

(1) 処理区分別決算内訳

(単位 円)

項 目	管 理 費	水 処 理 費	計	比 率
職 員 数	0 人	0 人	0 人	—
給 料	0	0	0	0.0%
手 当 等	0	0	0	0.0%
法 定 福 利 費	0	0	0	0.0%
人 件 費 計	0	0	0	0.0%
被 服 費	0	0	0	0.0%
備 消 耗 品 費	0	0	0	0.0%
光 熱 水 費	0	0	0	0.0%
印 刷 製 本 費	0	0	0	0.0%
通 信 運 搬 費	0	—	0	0.0%
賃 借 料	0	0	0	0.0%
手 数 料	0	—	0	0.0%
委 託 料	0	0	0	0.0%
修 繕 費	0	526,680	526,680	49.0%
動 力 費	0	547,900	547,900	51.0%
薬 品 費	0	0	0	0.0%
損 害 保 険 料	0	0	0	0.0%
負 担 金	0	0	0	0.0%
自動車重量税	0	0	0	0.0%
経 費 計	0	1,074,580	1,074,580	100.0%
合 計	0	1,074,580	1,074,580	100.0%
比 率	0.0%	100.0%	100.0%	—

(2) 修繕工事等内訳

直接修繕

場所	区分	修繕件名	金額 (千円)	工期	修繕内容
その他	C	藻岩下第2中継ポンプ場UPS交換	447	3/31	UPS更新
			447		

区分別集計	A	0 件	0 千円	建物
	B	0 件	0 千円	構築物
	C	1 件	447 千円	機械及び装置
	D	0 件	0 千円	車両運搬具
	E	0 件	0 千円	工具器具及び備品

請負修繕

場所	区分	修繕件名	金額 (千円)	工期	修繕内容
		なし	0	～	
計			0		

区分別集計	A	0 件	0 千円	建物
	B	0 件	0 千円	構築物
	C	0 件	0 千円	機械及び装置
	D	0 件	0 千円	車両運搬具
	E	0 件	0 千円	工具器具及び備品
