


東 雁 来 雨 水 ポ ン プ 場

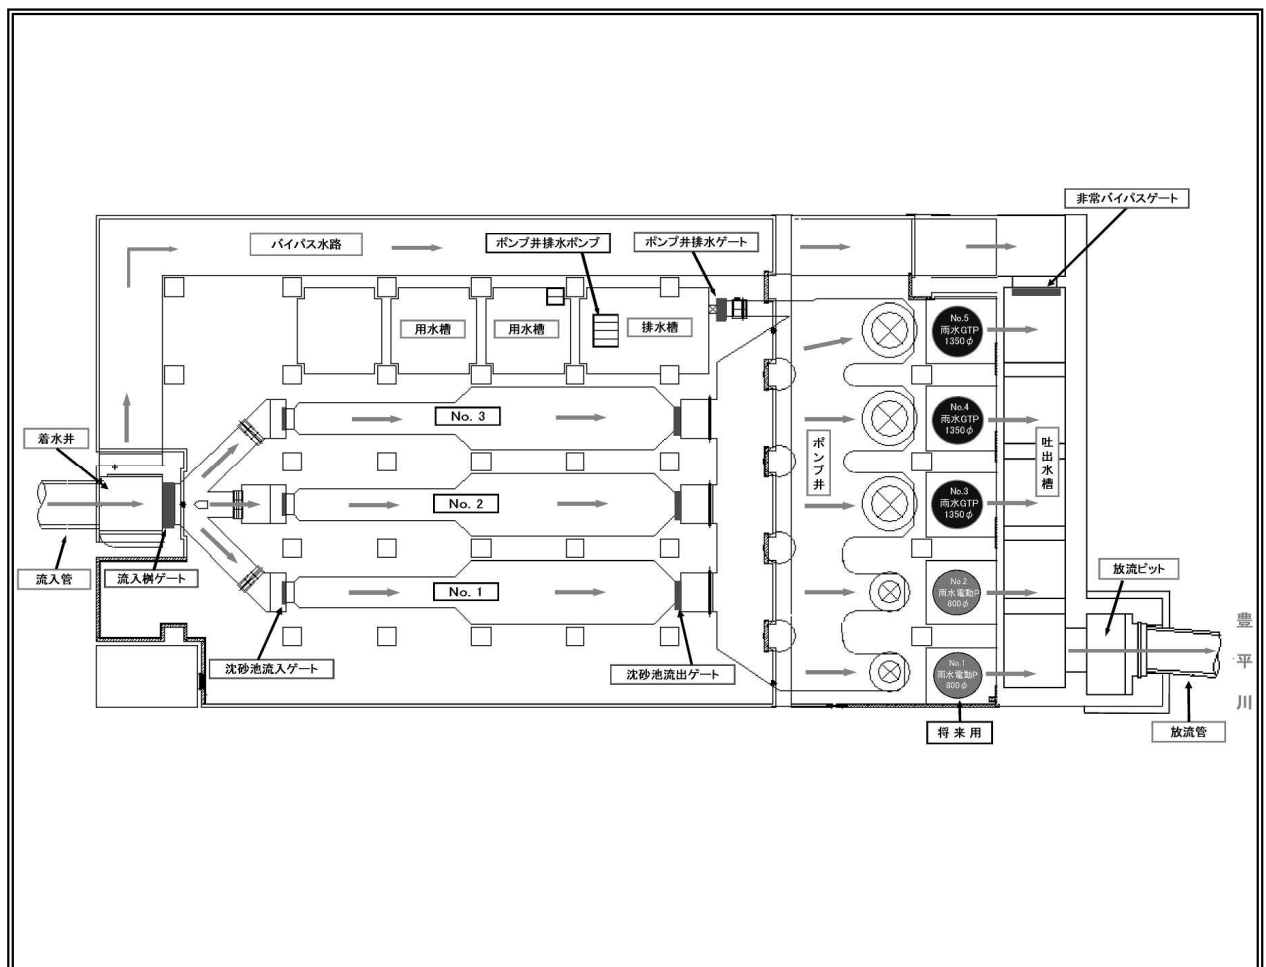

1 運 転 実 績 調

(1) 揚 水 量 等

月	降水量 (mm/月)	総 揚 水 量 (m ³)		雨 水 放 水 量 (m ³) (雨 水 ポ ン プ)			雨 水 送 水 量 (m ³) (排 水 ポ ン プ)	
		月 量	日 量	日数	月 量	日 量	月 量	日 量
4	91.5	14,240	470	3	8,730	290	5,510	180
5	42.0	5,780	190	1	2,870	90	2,910	100
6	18.0	1,300	40	0	0	0	1,300	40
7	76.5	31,370	1,010	4	26,720	860	4,650	150
8	79.0	27,790	900	3	23,380	750	4,410	150
9	138.0	83,240	2,770	8	73,700	2,460	9,540	310
10	39.0	3,670	120	0	0	0	3,670	120
11	112.0	39,240	1,310	2	35,220	1,170	4,020	140
12	110.5	1,390	40	0	0	0	1,390	40
1	183.5	1,050	30	0	0	0	1,050	30
2	93.0	4,400	160	1	3,230	120	1,170	40
3	54.5	3,560	110	0	0	0	3,560	110
合計	1,037.5	217,030	—	22	173,850	—	43,180	—
平均	86.5	18,090	590	2	14,490	480	3,600	110
最大	11/1 58.0	—	11/1 33,630	8	—	11/1 33,110	—	9/18 2,420
最小	—	—	—	0	—	—	—	—

月	動 力 別 揚 水 量 (m ³)			沈 砂 ・ ス ク リ ー ン か す 量 (m ³)		
	電 動 機	エ ン ジ ン	計	沈 砂	ス ク リ ー ン か す	計
4	14,240	0	14,240	4.4	0.0	4.4
5	5,780	0	5,780	0.0	0.0	0.0
6	1,300	0	1,300	0.0	0.0	0.0
7	27,980	3,390	31,370	0.0	0.0	0.0
8	18,460	9,330	27,790	0.0	0.0	0.0
9	60,890	22,350	83,240	5.0	0.0	5.0
10	3,670	0	3,670	0.0	0.0	0.0
11	36,060	3,180	39,240	0.0	0.0	0.0
12	1,390	0	1,390	4.1	0.0	4.1
1	1,050	0	1,050	0.0	0.0	0.0
2	4,400	0	4,400	0.0	0.0	0.0
3	3,560	0	3,560	0.0	0.0	0.0
合計	178,780	38,250	217,030	13.5	0.0	13.5
平均	14,900	3,190	18,090	1.1	0.0	1.1
最大	9/20 17,710	9/20 12,690	—	—	—	—
最小	—	—	—	—	—	—

(2) 運 転 時 間

月	電動雨水ポンプ運転時間(h)						自家発 運転時間 (h)	
	No. 1 φ 800 90m ³ /分		No. 2 φ 800 90m ³ /分		計			
	実運転	試運転	実運転	試運転	実運転	試運転	実運転	試運転
4	0.0	0.1	0.8	0.1	0.8	0.2	0.0	0.3
5	0.1	0.1	0.0	0.1	0.1	0.2	0.0	0.3
6	0.0	0.1	0.0	0.1	0.0	0.2	0.0	0.3
7	2.6	0.2	0.0	0.2	2.6	0.4	0.0	0.3
8	0.0	0.1	1.5	0.1	1.5	0.2	0.0	0.3
9	6.9	0.1	0.0	0.1	6.9	0.2	0.0	0.3
10	0.0	0.1	0.0	0.1	0.0	0.2	0.0	0.3
11	0.1	0.1	3.9	0.1	4.0	0.2	0.0	0.3
12	0.0	0.1	0.0	0.1	0.0	0.2	0.0	0.3
1	0.0	0.1	0.0	0.1	0.0	0.2	0.0	0.3
2	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1	0.2	0.0	0.3
3	0.0	0.1	0.0	0.1	0.0	0.2	0.0	0.3
合計	9.7	1.3	6.3	1.3	16.0	2.6	0.0	3.6
平均	0.8	0.1	0.5	0.1	1.3	0.2	0.0	0.3
最大	6.9	0.2	3.9	0.2	6.9	0.4	0.0	0.3
最小	0.0	0.1	0.0	0.1	0.0	0.2	0.0	0.3

月	エンジン雨水ポンプ運転時間(h)							
	No. 3 φ 1,350 228m ³ /分		No. 4 φ 1,350 228m ³ /分		No. 5 φ 1,350 228m ³ /分		計	
	実運転	試運転	実運転	試運転	実運転	試運転	実運転	試運転
4	0.0	0.3	0.0	0.3	0.0	0.3	0.0	0.9
5	0.0	0.3	0.0	0.3	0.0	0.3	0.0	0.9
6	0.0	0.3	0.0	0.3	0.0	0.3	0.0	0.9
7	0.8	0.3	0.0	0.3	0.0	0.3	0.8	0.9
8	0.0	0.3	1.1	0.0	0.3	0.0	1.4	0.3
9	0.0	0.3	0.0	0.3	3.0	0.4	3.0	1.0
10	0.0	0.3	0.0	0.3	0.0	0.3	0.0	0.9
11	1.5	0.3	0.0	0.3	0.0	0.3	1.5	0.9
12	0.0	0.3	0.0	0.3	0.0	0.3	0.0	0.9
1	0.0	0.3	0.0	0.3	0.0	0.3	0.0	0.9
2	0.0	0.3	0.0	0.3	0.0	0.3	0.0	0.9
3	0.0	0.3	0.0	0.3	0.0	0.3	0.0	0.9
合計	2.3	3.6	1.1	3.3	3.3	3.4	6.7	10.3
平均	0.2	0.3	0.1	0.3	0.3	0.3	0.6	0.9
最大	1.5	0.3	1.1	0.3	3.0	0.4	3.0	1.0
最小	0.0	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3

(3) 電力使用量

月	電 力 量			
	水 処 理 量 (動 力)			
	揚 水 量			
	雨 水 ポ ン プ			
	水 量 (m^3)	買 電 (kWh)	発 電 (kWh)	使 用 量 / 水 量
4	5,180	335	0	0.0647
5	830	67	0	0.0807
6	0	65	0	—
7	17,600	1,107	0	0.0629
8	10,560	625	0	0.0592
9	46,680	2,678	0	0.0574
10	0	28	0	—
11	26,920	1,526	0	0.0567
12	0	28	0	—
1	0	34	0	—
2	860	87	0	0.1012
3	0	29	0	—
合計	108,630	6,609	0	—
平均	9,050	551	0	0.0608
最大	46,680	2,678	—	0.1012
最小	0	28	—	0.0567

月	電 力 量						
	そ の 他		光 熱 水 費	合 計			
	買 電 (kWh)	発 電 (kWh)	買 電 (kWh)	買 電 (kWh)	発 電 (kWh)	使 用 量 (kWh)	発電量のうち 試運転分(kWh)
4	17,929	0	4,068	22,332	0	22,332	0
5	17,276	0	3,121	20,464	0	20,464	0
6	17,003	0	2,970	20,038	0	20,038	0
7	19,402	0	2,826	23,335	0	23,335	0
8	18,242	0	2,821	21,688	0	21,688	0
9	17,144	0	2,700	22,522	0	22,522	0
10	14,620	0	2,790	17,438	0	17,438	0
11	14,270	0	2,865	18,661	0	18,661	0
12	14,438	0	6,178	20,644	0	20,644	0
1	15,338	0	8,338	23,710	0	23,710	0
2	14,080	0	7,177	21,344	0	21,344	0
3	14,957	0	6,397	21,383	0	21,383	0
合計	194,699	0	52,251	253,559	0	253,559	0
平均	16,225	0	4,354	21,130	0	21,130	0
最大	19,402	0	8,338	23,710	—	23,710	—
最小	14,080	0	2,700	17,438	—	17,438	—

(4) 重油使用量・その他（用水）

月	重油動力							
	雨水ポンプ				自家発電機		合計	
	水量 (m^3)	燃料使用量(L)		使用量 ／ 水量	燃料使用量(L)		使用量(L)	
		実運転	試運転		実運転	試運転	実運転	試運転
4	0	0	170	—	0	4	0	174
5	0	0	166	—	0	4	0	170
6	0	0	173	—	0	4	0	177
7	3,390	235	173	0.1204	0	4	235	177
8	9,330	439	57	0.0532	0	4	439	61
9	22,350	976	210	0.0531	0	4	976	214
10	0	0	172	—	0	5	0	177
11	3,180	382	170	0.1736	0	4	382	174
12	0	0	173	—	0	4	0	177
1	0	0	173	—	0	5	0	178
2	0	0	173	—	0	4	0	177
3	0	0	180	—	0	4	0	184
合計	38,250	2,032	1,990	—	0	50	2,032	2,040
平均	3,190	169	166	0.0531	0	4	169	170
最大	22,350	976	210	0.1736	0	5	976	214
最小	0	0	57	0.0531	0	4	0	61

月	その他	
	用水	
	水道水 使用量 (m^3)	井戸水 使用量 (m^3)
4	0	985
5	1	1,616
6	0	968
7	0	1,534
8	0	94
9	1	195
10	0	1,001
11	0	1,158
12	1	908
1	0	938
2	0	946
3	0	1,055
合計	3	11,398
平均	0	950
最大	1	1,616
最小	0	94

2 決 算 状 況 調

(1) 処理区分別決算内訳

(単位 円)

項 目	管 理 費	水 処 理 費	計	比 率
職 員 数	0 人	0 人	0 人	—
給 料	0	0	0	0.0%
手 当 等	0	0	0	0.0%
法 定 福 利 費	0	0	0	0.0%
人 件 費 計	0	0	0	0.0%
被 服 費	0	0	0	0.0%
備 消 耗 品 費	0	0	0	0.0%
光 熱 水 費	0	0	0	0.0%
印 刷 製 本 費	0	0	0	0.0%
通 信 運 搬 費	0	—	0	0.0%
賃 借 料	0	0	0	0.0%
手 数 料	0	—	0	0.0%
委 託 料	0	0	0	0.0%
修 繕 費	0	4,994,000	4,994,000	27.1%
動 力 費	0	13,455,204	13,455,204	72.9%
薬 品 費	0	0	0	0.0%
損 害 保 険 料	0	0	0	0.0%
負 担 金	0	0	0	0.0%
自 動 車 重 量 税	0	0	0	0.0%
経 費 計	0	18,449,204	18,449,204	100.0%
合 計	0	18,449,204	18,449,204	100.0%
比 率	0.0%	100.0%	100.0%	—

(2) 修繕工事等内訳

直 接 修 繕

場所	区分	修 繕 件 名	金額 (千円)	工 期	修 繕 内 容
設 庁 備 舎	C	消火ポンプユニット機器調整	受託	10/16 ～ 3/31	流量計交換作業及びメイン ボード調整作業
計			0		

区 分 別 集 計	A	0 件	0 千円	建物
	B	0 件	0 千円	構築物
	C	1 件	0 千円	機械及び装置
	D	0 件	0 千円	車両運搬具
	E	0 件	0 千円	工具器具及び備品

請 負 修 繕

(市発注分)

場所	区分	修 繕 件 名	金額 (千円)	工 期	修 繕 内 容
		なし			
計			0		

区 分 別 集 計	A	0 件	0 千円	建物
	B	0 件	0 千円	構築物
	C	0 件	0 千円	機械及び装置
	D	0 件	0 千円	車両運搬具
	E	0 件	0 千円	工具器具及び備品

請 負 修 繕

(公社発注分)

場所	区分	修 繕 件 名	金額 (千円)	工 期	修 繕 内 容
		なし			
計			0		

区 分 別 集 計	A	0 件	0 千円	建物
	B	0 件	0 千円	構築物
	C	0 件	0 千円	機械及び装置
	D	0 件	0 千円	車両運搬具
	E	0 件	0 千円	工具器具及び備品

