


豊平川中継ポンプ場

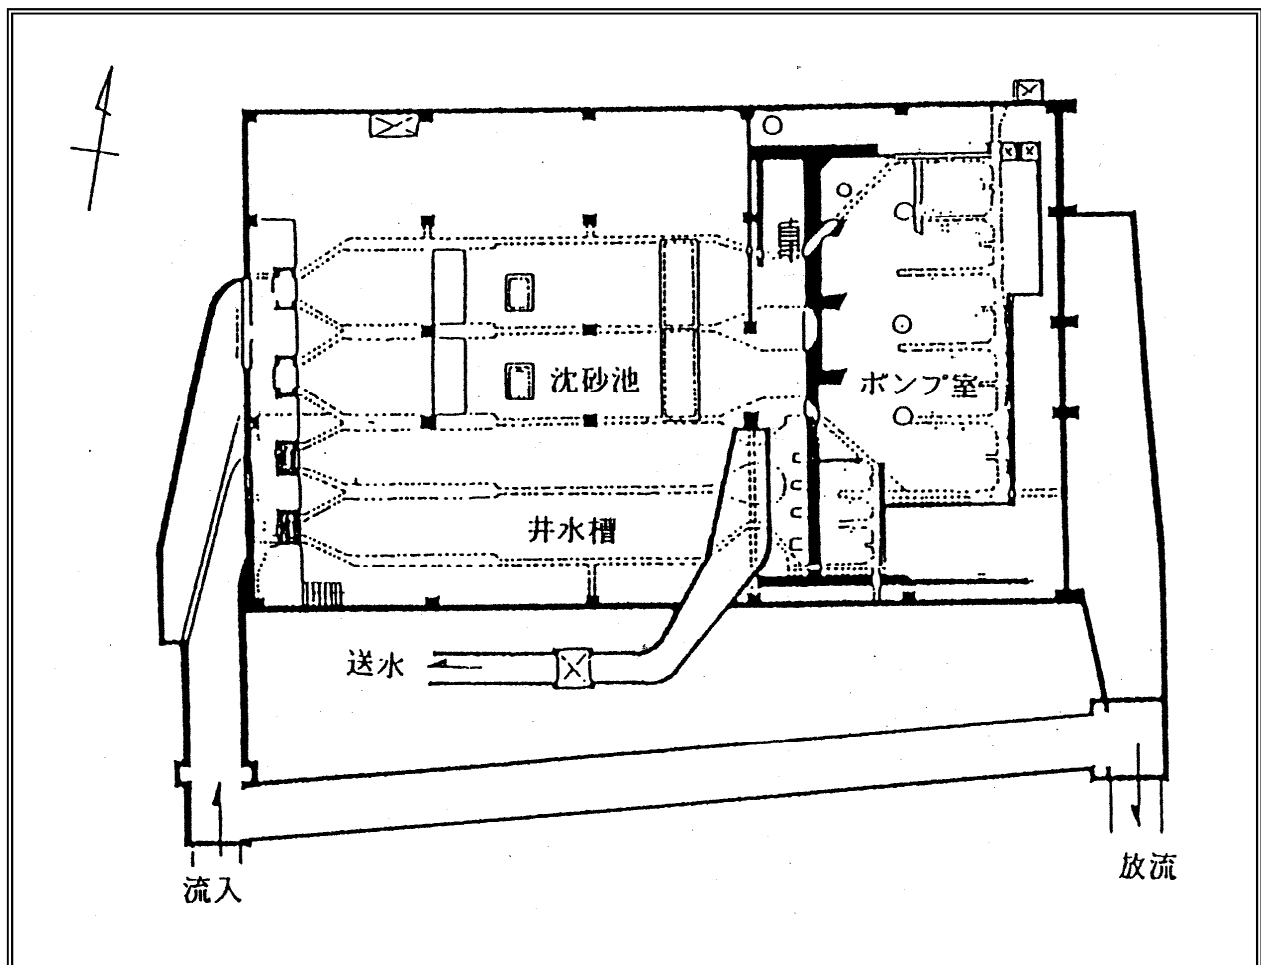

1 運 転 実 績 調

(1) 揚 水 量 等

月	降水量	総 揚 水 量		雨水放水量(雨水ポンプ)			送 水 量	
	mm/月	月量(m ³)	日量(m ³)	日数	月量(m ³)	日量(m ³)	月量(m ³)	日量(m ³)
4	107.0	91,430	3,050	3	70,100	2,340	21,330	710
5	55.0	56,130	1,810	3	51,600	1,660	4,530	150
6	28.0	8,000	270	1	5,200	170	2,800	100
7	67.5	87,630	2,830	6	81,600	2,630	6,030	200
8	99.5	120,100	3,870	7	111,100	3,580	9,000	290
9	150.5	288,590	9,620	7	280,300	9,340	8,290	280
10	42.5	4,980	160	0	0	0	4,980	160
11	156.0	203,400	6,780	3	191,900	6,400	11,500	380
12	110.5	3,830	120	1	1,600	50	2,230	70
1	183.5	1,190	40	0	0	0	1,190	40
2	92.0	44,410	1,590	2	25,500	910	18,910	680
3	54.5	1,020	30	0	0	0	1,020	30
合 計	1,146.5	910,710	—	33	818,900	—	91,810	—
平 均	95.5	75,890	2,500	3	68,240	2,240	7,650	260
最 大	11/1 69.0	—	11/1 165,080	—	—	11/1 164,300	—	2/23 14,520
最 小	—	—	—	—	—	—	—	—

月	動力別揚水量 (m ³)			沈砂・スクリーンかす量(m ³)		
	電動機の 揚水量	エンジンの 揚水量	計	沈砂	スクリーンかす	計
4	43,630	47,800	91,430	0.0	0.0	0.0
5	30,830	25,300	56,130	0.0	0.0	0.0
6	5,000	3,000	8,000	0.0	0.0	0.0
7	37,430	50,200	87,630	0.0	0.0	0.0
8	45,600	74,500	120,100	0.0	0.0	0.0
9	67,290	221,300	288,590	2.8	0.0	2.8
10	4,980	0	4,980	0.0	0.0	0.0
11	74,000	129,400	203,400	0.0	0.0	0.0
12	3,630	200	3,830	0.0	0.0	0.0
1	1,190	0	1,190	0.0	0.0	0.0
2	24,510	19,900	44,410	0.0	0.0	0.0
3	1,020	0	1,020	0.0	0.0	0.0
合 計	339,110	571,600	910,710	2.8	0.0	2.8
平 均	28,260	47,630	75,890	0.2	0.0	0.2
最 大	11/1 54,780	11/1 110,300	—	—	—	—
最 小	—	—	—	—	—	—

(2) 運 転 時 間

月	送水ポンプ運転時間(h)			雨水ポンプ運転時間(h)			
	雨水ポンプ井 排水ポンプ 1.5 m ³ /分	電動 φ 400 29 m ³ /分	計	電動 φ 700 60 m ³ /分		エンジンNo. 1 φ 1, 200 204 m ³ /分	
				実運転	試運転	実運転	試運転
4	38.4	10.7	49.1	5.1	0.0	0.0	0.5
5	20.2	1.3	21.5	6.1	0.0	0.0	0.5
6	14.3	0.8	15.1	0.5	0.0	0.0	0.5
7	30.5	1.5	32.0	7.5	0.0	0.9	0.5
8	42.1	2.5	44.6	8.5	0.0	1.0	0.5
9	33.3	2.6	35.9	14.3	0.0	6.7	0.5
10	17.7	1.9	19.6	0.0	0.0	0.0	0.5
11	21.1	4.3	25.4	15.2	0.0	2.5	0.5
12	11.4	0.6	12.0	0.4	0.0	0.0	0.5
1	5.5	0.5	6.0	0.0	0.0	0.7	0.5
2	20.1	9.4	29.5	1.3	0.0	4.6	0.5
3	8.0	0.2	8.2	0.0	0.0	0.0	0.5
合計	262.6	36.3	298.9	58.9	0.0	16.4	6.0
平均	21.9	3.0	24.9	4.9	0.0	1.4	0.5
最大	42.1	10.7	49.1	15.2	0.0	6.7	0.5
最小	5.5	0.2	6.0	0.0	0.0	0.0	0.5

月	雨水ポンプ運転時間(h)						自家発電機 運転時間(h) 625 kVA	
	エンジンNo. 2 φ 1, 200 204 m³/分		エンジンNo. 3 φ 1, 200 204 m³/分		計			
	実運転	試運転	実運転	試運転	実運転	試運転	実運転	試運転
4	5.0	0.5	0.5	0.5	10.6	1.5	0.0	0.5
5	4.9	0.5	0.0	0.5	11.0	1.5	0.0	0.5
6	0.5	0.5	0.0	0.5	1.0	1.5	0.0	0.5
7	6.1	0.5	0.0	0.5	14.5	1.5	0.3	0.5
8	7.8	0.5	1.2	0.5	18.5	1.5	0.0	0.5
9	13.4	0.5	2.9	0.5	37.3	1.5	0.0	0.5
10	0.0	0.9	0.0	0.5	0.0	1.9	0.0	0.5
11	12.1	0.0	4.0	0.5	33.8	1.0	0.0	0.5
12	0.0	0.0	0.2	0.5	0.6	1.0	0.0	0.5
1	0.0	0.0	0.4	0.5	1.1	1.0	0.0	0.5
2	0.0	0.0	0.0	0.5	5.9	1.0	0.0	0.5
3	0.0	2.1	0.0	0.5	0.0	3.1	0.0	0.5
合計	49.8	6.0	9.2	6.0	134.3	18.0	0.3	6.0
平均	4.2	0.5	0.8	0.5	11.2	1.5	0.0	0.5
最大	13.4	2.1	4.0	0.5	37.3	3.1	0.3	0.5

月	雨水ポンプ運転時間(h)						自家発電機 運転時間(h) 625 kVA	
	エンジンNo. 2 φ 1, 200 204 m ³ /分		エンジンNo. 3 φ 1, 200 204 m ³ /分		計			
	実運転	試運転	実運転	試運転	実運転	試運転	実運転	試運転
4	5.0	0.5	0.5	0.5	10.6	1.5	0.0	0.5
5	4.9	0.5	0.0	0.5	11.0	1.5	0.0	0.5
6	0.5	0.5	0.0	0.5	1.0	1.5	0.0	0.5
7	6.1	0.5	0.0	0.5	14.5	1.5	0.3	0.5
8	7.8	0.5	1.2	0.5	18.5	1.5	0.0	0.5
9	13.4	0.5	2.9	0.5	37.3	1.5	0.0	0.5
10	0.0	0.9	0.0	0.5	0.0	1.9	0.0	0.5
11	12.1	0.0	4.0	0.5	33.8	1.0	0.0	0.5
12	0.0	0.0	0.2	0.5	0.6	1.0	0.0	0.5
1	0.0	0.0	0.4	0.5	1.1	1.0	0.0	0.5
2	0.0	0.0	0.0	0.5	5.9	1.0	0.0	0.5
3	0.0	2.1	0.0	0.5	0.0	3.1	0.0	0.5
合計	49.8	6.0	9.2	6.0	134.3	18.0	0.3	6.0
平均	4.2	0.5	0.8	0.5	11.2	1.5	0.0	0.5
最大	13.4	2.1	4.0	0.5	37.3	3.1	0.3	0.5
最小	0.0	0.0	0.0	0.5	0.0	1.0	0.0	0.5

(3) 電 力 量

月	動 力							
	水 処 理							
	揚 水							
	送 水 ポ ン プ				雨 水 ポ ン プ			
	水 量 (m^3)	買 電 (kWh)	発 電 (kWh)	使用量 ／水量	水 量 (m^3)	買 電 (kWh)	発 電 (kWh)	使用量 ／水量
4	21,330	1,005	0	0.0471	22,300	683	0	0.0306
5	4,530	221	0	0.0488	26,300	651	0	0.0248
6	2,800	165	0	0.0589	2,200	73	0	0.0332
7	6,030	308	0	0.0511	31,400	781	0	0.0249
8	9,000	453	0	0.0503	36,600	933	0	0.0255
9	8,290	389	0	0.0469	59,000	1,530	0	0.0259
10	4,980	313	0	0.0629	0	0	0	—
11	11,500	408	0	0.0355	62,500	1,760	0	0.0282
12	2,230	120	0	0.0538	1,400	45	0	0.0321
1	1,190	81	0	0.0681	0	0	0	—
2	18,910	918	0	0.0485	5,600	213	0	0.0380
3	1,020	80	0	0.0784	0	0	0	—
合計	91,810	4,461	0	—	247,300	6,669	0	—
平均	7,650	372	0	0.0486	20,610	556	0	0.0270
最大	21,330	1,005	—	0.0784	62,500	1,760	—	0.0380
最小	1,020	80	—	0.0355	0	0	—	0.0248

月	水 処 理		光熱水費	合 計				
	そ の 他			買 電 (kWh)	買 電 (kWh)	発 電 (kWh)	使 用 量 (kWh)	発電量のうち 試運転分 (kWh)
	買 電 (kWh)	発 電 (kWh)						
4	7,475	0	3,970	13,133	0	13,133	0	
5	7,159	0	2,090	10,121	0	10,121	0	
6	7,288	0	2,150	9,676	0	9,676	0	
7	8,404	10	2,110	11,603	10	11,613	0	
8	8,665	0	2,110	12,161	0	12,161	0	
9	8,194	0	2,160	12,273	0	12,273	0	
10	6,945	0	2,280	9,538	0	9,538	0	
11	7,064	0	3,990	13,222	0	13,222	0	
12	8,218	0	4,540	12,923	0	12,923	0	
1	9,937	0	4,950	14,968	0	14,968	0	
2	8,406	0	4,420	13,957	0	13,957	0	
3	9,881	0	5,150	15,111	0	15,111	0	
合計	97,636	10	39,920	148,686	10	148,696	0	
平均	8,136	1	3,327	12,391	1	12,391	0	
最大	9,937	—	5,150	15,111	—	15,111	—	
最小	6,945	—	2,090	9,538	—	9,538	—	

(4) 灯油使用量・その他（用水）

月	灯 油							
	動				力			
	雨 水 ポ ン プ				自家発電機		合 計	
	水 量 (m^3)	燃料使用量(L)		使 用 量 ／ 水 量	燃料使用量(L)		使用量(L)	
		実運転	試運転		実運転	試運転	実運転	試運転
4	47,800	843	170	0.0176	0	82	843	252
5	25,300	640	180	0.0253	0	80	640	260
6	3,000	66	182	0.0220	0	86	66	268
7	50,200	1,078	175	0.0215	55	86	1,133	261
8	74,500	1,514	185	0.0203	0	86	1,514	271
9	221,300	4,102	178	0.0185	0	85	4,102	263
10	0	0	232	—	0	86	0	318
11	129,400	2,787	123	0.0215	0	90	2,787	213
12	200	25	122	0.1250	0	88	25	210
1	0	132	122	—	0	87	132	209
2	19,900	678	119	0.0341	0	85	678	204
3	0	0	339	—	0	85	0	424
合計	571,600	11,865	2,127	—	55	1,026	11,920	3,153
平均	47,630	989	177	0.0245	5	86	993	263
最大	221,300	4,102	339	0.1250	55	90	4,102	424
最小	0	0	119	0.0176	0	80	0	204

月	そ の 他	
	用 水	
	水 道 水 使 用 量 (m^3)	井 戸 水 使 用 量 (m^3)
4	0	1,211
5	0	655
6	0	74
7	0	902
8	0	1,050
9	0	1,354
10	0	419
11	0	1,323
12	0	174
1	0	86
2	0	406
3	1	132
合計	1	7,786
平均	0	649
最大	1	1,354
最小	0	74

2 決 算 状 況 調

(1) 処理区分別決算内訳

(単位 円)

項 目	管 理 費	水 処 理 費	計	比 率
職 員 数	0 人	0 人	0 人	-
給 料	0	0	0	0.0%
手 当 等	0	0	0	0.0%
法 定 福 利 費	0	0	0	0.0%
人 件 費 計	0	0	0	0.0%
被 服 費	0	0	0	0.0%
備 消 耗 品 費	0	0	0	0.0%
光 熱 水 費	0	0	0	0.0%
印 刷 製 本 費	0	0	0	0.0%
通 信 運 搬 費	0	-	0	0.0%
賃 借 料	0	0	0	0.0%
手 数 料	0	-	0	0.0%
委 託 料	0	0	0	0.0%
修 繕 費	1,188,000	8,648,357	9,836,357	60.1%
動 力 費	0	6,536,208	6,536,208	39.9%
薬 品 費	0	0	0	0.0%
損 害 保 険 料	0	0	0	0.0%
負 担 金	0	0	0	0.0%
自 動 車 重 量 税	0	0	0	0.0%
経 費 計	1,188,000	15,184,565	16,372,565	100.0%
合 計	1,188,000	15,184,565	16,372,565	100.0%
比 率	7.3%	92.7%	100.0%	-

(2) 修繕工事内訳

直 接 修 繕

場所	区分	修 繕 件 名	金額 (千円)	工 期	修 繕 内 容
		なし			
計			0		

区	A	0 件	0 千円	建物
分	B	0 件	0 千円	構築物
別	C	0 件	0 千円	機械及び装置
集	D	0 件	0 千円	車両運搬具
計	E	0 件	0 千円	工具及び備品

請 負 修 繕

場所	区分	修 繕 件 名	金額 (千円)	工 期	修 繕 内 容
沈砂池・ポンプ	C	豊平川中継ポンプ場ポンプ室天井クレーンほか修繕工事	7,552	2025/4/7 ~ 2026/3/13	天井クレーンの修繕
	C	豊平川中継ポンプ場ガスタービン点検整備業務	123,530	2025/9/17 ~ 2026/3/16	No. 2ガスタービンの修繕
その他	C	豊平川中継ポンプ場プロセスコントローラ盤修理	349	2025/8/7 ~ 2025/10/31	プロセスコントローラ盤内の基盤修理
	C	豊平川中継ポンプ場流入柵ゲート修理	253	2025/9/11 ~ 2025/12/9	リミットスイッチの部品交換
	A	豊平川中継ポンプ場ホッパー室シャッター修繕業務	1,188	2025/12/12 ~ 2026/3/27	シャッター部品の交換
計			132,872		

区	A	1 件	1,188 千円	建物
分	B	0 件	0 千円	構築物
別	C	4 件	131,684 千円	機械及び装置
集	D	0 件	0 千円	車両運搬具
計	E	0 件	0 千円	工具及び備品

