


米里中継ポンプ場

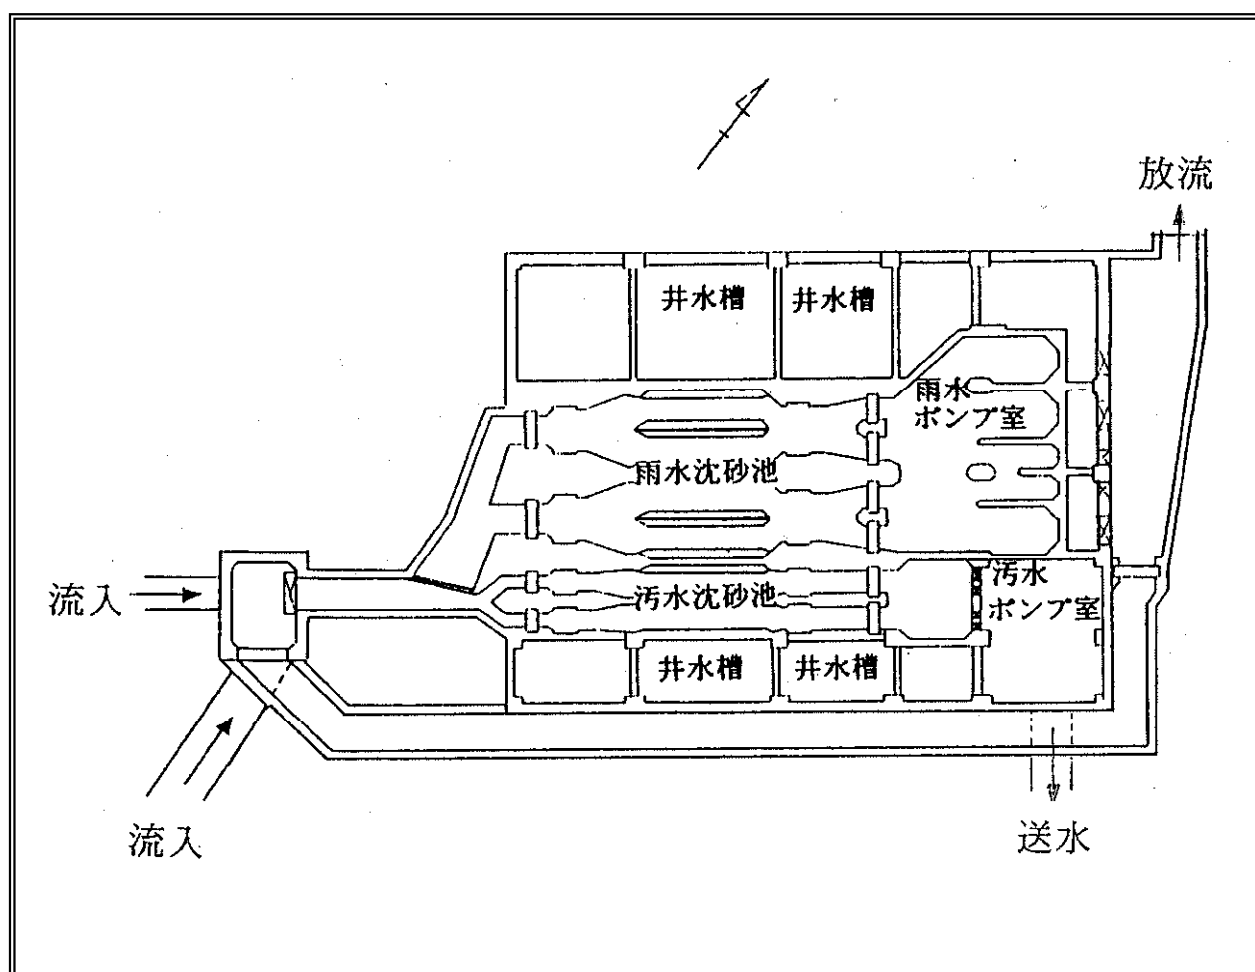

1 運 転 実 績 調

(1) 揚 水 量 等

月	降 水 量	総 揚 水 量		雨 水 放 水 量 (雨 水 ポ ン プ)			送 水 量 (汚 水 ポ ン プ)	
	mm/月	月量(m ³)	日量(m ³)	日数	月量(m ³)	日量(m ³)	月量(m ³)	日量(m ³)
4	94.5	188,940	6,300	3	8,950	300	179,990	6,000
5	50.5	104,570	3,370	1	3,700	120	100,870	3,250
6	25.0	63,970	2,130	0	0	0	63,970	2,130
7	71.0	99,300	3,200	4	14,980	480	84,320	2,720
8	93.0	110,900	3,580	3	14,830	480	96,070	3,100
9	139.0	162,110	5,400	6	53,170	1,770	108,940	3,630
10	45.0	78,130	2,520	0	0	0	78,130	2,520
11	110.5	197,750	6,590	2	30,660	1,020	167,090	5,570
12	110.5	135,280	4,360	0	0	0	135,280	4,360
1	183.5	84,420	2,720	0	0	0	84,420	2,720
2	92.0	167,920	6,000	2	3,910	140	164,010	5,860
3	54.5	245,130	7,910	0	0	0	245,130	7,910
合 計	1069.0	1,638,420	—	21	130,200	—	1,508,220	—
平 均	89.1	136,540	4,490	2	10,850	360	125,690	4,130
最大	11/1 54.5	—	11/1 50,850	—	—	11/1 28,190	—	2/23 28,590
最小	—	—	7/13 1,460	—	—	—	—	7/13 1,460

月	晴天時汚水量		動力別揚水量 (m ³)			沈砂・スクリーンかす量(m ³)		
	月量(m ³)	日量(m ³)	電動機の 揚水量	エンジンの 揚水量	計	沈砂	スクリーンかす	計
4	67,200	2,240	188,940	0	188,940	5.0	2.0	7.0
5	69,440	2,240	104,570	0	104,570	0.0	0.0	0.0
6	55,800	1,860	63,970	0	63,970	0.0	0.0	0.0
7	52,080	1,680	95,110	4,190	99,300	0.0	0.0	0.0
8	58,280	1,880	103,870	7,030	110,900	0.0	0.0	0.0
9	58,200	1,940	137,370	24,740	162,110	4.7	1.3	6.0
10	60,450	1,950	78,130	0	78,130	0.0	0.0	0.0
11	76,800	2,560	189,660	8,090	197,750	0.0	0.0	0.0
12	76,570	2,470	135,280	0	135,280	3.0	0.0	3.0
1	73,780	2,380	84,420	0	84,420	0.0	0.0	0.0
2	66,640	2,380	167,920	0	167,920	0.0	0.0	0.0
3	73,780	2,380	245,130	0	245,130	0.0	0.0	0.0
合 計	789,020	—	1,594,370	44,050	1,638,420	12.7	3.3	16.0
平 均	65,750	2,160	132,860	3,670	136,540	1.1	0.3	1.3
最大	—	11/16 2,870	11/1 42,764	9/20 14,200	—	—	—	—
最小	—	7/13 1,460	—	—	—	—	—	—

(2) 運 転 時 間

月	汚水ポンプ運転時間(h)				
	I-No. 1 ϕ 200	I-No. 2 ϕ 200	II-No. 1 ϕ 350	II-No. 2 ϕ 350	計
	4.2 m ³ /分	4.2 m ³ /分	17 m ³ /分	17 m ³ /分	
4	526.8	89.6	37.7	0.0	654.1
5	36.8	345.4	0.0	12.5	394.7
6	252.3	19.9	1.8	0.0	274.0
7	32.4	272.5	0.0	17.1	322.0
8	314.6	40.0	18.1	0.1	372.8
9	54.5	332.2	0.0	24.2	410.9
10	293.0	30.4	4.7	0.0	328.1
11	150.9	433.3	15.4	16.8	616.4
12	448.8	60.8	19.3	0.0	528.9
1	56.7	291.3	0.0	0.9	348.9
2	400.7	115.8	39.8	0.0	556.3
3	237.9	675.0	0.2	19.0	932.1
合計	2,805.4	2,706.2	137.0	90.6	5,739.2
平均	233.8	225.5	11.4	7.6	478.3
最大	526.8	675.0	39.8	24.2	932.1
最小	32.4	19.9	0.0	0.0	274.0

月	雨水ポンプ運転時間(h)								自家発電機 運転時間(h)	
	電動 φ500		No.1 φ1,000		No.2 φ1,000		計			
	36 m³/分		140 m³/分		140 m³/分				500 kVA	
	実運転	試運転	実運転	試運転	実運転	試運転	実運転	試運転	実運転	試運転
4	3.6	0.0	0.0	0.5	0.0	0.5	3.6	1.0	0.0	0.5
5	1.6	0.0	0.0	0.5	0.0	0.5	1.6	1.0	0.0	0.5
6	0.0	0.0	0.0	0.5	0.0	0.5	0.0	1.0	0.0	0.5
7	4.3	0.0	1.7	0.5	0.0	0.5	6.0	1.0	0.0	0.5
8	3.2	0.0	0.0	0.5	1.5	0.5	4.7	1.0	0.0	0.6
9	10.9	0.0	6.7	0.5	0.0	0.5	17.6	1.0	0.0	0.5
10	0.0	0.0	0.0	0.5	0.0	0.5	0.0	1.0	0.0	0.5
11	9.1	0.0	0.0	0.5	3.0	0.5	12.1	1.0	0.0	0.5
12	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5
1	0.0	0.0	0.0	0.5	0.0	0.6	0.0	1.1	0.0	0.7
2	1.7	0.0	0.0	0.5	0.0	0.5	1.7	1.0	0.0	0.6
3	0.0	0.0	0.0	0.5	0.0	0.5	0.0	1.0	0.0	0.5
合計	34.4	0.0	8.4	5.5	4.5	5.6	47.3	11.1	0.0	6.4
平均	2.9	0.0	0.7	0.5	0.4	0.5	3.9	0.9	0.0	0.5
最大	10.9	0.0	6.7	0.5	3.0	0.6	17.6	1.1	0.0	0.7
最小	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5

(3) 電力使用量

月	動力							
	水処理							
	揚水							
	汚水ポンプ				雨水ポンプ			
	水量 (m ³)	買電 (kWh)	発電 (kWh)	使用量 ／水量	水量 (m ³)	買電 (kWh)	発電 (kWh)	使用量 ／水量
4	179,990	11,308	0	0.0628	8,950	305	0	0.0341
5	100,870	6,413	0	0.0636	3,700	135	0	0.0365
6	63,970	4,188	0	0.0655	0	0	0	—
7	84,320	5,507	0	0.0653	10,790	360	0	0.0334
8	96,070	6,312	0	0.0657	7,800	275	0	0.0353
9	108,940	7,127	0	0.0654	28,430	930	0	0.0327
10	78,130	1,529	0	0.0196	0	0	0	—
11	167,090	10,525	0	0.0630	22,570	779	0	0.0345
12	135,280	8,704	0	0.0643	0	0	0	—
1	84,420	5,266	0	0.0624	0	0	0	—
2	164,010	9,938	0	0.0606	3,910	147	0	0.0376
3	245,130	14,735	0	0.0601	0	0	0	—
合計	1,508,220	91,552	0	—	86,150	2,931	0	—
平均	125,690	7,629	0	0.0607	7,180	244	0	0.0340
最大	245,130	14,735	—	0.0657	28,430	930	—	0.0376
最小	63,970	1,529	—	0.0196	0	0	—	0.0327

月	動 力		光熱水費	電 力 量 合 計				
	水 処 理			買 電 (kWh)	買 電 (kWh)	発 電 (kWh)	使 用 量 (kWh)	発電量のうち 試運転分 (kWh)
	そ の 他							
	買 電 (kWh)	発 電 (kWh)	買 電 (kWh)	買 電 (kWh)	発 電 (kWh)	使 用 量 (kWh)	発電量のうち 試運転分 (kWh)	
4	4,275	0	1,933	17,821	0	17,821	0	
5	4,493	0	1,392	12,433	0	12,433	0	
6	5,658	0	1,484	11,330	0	11,330	0	
7	7,115	0	1,521	14,503	0	14,503	0	
8	5,919	0	1,508	14,014	0	14,014	0	
9	4,580	0	1,572	14,209	0	14,209	0	
10	9,248	0	2,026	12,803	0	12,803	0	
11	6,044	0	1,875	19,223	0	19,223	0	
12	7,249	0	4,706	20,659	0	20,659	0	
1	8,033	3	6,980	20,279	3	20,282	0	
2	6,433	0	6,104	22,622	0	22,622	0	
3	5,432	0	5,215	25,382	0	25,382	0	
合計	74,479	3	36,316	205,278	3	205,281	0	
平均	6,207	0	3,026	17,107	0	17,107	0	
最大	9,248	—	6,980	25,382	—	25,382	—	
最小	4,275	—	1,392	11,330	—	11,330	—	

(4) 重油使用量・その他

月	重油							
	動力						合計	
	汚水・雨水ポンプ				自家発電機			
	水 量 (m^3)	燃料使用量(L)		使用量 ／水量	燃料使用量(L)		重油使用量(L)	
		実運転	試運転		実運転	試運転	実運転	試運転
4	0	0	46	－	0	71	0	117
5	0	0	51	－	0	75	0	126
6	0	0	53	－	0	64	0	117
7	4,190	114	44	0.0272	0	69	114	113
8	7,030	105	36	0.0149	0	87	105	123
9	24,740	466	20	0.0188	0	69	466	89
10	0	0	21	－	0	73	0	94
11	8,090	238	44	0.0294	0	71	238	115
12	0	0	0	－	0	75	0	75
1	0	0	32	－	0	100	0	132
2	0	0	51	－	0	96	0	147
3	0	0	49	－	0	72	0	121
合計	44,050	923	447	－	0	922	923	1,369
平均	3,670	77	37	0.0210	0	77	77	114
最大	24,740	466	53	0.0294	0	100	466	147
最小	0	0	0	0.0149	0	64	0	75

月	そ の 他		
	油 類	用 水	
	白 灯 油	水 道 水	井 戸 水
	使用量 (L)	使用量 (m ³)	使用量 (m ³)
4	2	0	1,027
5	0	0	710
6	0	0	693
7	0	0	798
8	0	0	897
9	0	0	1,027
10	1	0	673
11	1	0	1,036
12	1	0	847
1	30	0	366
2	23	0	668
3	14	0	1,194
合計	72	0	9,936
平均	6	0	828
最大	30	0	1,194
最小	0	0	366

2 決 算 状 況 調

(1) 処理区分別決算内訳

(単位 円)

項 目	管 理 費	水 処 理 費	計	比 率
職 員 数	0 人	0 人	0 人	-
給 料	0	0	0	0.0%
手 当 等	0	0	0	0.0%
法 定 福 利 費	0	0	0	0.0%
人 件 費 計	0	0	0	0.0%
被 服 費	0	0	0	0.0%
備 消 耗 品 費	0	0	0	0.0%
光 熱 水 費	0	0	0	0.0%
印 刷 製 本 費	0	0	0	0.0%
通 信 運 搬 費	0	-	0	0.0%
賃 借 料	0	0	0	0.0%
手 数 料	0	-	0	0.0%
委 託 料	0	0	0	0.0%
修 繕 費	108,680	31,660,200	31,768,880	82.9%
動 力 費	0	6,538,911	6,538,911	17.1%
薬 品 費	0	0	0	0.0%
損 害 保 険 料	0	0	0	0.0%
負 担 金	0	0	0	0.0%
自 動 車 重 量 税	0	0	0	0.0%
経 費 計	108,680	38,199,111	38,307,791	100.0%
合 計	108,680	38,199,111	38,307,791	100.0%
比 率	0.3%	99.7%	100.0%	-

(2) 修繕工事内訳

直 接 修 繕

場所	区分	修 繕 件 名	金額 (千円)	工 期	修 繕 内 容
沈砂 ポンプ 池・	C	雑排水ピット曝気用空気配管修繕	53	2025/8/14	空気配管修繕
そ の 他	C	暖房パネル修繕	95	2026/1/19	暖房パネル交換
計			148		

区 分 別 集 計	A	0 件	0 千円	建物
	B	0 件	0 千円	構築物
	C	2 件	148 千円	機械及び装置
	D	0 件	0 千円	車両運搬具
	E	0 件	0 千円	工具及び備品

請 負 修 繕

場所	区分	修 繕 件 名	金額 (千円)	工 期	修 繕 内 容
沈砂 ポンプ 池・	C	米里中継ポンプ場雨水ポンプ井排水配管修繕業務	2,684	2026/1/30 ~ 2026/3/30	排水配管の修繕
	C	米里中継ポンプ場沈砂搬出コンベヤほか修繕工事	25,723	2025/8/4 ~ 2026/3/19	沈砂搬出コンベヤ修繕
そ の 他	C	米里中継ポンプ場No.2エンジン修理	253	2025/9/11 ~ 2025/12/10	予備空気槽逆止弁の交換
計			28,660		

区 分 別 集 計	A	0 件	0 千円	建物
	B	0 件	0 千円	構築物
	C	3 件	28,660 千円	機械及び装置
	D	0 件	0 千円	車両運搬具
	E	0 件	0 千円	工具及び備品
