


月寒川雨水ポンプ場

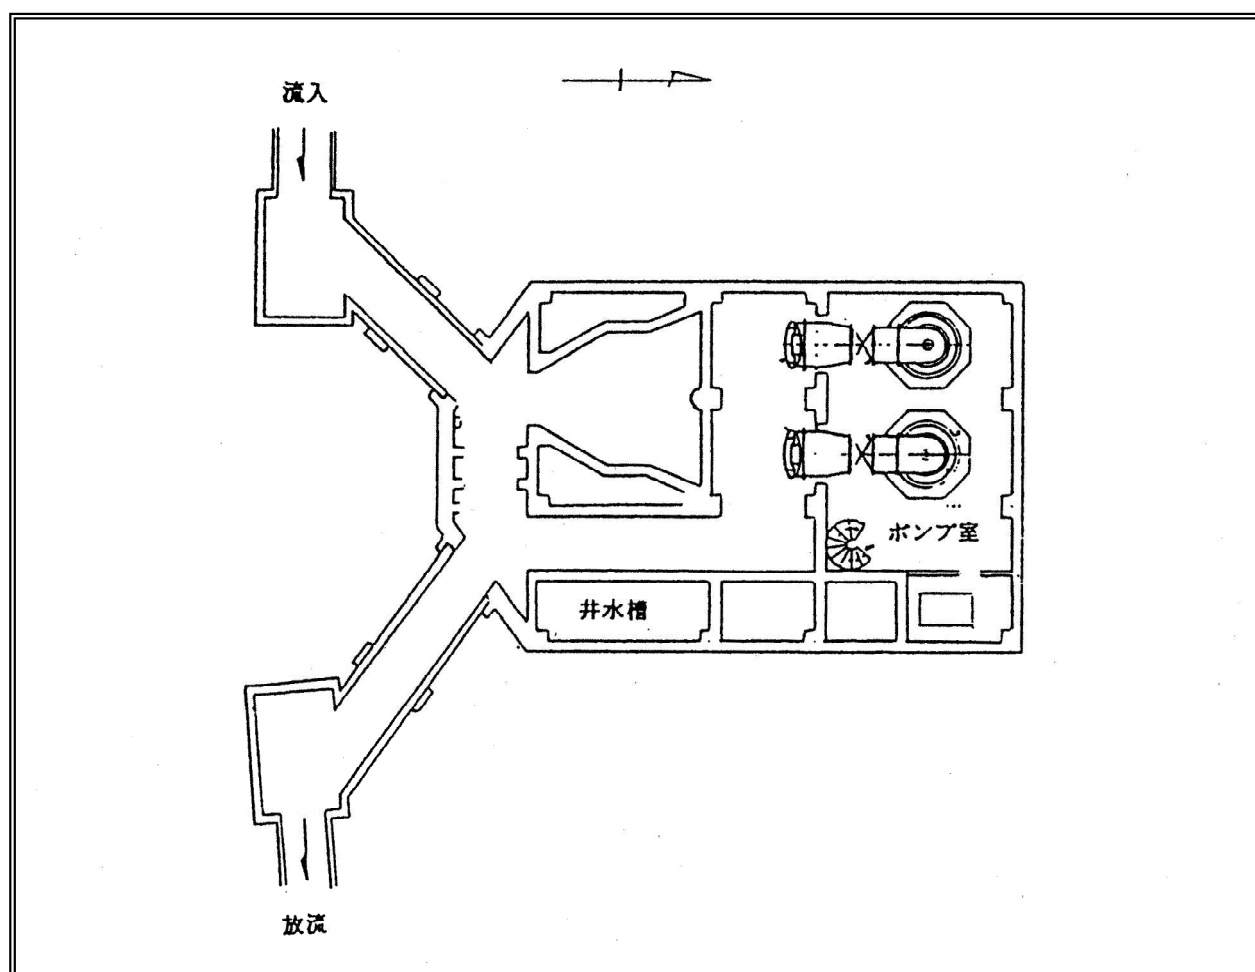

1 運 転 実 績 調

(1) 揚 水 量 等

月	降水量 mm/月	雨水放水量(雨水ポンプ)			沈砂・スクリーンかす量 (m ³)	
		日数	月量(m ³)	日量(m ³)	沈砂	スクリーンかす
4	107.0	1	570	20		0.0
5	55.0	0	0	0		0.0
6	28.0	0	0	0		0.0
7	67.5	1	540	20		0.0
8	99.5	1	3,290	110		0.0
9	150.5	4	5,650	190		0.0
10	42.5	0	0	0		0.0
11	156.0	1	600	20		0.0
12	110.5	0	0	0		0.0
1	183.5	0	0	0		0.0
2	92.0	0	0	0		0.0
3	54.5	0	0	0		0.0
合計	1,146.5	8	10,650	—	—	0.0
平均	95.5	1	890	30	—	0.0
最大	11/1 69.0	—	—	8/7 3,290	—	—
最小	—	—	—	—	—	—

(2) 運 転 時 間

月	雨水ポンプ運転時間(h)						自家発電機 運転時間(h)	
	No.1 φ1,350 230 m ³ /分		No.2 φ1,350 230 m ³ /分		計		100 kVA	
	実運転	試運転	実運転	試運転	実運転	試運転	実運転	試運転
4	0.0	0.5	0.2	0.5	0.2	1.0	0.0	0.0
5	0.0	0.5	0.0	0.5	0.0	1.0	0.0	0.0
6	0.0	0.5	0.0	0.5	0.0	1.0	0.0	0.2
7	0.2	0.5	0.0	0.5	0.2	1.0	0.0	0.0
8	0.0	0.5	0.5	0.5	0.5	1.0	0.0	0.0
9	3.5	0.5	0.0	0.5	3.5	1.0	0.0	0.0
10	0.0	0.7	0.0	0.5	0.0	1.2	0.0	0.0
11	0.0	0.5	0.2	0.5	0.2	1.0	0.0	0.0
12	0.0	0.5	0.0	0.5	0.0	1.0	0.0	0.0
1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
3	0.0	0.5	0.0	0.5	0.0	1.0	0.0	0.5
合計	3.7	5.2	0.9	5.0	4.6	10.2	0.0	0.7
平均	0.3	0.4	0.1	0.4	0.4	0.9	0.0	0.1
最大	3.5	0.7	0.5	0.5	3.5	1.2	0.0	0.5
最小	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

(3) 電力使用量

月	動 力									
	水 処 理					光熱水	合 計			
	揚 水 量			そ の 他						
	雨 水 ポ ン プ			(200 V)	(200 V)					
	水 量 (m ³)	買 電 (kWh)	発 電 量 (kWh)	買 電 (kWh)	発 電 (kWh)	買 電 (kWh)	買 電 (kWh)	発 電 (kWh)	使用量 (kWh)	発電量のうち 試運転(kWh)
4				1,950	0	85	2,035	0	2,035	0
5				1,789	0	78	1,867	0	1,867	0
6				1,117	0	62	1,179	0	1,179	0
7				981	0	56	1,037	0	1,037	0
8				1,056	0	105	1,161	0	1,161	0
9				927	0	88	1,015	0	1,015	0
10				974	0	51	1,025	0	1,025	0
11				1,565	0	73	1,638	0	1,638	0
12				1,661	0	66	1,727	0	1,727	0
1				2,166	0	86	2,252	0	2,252	0
2				1,516	0	55	1,571	0	1,571	0
3				1,546	1	63	1,609	1	1,610	0
合計				17,248	1	868	18,116	1	18,117	0
平均				1,437	0	72	1,510	0	1,510	0
最大				2,166	1	105	2,252	—	2,252	—
最小				927	0	51	1,015	—	1,015	—

(4) 重油使用量・その他（用水）

月	重 油								その他	
	動 力						合 計		用 水	
	雨水エンジンポンプ				自家発電機		実運転 (L)	試運転 (L)	水道水 (m ³)	井 水 (m ³)
	水 量 (m ³)	実運転 (L)	試運転 (L)	使用量 ／ 水量	実運転 (L)	試運転 (L)				
4	570	7	27	0.0123	0	0	7	27	5	18
5	0	0	27	—	0	0	0	27	0	14
6	0	0	27	—	0	1	0	28	0	8
7	540	8	25	0.0148	0	0	8	25	1	15
8	3,290	16	26	0.0049	0	0	16	26	0	14
9	5,650	111	25	0.0196	0	0	111	25	0	26
10	0	0	33	—	0	0	0	33	0	9
11	600	7	28	0.0117	0	0	7	28	1	8
12	0	0	29	—	0	0	0	29	0	14
1	0	0	0	—	0	0	0	0	0	0
2	0	0	0	—	0	0	0	0	0	0
3	0	0	26	—	0	9	0	35	0	24
合計	10,650	149	273	—	0	10	149	283	7	150
平均	890	12	23	0.0140	0	1	12	24	1	13
最大	5,650	111	33	0.0196	0	—	111	35	5	26
最小	0	0	0	0.0049	0	—	0	0	0	0

2 決 算 状 況 調

(1) 処理区分別決算内訳

(単位 円)

項 目	管 理 費	水 処 理 費	計	比 率
職 員 数	0 人	0 人	0 人	-
給 料	0	0	0	0.0%
手 当 等	0	0	0	0.0%
法 定 福 利 費	0	0	0	0.0%
人 件 費 計	0	0	0	0.0%
被 服 費	0	0	0	0.0%
備 消 耗 品 費	0	0	0	0.0%
光 熱 水 費	0	0	0	0.0%
印 刷 製 本 費	0	0	0	0.0%
通 信 運 搬 費	0	-	0	0.0%
賃 借 料	0	0	0	0.0%
手 数 料	0	-	0	0.0%
委 託 料	0	0	0	0.0%
修 繕 費	0	1,584,880	1,584,880	61.6%
動 力 費	0	989,461	989,461	38.4%
薬 品 費	0	0	0	0.0%
損 害 保 険 料	0	0	0	0.0%
負 担 金	0	0	0	0.0%
自 動 車 重 量 税	0	0	0	0.0%
経 費 計	0	2,574,341	2,574,341	100.0%
合 計	0	2,574,341	2,574,341	100.0%
比 率	0.0%	100.0%	100.0%	-

(2) 修繕工事内訳

直 接 修 繕

場所	区分	修 繕 件 名	金額 (千円)	工 期	修 繕 内 容
		なし			
計			0		

区 分 別 集 計	A	0 件	0 千円	建物
	B	0 件	0 千円	構築物
	C	0 件	0 千円	機械及び装置
	D	0 件	0 千円	車両運搬具
	E	0 件	0 千円	工具及び備品

請 負 修 繕

場所	区分	修 繕 件 名	金額 (千円)	工 期	修 繕 内 容
沈砂池・ ポンプ	C	月寒川雨水ポンプ場No.1エンジン 修理	770	2025/ 5/19 ~ 2025/ 7/31	始動弁の交換
計			770		

区 分 別 集 計	A	0 件	0 千円	建物
	B	0 件	0 千円	構築物
	C	1 件	770 千円	機械及び装置
	D	0 件	0 千円	車両運搬具
	E	0 件	0 千円	工具及び備品
