


川北中継ポンプ場

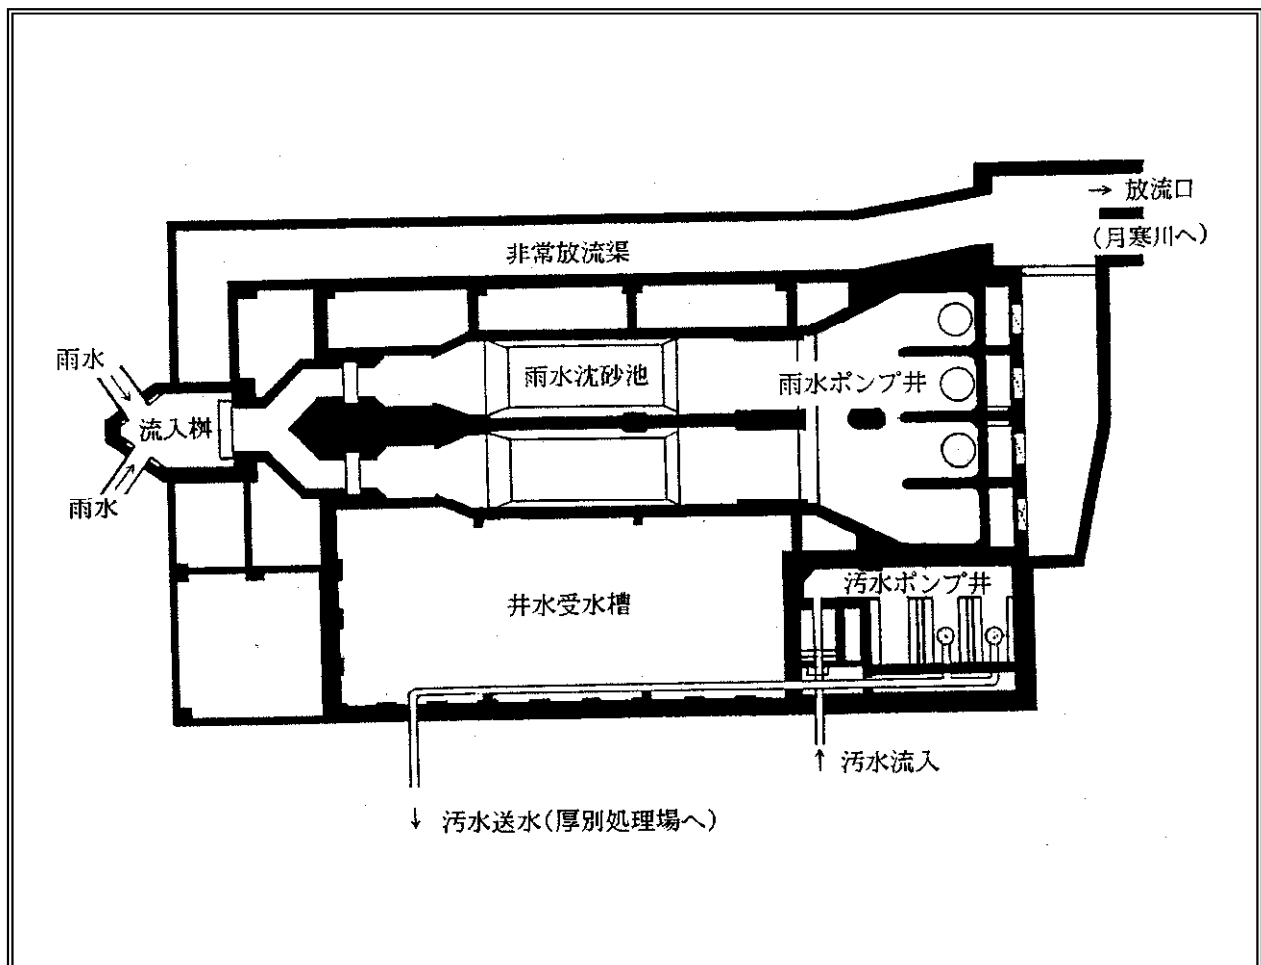

1 運 転 実 績 調

(1) 揚 水 量 等

月	降水量 (mm/月)	総揚水量 (m ³)		雨 水 放 流 量 (m ³)							
		月 量	日 量	雨 水 ポ ン プ			雨水ポンプ井排水ポンプ			計	
				日数	月 量	日 量	日数	月 量	日量	月 量	日 量
4	97.5	174,600	5,820	6	38,560	1,290	0	0	0	38,560	1,290
5	48.5	115,030	3,710	2	17,390	560	0	0	0	17,390	560
6	24.0	74,450	2,480	1	1,630	50	0	0	0	1,630	50
7	65.0	98,690	3,180	4	21,360	690	0	0	0	21,360	690
8	89.0	126,870	4,090	6	41,110	1,330	0	0	0	41,110	1,330
9	133.5	181,710	6,060	7	80,390	2,680	0	0	0	80,390	2,680
10	33.5	80,600	2,600	0	0	0	0	0	0	0	0
11	119.0	195,750	6,530	5	57,290	1,910	0	0	0	57,290	1,910
12	105.5	130,680	4,220	2	15,680	510	0	0	0	15,680	510
1	183.5	91,140	2,940	1	1,050	30	0	0	0	1,050	30
2	93.0	152,930	5,460	4	41,500	1,480	0	0	0	41,500	1,480
3	54.5	210,460	6,790	5	15,520	500	0	0	0	15,520	500
合計	1,046.5	1,632,910	—	43	331,480	—	0	0	—	331,480	—
平均	87.2	136,080	4,470	4	27,620	910	0	0	0	27,620	910
最大	11/1 61.5	—	11/1 51,150	7	—	11/1 43,380	—	—	—	—	11/1 43,380
最小	—	—	7/11 1,780	0	—	—	—	—	—	—	0

月	送 水 量 (m³)						晴天日汚水量 (m³)		電動機によ る揚水量 (m³)	沈砂・スクリーンかす量		
	汚水系送水量		雨水系送水量		計					(m³)		
	月 量	日 量	月 量	日 量	月 量	日 量	月 量	日量		沈砂	スクリー ンかす	計
4	66,180	2,200	69,860	2,330	136,040	4,530	54,300	1,810	174,600	0.0	0.0	0.0
5	54,090	1,750	43,550	1,400	97,640	3,150	46,190	1,490	115,030	0.0	0.0	0.0
6	44,420	1,480	28,400	950	72,820	2,430	42,300	1,410	74,450	0.0	0.0	0.0
7	48,910	1,570	28,420	920	77,330	2,490	43,090	1,390	98,690	0.0	0.0	0.0
8	52,790	1,700	32,970	1,060	85,760	2,760	44,330	1,430	126,870	0.0	0.0	0.0
9	60,100	2,010	41,220	1,370	101,320	3,380	42,900	1,430	181,710	5.0	0.0	5.0
10	48,490	1,560	32,110	1,040	80,600	2,600	45,570	1,470	80,600	0.0	0.0	0.0
11	71,930	2,400	66,530	2,220	138,460	4,620	49,500	1,650	195,750	0.0	0.0	0.0
12	58,740	1,900	56,260	1,810	115,000	3,710	47,690	1,540	130,680	0.0	0.0	0.0
1	48,290	1,560	41,800	1,350	90,090	2,910	45,880	1,480	91,140	0.0	0.0	0.0
2	56,670	2,020	54,760	1,960	111,430	3,980	41,440	1,480	152,930	0.0	0.0	0.0
3	80,110	2,590	114,830	3,700	194,940	6,290	45,880	1,480	210,460	0.0	0.0	0.0
合計	690,720	—	610,710	—	1,301,430	—	549,070	—	1,632,910	5.0	0.0	5.0
平均	57,570	1,890	50,890	1,670	108,460	3,560	45,760	1,500	136,080	0.4	0.0	0.4
最大	—	2/23 6,520	—	2/24 4,610	—	9/21 8,880	—	11/16 1,980	—	—	—	—
最小	—	10/23 1,280	—	—	—	7/11 1,780	—	6/21 1,300	—	—	—	—

(2) 運 転 時 間

月	汚水ポンプ運転時間 (h)			雨 水 ポ ン プ 運 転 時 間 (h)			
	No. 1	No. 2	計	No. 1	No. 2	No. 3	計
				実運転＋試運転	実運転＋試運転	実運転＋試運転	実運転＋試運転
4	66.1	474.1	540.2	4.8	0.0	0.0	4.8
5	271.3	3.2	274.5	2.2	0.0	0.0	2.2
6	15.8	273.1	288.9	0.2	0.0	0.0	0.2
7	212.5	3.8	216.3	2.5	0.0	0.0	2.5
8	172.6	153.0	325.6	3.7	1.0	0.4	5.1
9	281.6	0.0	281.6	8.5	2.4	0.0	10.9
10	226.6	0.0	226.6	0.0	0.1	0.0	0.1
11	388.5	0.0	388.5	7.0	0.0	0.0	7.0
12	325.0	0.0	325.0	2.0	0.0	0.0	2.0
1	258.5	0.0	258.5	0.1	0.6	0.0	0.7
2	317.3	0.0	317.3	5.2	0.0	0.0	5.2
3	567.9	0.0	567.9	2.0	0.0	0.0	2.0
合計	3,103.7	907.2	4,010.9	38.2	4.1	0.4	42.7
平均	258.6	75.6	334.2	3.2	0.3	0.0	3.6
最大	567.9	474.1	567.9	8.5	2.4	0.4	10.9
最小	15.8	0.0	216.3	0.0	0.0	0.0	0.1

月	雨水ポンプ井排水ポンプ運転時間 (h)						自家発電運転時間(h)	
	送 水		放 流		計		1,250 kVA	
	実運転	試運転	実運転	試運転	実運転	試運転	実運転	試運転
4	363.7	—	0.0	—	363.7	—	0.0	0.3
5	226.6	—	0.0	—	226.6	—	0.0	0.2
6	148.0	—	0.0	—	148.0	—	0.0	0.2
7	147.9	—	0.0	—	147.9	—	0.0	0.2
8	171.9	—	0.0	—	171.9	—	1.4	0.3
9	214.7	—	0.0	—	214.7	—	2.6	0.2
10	167.2	—	0.0	—	167.2	—	0.0	0.2
11	346.5	—	0.0	—	346.5	—	0.0	0.3
12	292.9	—	0.0	—	292.9	—	0.0	0.2
1	217.6	—	0.0	—	217.6	—	0.0	0.5
2	285.1	—	0.0	—	285.1	—	0.0	0.2
3	597.9	—	0.0	—	597.9	—	0.0	0.3
合計	3,180.0	—	0.0	—	3,180.0	—	4.0	3.1
平均	265.0	—	0.0	—	265.0	—	0.3	0.3
最大	597.9	—	—	—	597.9	—	2.6	0.5
最小	147.9	—	—	—	147.9	—	0.0	0.2

(3) 電力使用量等

月	電 力 量											
	動 力											
	汚 水 揚 水			雨 水 揚 水				その他		合 計		
	汚水ポンプ			雨水ポンプ								
	揚水量 (m ³)	買電 (kWh)	使用量 /揚水量	揚水量 (m ³)	買電 (kWh)	発電 (kWh)	電力使用量 /揚水量	買電 (kWh)	発電 (kWh)	買電 (kWh)	発電 (kWh)	使用量 (kWh)
4	136,040	17,808	0.1309	38,560	1,550	0	0.0402	9,854	0	29,212	0	29,212
5	97,640	12,781	0.1309	17,390	690	0	0.0397	6,936	0	20,407	0	20,407
6	72,820	9,532	0.1309	1,630	60	0	0.0368	6,888	0	16,480	0	16,480
7	77,330	10,122	0.1309	21,360	810	0	0.0379	6,244	0	17,176	0	17,176
8	85,760	11,226	0.1309	41,110	1,170	360	0.0372	7,877	0	20,273	360	20,633
9	101,320	13,263	0.1309	80,390	2,900	450	0.0417	6,343	0	22,506	450	22,956
10	80,600	10,551	0.1309	0	20	0	—	6,092	0	16,663	0	16,663
11	138,460	18,124	0.1309	57,290	2,260	0	0.0394	7,771	0	28,155	0	28,155
12	115,000	15,054	0.1309	15,680	630	0	0.0402	7,784	0	23,468	0	23,468
1	90,090	11,793	0.1309	1,050	90	0	0.0857	7,799	0	19,682	0	19,682
2	111,430	14,586	0.1309	41,500	1,680	0	0.0405	7,990	0	24,256	0	24,256
3	194,940	25,518	0.1309	15,520	660	0	0.0425	11,409	0	37,587	0	37,587
合計	1,301,430	170,358	—	331,480	12,520	810	—	92,987	0	275,865	810	276,675
平均	108,460	14,197	0.1309	27,620	1,043	68	0.0402	7,749	0	22,989	68	23,056
最大	194,940	25,518	0.1309	80,390	2,900	450	0.0857	11,409	—	37,587	450	37,587
最小	72,820	9,532	0.1309	0	20	0	0.0368	6,092	—	16,480	0	16,480

月	電 力 量						重油		その他		
	光 熱	電 力 収 支				動力	合計		水道水 (m ³)	井 水 (m ³)	
	買電 (kWh)	買電 (kWh)	発電 (kWh)	試運転内数 (kWh)	使用量 (kWh)	自家発電機 燃料使用量	実運転 (L)	試運転 (L)			
4	2,564	31,776	0	0	31,776	0	12	12	0	617	
5	2,600	23,007	0	0	23,007	0	10	10	0	374	
6	2,549	19,029	0	0	19,029	0	10	10	0	123	
7	2,596	19,772	0	0	19,772	0	10	10	0	452	
8	2,616	22,889	360	0	23,249	123	10	133	0	377	
9	2,610	25,116	450	0	25,566	178	10	188	0	781	
10	2,175	18,838	0	0	18,838	0	9	9	0	103	
11	1,923	30,078	0	0	30,078	0	10	10	0	815	
12	2,649	26,117	0	0	26,117	0	10	10	0	335	
1	3,497	23,179	0	0	23,179	0	23	23	0	118	
2	2,949	27,205	0	0	27,205	0	10	10	0	718	
3	3,295	40,882	0	0	40,882	0	10	10	0	494	
合計	32,023	307,888	810	0	308,698	301	134	435	0	5,307	
平均	2,669	25,657	68	0	25,725	25	11	36	0	442	
最大	3,497	40,882	450	—	40,882	178	23	188	0	815	
最小	1,923	18,838	0	—	18,838	0	9	9	0	103	

2 決 算 状 況 調

(1) 処理区分別決算内訳

(単位 円)

項 目	管 理 費	水 処 理 費	計	比 率
職 員 数	0 人	0 人	0 人	-
給 料	0	0	0	0.0%
手 当 等	0	0	0	0.0%
法 定 福 利 費	0	0	0	0.0%
人 件 費 計	0	0	0	0.0%
被 服 費	0	0	0	0.0%
備 消 耗 品 費	0	0	0	0.0%
光 熱 水 費	0	0	0	0.0%
印 刷 製 本 費	0	0	0	0.0%
通 信 運 搬 費	0	-	0	0.0%
賃 借 料	0	0	0	0.0%
手 数 料	0	-	0	0.0%
委 託 料	0	0	0	0.0%
修 繕 費	0	47,553,770	47,553,770	81.3%
動 力 費	0	10,915,538	10,915,538	18.7%
薬 品 費	0	0	0	0.0%
損 害 保 険 料	0	0	0	0.0%
負 担 金	0	0	0	0.0%
自 動 車 重 量 税	0	0	0	0.0%
経 費 計	0	58,469,308	58,469,308	100.0%
合 計	0	58,469,308	58,469,308	100.0%
比 率	0.0%	100.0%	100.0%	-

(2) 修繕工事内訳

直 接 修 繕

場所	区分	修 繕 件 名	金額 (千円)	工 期	修 繕 内 容
		なし			
計			0		

区 分 別 集 計	A	0 件	0 千円	建物
	B	0 件	0 千円	構築物
	C	0 件	0 千円	機械及び装置
	D	0 件	0 千円	車両運搬具
	E	0 件	0 千円	工具及び備品

請 負 修 繕

(市発注分)

場所	区分	修 繕 件 名	金額 (千円)	工 期			修 繕 内 容
ポン プ 室	C	新川水再生プラザ第1処理施設 No.5ブロワ用電動機ほか修繕工事	47,554	2025 7/22	～	2026 3/17	No.2雨水電動ポンプ用 電動機修繕
	C	川北中継ポンプ場 No.2汚水ポンプ修繕工事	14,300	2026 1/5	～	2026 10/30	No.2汚水ポンプの修繕
計			61,854				

区 分 別 集 計	A	0 件	0 千円	建物	
	B	0 件	0 千円	構築物	
	C	2 件	61,854 千円	機械及び装置	
	D	0 件	0 千円	車両運搬具	
	E	0 件	0 千円	工具及び備品	

(公社発注分)

場所	区分	修 繕 件 名	金額 (千円)	工 期			修 繕 内 容
そ の 他	C	川北中継ポンプ場 受電盤補修	-	2025 12/17	～	2026 3/19	不足電圧継電器不良のため 交換

区 分 別 集 計	A	0 件	—	建物	
	B	0 件	—	構築物	
	C	1 件	—	機械及び装置	
	D	0 件	—	車両運搬具	
	E	0 件	—	工具及び備品	
