

札幌市監査委員 藤 江 正 祥
同 窪 田 もとむ
同 武 市 憲 一
同 本 郷 俊 史

定期監査等の結果に関する報告の提出について

地方自治法第199条第1項、第2項、第4項及び第7項に基づき、下記の部等を対象として監査を行ったので、同条第9項の規定により、その監査の結果に関する報告を別紙のとおり提出します。

記

監査の対象

1 定期監査等（事務監査）

財政局 税政部 北部市税事務所
東部市税事務所
スポーツ局 スポーツ部
招致推進部
子ども未来局 児童相談所
建設局 土木部
教育委員会 生涯学習部
市立学校
選挙管理委員会事務局

3 出資団体等監査

札幌丘珠空港ビル株式会社
公益財団法人さっぽろ青少年女性活動協会
一般財団法人札幌市交通事業振興公社
公益財団法人札幌市生涯学習振興財団
公立大学法人札幌市立大学
北のふるさとNグループ
札幌国際芸術祭実行委員会

2 定期監査等（工事監査）

建設局 土木部（維持担当部以外）
都市局 建築部
中央区 土木部
西区 土木部
手稲区 土木部

定 期 監 查

(工事監査)

平成30年度定期監査（工事）報告書

監査の範囲

平成29年4月1日から平成30年3月31日までに完成した土木、建築、設備工事等及び平成30年4月1日から平成30年9月30日までに契約した土木、建築、設備工事等並びに平成29年10月1日から平成30年9月30日までに完了した道路維持除雪業務に係る工事設計、工事監理及び工事事務（必要に応じて他の年度の執行分も対象とする。）

監査の方法

前記監査範囲のうちから、別表に掲げる工事等を抽出し、関係法令等に基づき適正かつ適切に執行されているかを主眼とし、経済性、効率性、有効性の観点にも留意しつつ、関係書類や実地の検査及び関係職員からの説明聴取により実施した。

また、特に「工事の品質管理」を取り上げ、重点的な監査を行った。

監査の期間

平成30年7月9日から同年12月14日まで

監査の結果

おおむね良好と認められたが、対象となった工事のうち、一部について注意、改善及び検討を要する事項がみられた。

第1 重点項目「工事の品質管理」に係る指摘事項

1 プルーフローリングの実施が確認できる書類を作成すべきもの

【建設局土木部、中央区土木部、西区土木部、手稲区土木部】

札幌市土木工事共通仕様書(*)の品質管理基準では、下層路盤等の施工時に用いた転圧機械と同等以上の締固め効果を持つローラやトラック等を用いて締固め完了後の路盤等を走行し、不良箇所がないか確認するプルーフローリングの実施が必須と定められている。

今回監査した土木工事において、プルーフローリングの実施を現場にて監督職員が確認していたが、試験結果を書類で残していない事例がみられた。

発注者は、仕様書に示された試験が行われたのか証明するために実施した試験結果を書類で残すように受注者を指導し、工事における品質確保が適正に行われるように努められたい。

(*) 共通仕様書：工事を施工する上で必要な技術的要求及び工事内容を説明したもののうち定型的内容を定めたもの

第2 指摘事項

1 工事設計

(1) 測量業務積算において適正な地域区分を選定すべきもの

【建設局土木部】

「札幌市設計業務等積算基準」の第2編 測量業務積算基準では、地域区分の選定方法が定められている。

この地域区分は、地域による分類と地形による分類に分けられており、地域による分類では、測量箇所の家屋密度、用途地域等から大市街地、市街地（甲・乙）、都市近郊等を選定し、地形による分類では、地形の起伏、標高等から平地、丘陵地、低・高山地を選定する(*)。また、各地域区分には、変化率(*)が定められており、この変化率を標準の測量単価に乗じて積算することも併せて定められている。

今回監査した土木設計業務の測量業務積算において、地形による分類の選定は適正であったが、地域による分類の選定に誤りがあり、過大な測量単価で積算をしている事例がみられた。

測量業務の適正な積算が行われるように、設計時における積算基準の確認及び検算・審査等の各段階においてチェック機能を強化するように組織を挙げて努められたい。

(*) 地域区分の各分類および変化率については図1参照

(2) 共通費の算定を適正に行うべきもの

【都市局建築部】

今回監査した建築工事の共通費(*)の算定において、以下のとおり積算要領等の確認不足及び検算、審査等が不十分なことに起因する適正を欠いた事例がみられた。

共通費の算定に当たっては、積算要領等の周知を徹底し、研修等により担当職員の設計技術の向上を図るとともに、検算・審査・決裁等の各段階においてチェック機能を強化し、適正な設計となるよう努められたい。

ア 「札幌市公共建築工事積算要領」等では、敷地が異なる複数の工事を一括して発注する場合、共通仮設費及び現場管理費は、それぞれの敷地の工事ごとに算定することとされているが、誤って合計して算定していたため、共通仮設費及び現場管理費が過少となっていたもの

イ 「札幌市公共建築工事積算要領」等では、前払金(*)支出を行わない場合、一般管理費等率を補正することとしているが、誤って補正していなかったため、一般管理費等の算定が過少となっていたもの

ウ 「札幌市公共建築工事積算要領」等では、発注者が金銭的保証を必要としない場合、契約保証費(*)を一般管理費等に加算しないこととしているが、誤って加算していたもの

(*) 共通費：工事のための準備作業や仮設物、受注者の利益分など、間接的に工事に必要な費用で、共通仮設費、現場管理費、一般管理費等に区分される（図2参照）

(*) 前払金：工事等の着手に際して、必要な労働力、資材等を確保するために多額の資金が必要となることから、一定の設計金額及び工期を超える場合に契約の相手方から請求があったとき発注者から受注者へ支払うもの

(*) 契約保証費：公共工事の請負契約締結に際し、契約保証金の納付や国債等の有価証券の提供など、受注者が発注者に対して行う契約履行の金銭的保証に係る費用

(3) 現場管理費率の冬期補正を適正にすべきもの

【西区土木部】

「国土交通省 土木工事標準積算基準（共通編）」では、工事期間が積雪寒冷地の施工時期（11月1日～3月31日）にかかる場合、現場管理費率(*)を加算補正することと定められている。

しかし、監査した土木工事の設計において、工事期間が積雪寒冷地の施工時期にかかっているにもかかわらず、現場管理費率の加算補正がなされず過少設計となっていた事例がみられた。

工事の設計に当たっては、積算基準や要領等の周知を徹底し、研修等により担当職員の設計技術の向上を図るとともに、検算・審査・決裁等の各段階においてチェック機能を強化し、適正な設計となるよう組織を挙げて努められたい。

(*) 現場管理費率：工事を行う際に必要な品質管理費、安全管理など工事管理を実施するための経費を算出する際に用いる率（図3参照）

(4) ネットフェンスの延長数量を適正に計上すべきもの

【手稲区土木部】

「公園緑地工事設計要領」では、設計内訳書の数量欄に計上する数量の數位について、ネットフェンス等の工場製作品は小数点以下を四捨五入して計上すると定めている。

しかし、監査した土木工事の設計において、ネットフェンスの延長数量を一の位で切り捨て、過少に計上している事例がみられた。

工事の設計に当たっては、積算基準や要領等の周知を徹底し、研修等により担当職員の設計技術の向上を図るとともに、検算・審査・決裁等の各段階においてチェック機能を強化し、適正な設計となるよう組織を挙げて努められたい。

2 工事監理

(1) 掘削時の安全対策を適正に実施すべきもの

【建設局土木部】

「建設工事公衆災害防止対策要綱（土木工事編）」では、施工者は地盤の掘削において、切取り面にその箇所土質に見合った勾配を保って掘削できる場合を除き、掘削の深さが 1.5m を超える場合には原則として、土留工を施すものと定められている。

しかし、監査した土木工事において掘削深さが 1.5m を超えているにもかかわらず、土留工等の安全対策を実施せずに作業を行っていた事例がみられた。（*）

工事監理に当たっては、安全管理の徹底を図るとともに安全基準の順守と安全作業を強く指導し、適正な施工に努められたい。

（*） 土留工等の安全対策を実施せずに作業を行った事例については写真 1 参照

(2) 工事協議内容の記録を整備すべきもの

【都市局建築部】

「公共建築工事標準仕様書」では、監督職員の指示した事項及び協議した結果について記録を整備することと定めているが、今回監査した建築工事および設備工事において、指示等の記録が整備されていない事例がみられた。

現場において監督職員より口頭で指示等が行われた場合であっても、責任の所在を明確にするため、書面による記録を残すよう努められたい。

(3) 措置必要事項報告書を適時に提出すべきもの

【都市局建築部】

工事の施行に当たり設計変更の必要があると認められる場合には、工事主任は「札幌市工事施行規程」に基づき、直ちにその事実を記載した措置必要事項報告書(*)により上司に報告し、今後の措置について指示を受けなければならないが、この報告書が適時に提出されないまま、変更工事が行われている事例がみられた。

設計図書と実地とを調査し、疑義が生じたときや工法等を変更する必要があると認められるときなどは、直ちに措置必要事項報告書により上司へ報告し、その措置について指示を受け、適正な工事監理に努められたい。

(*) 措置必要事項報告書：工事の途中で何らかの変更が必要になった場合に、その内容を報告する書類。変更工事は、原則として設計変更の手続きを終えた後でなければ着手することができないが、その内容が軽易なもの等については、当該書類において指示を受けることにより事前着手が可能となる

(4) 工事写真の写真原本を提出すべきもの

【都市局建築部】

「営繕工事写真撮影要領」では、工事写真の撮影基準に基づいて撮影した写真原本（デジタルカメラの元データ又はネガ）を工事監督員に提出することと定めているが、今回監査した建築工事において、写真原本が提出されていない事例がみられた。

特にデジタルカメラで撮影した写真は容易に編集が可能であることから、提出された工事写真が適正であることを確認するためにも、写真原本の受領について職員へ周知するとともに、受注者への指導に努められたい。

第3 意見

1 見積書の徴取時における条件明示について

【都市局建築部】

今回監査した工事等の設計において、単価の決定に当たり専門業者から見積書を徴取する際に、仕様や数量、見積有効期限等の条件を明確に示していない事例が見られた。

条件の統一されていない見積書を比較して単価を決定することは、その有効性に疑義が生じることから、見積書の徴取に当たっては、条件を明示するよう研修等により関係職員へ周知し、適正な設計に努められるよう要望する。

2 トンネル内部におけるプロジェクターを利用した規制表示等について（優良事例）

【建設局土木部】

南区定山溪に架けられている樹海橋及び樹林橋における橋梁補修工事では、施工場所が白井トンネルと神威トンネルに挟まれていたため、トンネル内部での規制表示が必要な場所であったが、トンネル内部は、暗く、通常の規制表示では通過するドライバーに見えにくい状況であった。

本工事は、この問題を解決すべく、トンネル内上部にプロジェクターを利用し、規制表示等を映し出すことにより、当該トンネルを通過するドライバーからの視認性が向上した優れた事例である。（*）

今後とも、工事施工中の交通安全対策に向けた取組を継続するよう要望する。

（*） トンネル内上部にプロジェクターを利用し規制表示等を映し出した事例については
写真2参照

地域による分類

- ① 大市街地 人口約 100 万人以上の大都市の中心部(家屋密度 90%程度)
- ② 市街地(甲) 人口 50 万人以上の大都市の中心部 (家屋密度 80%程度)
- ③ 市街地(乙) 上記以外の都市部 (家屋密度 60%)
- ④ 都市近郊 都市に接続する家屋の散在している地域 (家屋密度 40%程度)
- ⑤ 耕地 耕地及びこれに類似した所で農地でなくともこの中に含む。(家屋密度 20%程度以下)
- ⑥ 原野 木が少なく見通しのよい所
- ⑦ 森林 木が多く見通しの悪い所

上記の地域による分類で判断することができない場合は、用途地域等を参考とすることができる。


地形による分類

- ① 平地 平坦な地域
- ② 丘陵地 ゆるやかな起伏のある地形
- ③ 低山地 相当勾配のある地形。あるいは標高 1,000m未満の山地
- ④ 高山地 急峻な地形。あるいは、標高 1,000m以上の山地

変化率

地 域 \ 地 形	平 地	丘 陵 地	低 山 地	高 山 地
大 市 街 地	+ 1 . 0	-	-	-
市 街 地 (甲)	+ 0 . 4	-	-	-
市 街 地 (乙)	+ 0 . 3	+ 0 . 5	-	-
都 市 近 郊	+ 0 . 2	+ 0 . 3	-	-
耕 地	± 0 . 0	+ 0 . 1	+ 0 . 2	-
原 野	+ 0 . 2	+ 0 . 3	+ 0 . 4	+ 0 . 5
森 林	+ 0 . 3	+ 0 . 4	+ 0 . 6	+ 0 . 7

図 1 地域区分の各分類および変化率

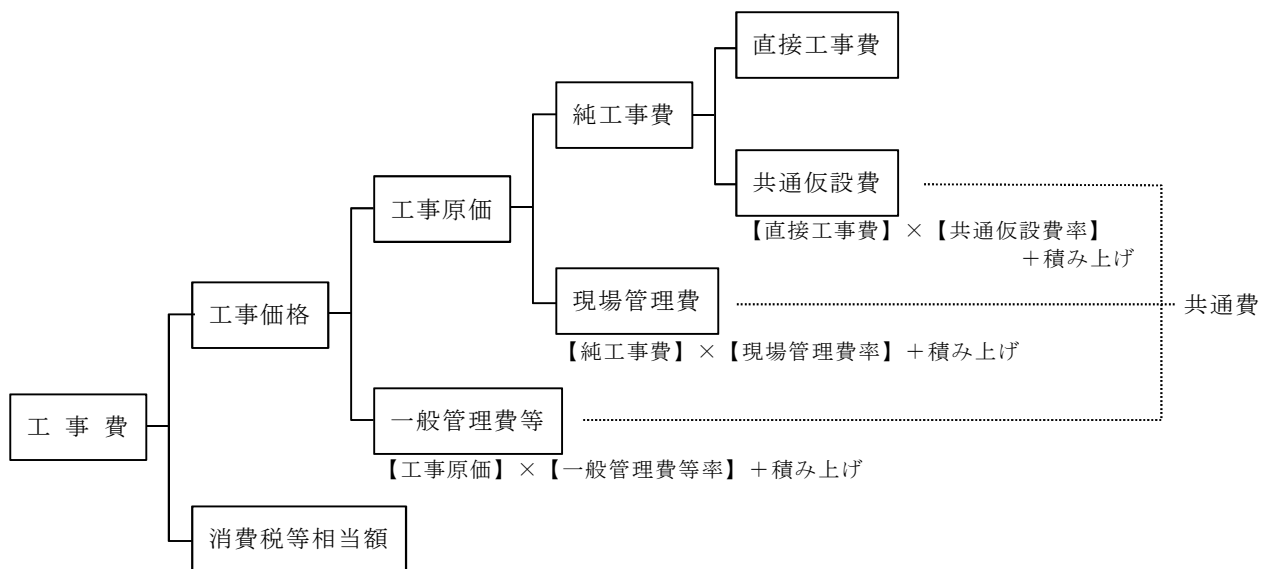


共通仮設費：各工事種目に共通の仮設に要する費用
 (監督職員事務所、現場事務所、仮囲い、工事用道路など)

現場管理費：工事施工に当たり、工事現場を管理運営するために必要な費用で、共通仮設費以外の費用
 (現場従業員の給与、火災保険、工事保険、事務用消耗品費、工事实績情報登録費など)

一般管理費等：工事施工に当たる受注者の継続運営に必要な費用で、一般管理費と付加利益等からなる。
 (本店及び支店の従業員に対する給与、契約保証費、租税公課など)

図2 工事費の構成 (建築工事)

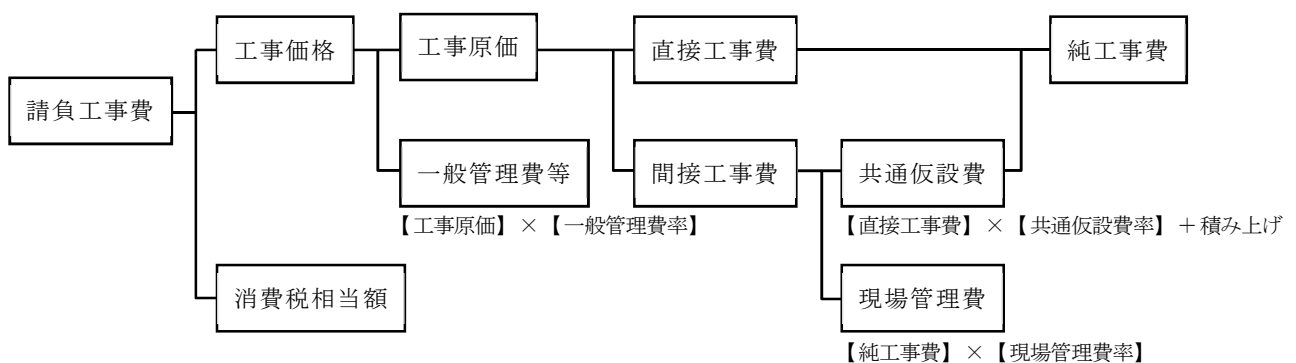

共通仮設費率：工事を行う際に必要な運搬費、準備費、安全等の共通的な経費を算出する際に用いる率

現場管理費率：工事を行う際に必要な品質管理費、安全管理など工事管理を実施するための経費を算出する際に用いる率

一般管理費等率：工事施工にあたる企業の継続運営に必要な費用を算出する際に用いる率

図3 請負工事費の構成 (土木工事)



写真1 土留工等の安全対策を実施せずに作業を行った事例



写真2 トンネル内上部にプロジェクターを利用し規制表示等を映し出した優良事例

建設局 土木部

別表

(土木工事)

番号	工 事 (業 務) 名	契約金額(円)	工 期	契約方法
1	防災・安全交付金事業 道道札幌環状線(白石中央19号線～南南郷東札幌2号線間)ほか1線電線共同溝新設工事	246,610,440	29.04.03 ～ 30.01.17	一般
2	厚別停車場支線(上野幌中央線～国道274号間)法面改良工事	105,306,480	29.05.29 ～ 30.01.23	一般
3	防災・安全交付金事業 中央東10丁目線(北3条線～国道12号間)ほか1線歩道バリアフリー工事	93,088,440	29.06.12 ～ 29.12.18	一般
4	社会資本整備総合交付金事業 興産社大野地線(大野地第3中線～大野地第4中線間)道路改良工事	193,002,480	29.06.26 ～ 30.03.22	一般
5	防災・安全交付金事業 三里橋補修工事	76,059,000	29.07.18 ～ 29.12.14	一般
6	旭山公園米里線(菊水6条2丁目2号線～国道12号間)舗装路面改良工事	52,458,840	29.07.25 ～ 29.11.21	一般
7	上野幌中学校擁壁補修工事	5,182,920	29.08.07 ～ 29.10.05	一般
8	防災・安全交付金事業 樹海橋ほか1橋補修工事	52,458,840	29.03.21 ～ 29.11.15	一般
9	防災・安全交付金事業 月見橋補修工事	136,504,440	29.04.24 ～ 29.11.19	一般
10	防災・安全交付金事業 副都心団地6号線(下野幌団地29号線～下野幌幹線間)ほか1線歩道バリアフリー工事	66,105,720	29.05.15 ～ 29.11.24	一般
11	地方道路等整備事業 二十四軒第2横線(二十四軒2条線～二十四軒1条線間)歩道改良工事	41,092,920	29.05.22 ～ 29.11.17	一般
12	防災・安全交付金事業 米里中の島線(白石連絡線～本郷鉄道沿線間)歩道バリアフリー工事	125,407,440	29.06.12 ～ 30.02.06	一般
13	下手稲通線(曙14号線～曙西16号線間)舗装路面改良工事	26,355,240	29.07.31 ～ 29.11.17	一般
14	地方道路等整備事業 錦橋(床版製作工)架換工事	149,862,960	29.08.28 ～ 30.03.23	一般
15	東月寒83号線(道道西野白石線～東月寒92号線間)舗装路面改良工事	25,639,200	29.07.31 ～ 29.11.17	一般

番号	工 事 (業 務) 名	契約金額(円)	工 期	契約方法
16	社会資本整備総合交付金事業 道道花畔札幌線（雁来篠路連絡線～篠路3条8丁目89番5地先間）道路改良工事	30,252,960	29.09.19 ～ 30.02.19	一般
17	社会資本整備総合交付金事業 道道西野真駒内清田線（北ノ沢山手線～北ノ沢連絡南線間）道路改良工事	338,511,960	29.04.18 ～ 30.02.19	一般
18	防災・安全交付金事業 ポンノッポロ橋補修工事	217,656,720	29.03.21 ～ 29.11.15	一般
19	防災・安全交付金事業 白石駅前東1号線（白石駅前4号線～白石駅前通線間）歩道バリアフリー工事	86,106,240	29.03.21 ～ 29.11.15	一般
20	防災・安全交付金事業 南4条線（西4丁目線～西7丁目線間）ほか2線歩道バリアフリー工事	216,830,520	29.04.24 ～ 30.01.18	一般
21	北郷1丁目線（北郷2条西線～道道札幌環状線間）舗装路面改良工事	42,757,200	29.04.24 ～ 29.08.21	一般
22	道道西野真駒内清田線（盤溪381番地先～盤溪337番地先間）歩道新設工事	127,089,000	29.06.19 ～ 30.01.06	一般
23	防災・安全交付金事業 三里川北橋補修工事	35,028,720	29.07.31 ～ 30.01.06	一般
24	国庫補助事業 8・6・38苗穂駅前広場連絡歩道橋梁（下部工ほか）新設工事	75,664,800	29.02.21 ～ 29.12.17	一般
25	防災・安全交付金事業 3・4・15福住・桑園通（南1条通～南4条西15丁目1317-20地先間）電線共同溝新設工事	211,129,200	29.03.28 ～ 30.02.20	一般
26	防災・安全交付金事業 新川大橋補修工事	276,881,760	29.04.03 ～ 30.01.27	一般
27	地方道路等整備事業 3・4・144北郷公園南通（8線幹道線～川北歩道線間）ほか1線道路改良工事	75,028,680	29.07.03 ～ 30.03.29	一般
28	防災・安全交付金事業 福住橋ほか1橋補修工事	130,403,520	29.07.18 ～ 30.03.23	一般
29	宮の森・北24条通ほか2線道路予定地整備工事	2,411,640	29.05.01 ～ 30.06.29	随契
30	地方道路等整備事業 3・3・3北3条通（苗穂駅南口広場）排水管設置工事	5,451,840	29.09.26 ～ 29.11.14	随契
31	苗穂駅連絡通道路予定地整備工事	3,527,280	29.10.02 ～ 29.11.30	一般

番号	工 事 (業 務) 名	契約金額(円)	工 期	契約方法
32	防災・安全交付金事業 平岡7条3丁目ほか2箇所 F型標識設置工事	14,089,680	29.09.11 ～ 29.12.09	一般
33	地方道路等整備事業 3・3・83 山本通(厚別西 4条3丁目7号線～厚別通間) 箱型函渠新設工事	412,202,520	28.08.01 ～ 29.09.30	一般
34	厚別東北郷線(新北郷橋～北5条8・9丁目1号線 間) 舗装路面改良工事	34,440,120	29.08.21 ～ 29.12.18	一般
35	社会資本整備総合交付金事業 3・3・6 西5丁 目・樽川通(北19条中通線～北20条線間ほか) 電線 共同溝新設工事	230,112,360	29.05.22 ～ 30.02.15	一般
36	社会資本整備総合交付金事業 3・2・616 屯 田・茨戸通仮称創成川橋(基礎工) 新設工事	418,197,600	29.04.24 ～ 30.03.26	一般
37	防災・安全交付金事業 青樹橋補修ほか工事	71,247,600	29.06.26 ～ 30.01.11	一般
38	社会資本整備総合交付金事業 3・4・80清田通 (清田77号線～清田86号線間) 道路新設工事	485,397,360	29.04.24 ～ 30.03.09	一般
39	社会資本整備総合交付金事業 3・2・10環状通 (福住・桑園通～西12丁目線間) 電線共同溝新設工 事	372,462,840	29.04.17 ～ 30.03.23	一般
40	防災・安全交付金事業 3・4・615新琴似・屯田 通(新琴似9条11丁目4号線～新琴似5番線間) 道 路改良工事	64,706,040	29.07.13 ～ 30.02.12	一般
41	社会資本整備総合交付金事業 3・4・54宮の森・ 北24条通仮称北24条大橋(桁製作工) 新設工事(そ の1)	278,827,920	29.07.10 ～ 30.03.23	一般
42	社会資本整備総合交付金事業 3・4・54宮の森・ 北24条通仮称北24条大橋(桁製作工) 新設工事(そ の2)	213,402,600	29.07.17 ～ 30.03.23	一般
43	国庫補助事業 8・6・3 西2丁目地下歩道新設工 事(第3工区)	590,168,160	27.07.28 ～ 30.02.28	一般
44	防災・安全交付金事業 厚別東5条8丁目ほか1箇 所F型標識設置工事	11,838,960	29.09.19 ～ 29.12.17	一般
45	新琴似・屯田通ほか2線道路予定地整備工事	11,241,720	29.10.17 ～ 29.12.15	一般
46	防災・安全交付金事業 鉄道添線(富丘通線～西宮 の沢区画整理18号線間) ほか1線道路実施設計	13,998,938	29.08.25 ～ 30.01.21	一般
47	社会資本整備総合交付金事業 3・2・616屯田・茨戸通(屯田・紅葉山通～屯田 町1009-1番地先間) ほか1線道路実施設計	26,139,672	29.09.01 ～ 30.03.23	一般

番号	工 事 (業 務) 名	契約金額(円)	工 期	契約方法
48	社会資本整備総合交付金事業 道道札幌北広島環状線(屯田町860-5番地先～屯田町1027-1番地先間) 道路実施設計	29,966,760	29.09.01 ～ 30.03.23	一般
49	防災・安全交付金事業 夕日橋ほか2橋耐震補強実施設計	27,972,030	29.09.29 ～ 30.03.23	一般
50	藻岩北小学校擁壁補修実施設計	6,863,400	29.09.25 ～ 30.02.21	一般
51	防災・安全交付金事業 札幌軽川間線(道道琴似停車場新琴似線～農試公園1号線間)ほか1線道路実施設計	12,827,773	29.09.25 ～ 30.02.21	一般
52	防災・安全交付金事業 東5丁目北線(北18条線～北15条線間)ほか2線道路実施設計	13,614,307	29.09.29 ～ 30.02.25	一般
53	防災・安全交付金事業 西7丁目北線(道道札幌環状線～北22条中通線間)ほか3線道路実施設計	11,571,448	29.09.01 ～ 30.01.28	一般
54	川下線(東米里2578番地先～縦貫自動車側道6号線)ほか1線道路実施設計	16,813,390	29.09.08 ～ 30.02.04	一般
55	防災・安全交付金事業 白井大橋ほか1橋補修実施設計	20,772,720	29.09.28 ～ 30.03.06	一般
56	防災・安全交付金事業 道道札幌夕張線(月寒線～大谷地4号線間)ほか2線道路実施設計	18,337,115	29.09.15 ～ 30.02.11	一般
57	防災・安全交付金事業 真駒内住宅団地線(真駒内団地東1号線～真駒内団地6号線間)ほか2線道路実施設計	16,747,560	29.09.15 ～ 30.03.03	一般
58	防災・安全交付金事業 大曲橋補修実施設計	13,285,995	29.09.15 ～ 30.02.01	一般
59	防災・安全交付金事業 道道真駒内御料札幌線(有明214地先～有明248地先間) 道路実施設計	9,891,720	29.06.23 ～ 30.03.26	一般
60	防災・安全交付金事業 旭山公園米里線(道道札幌夕張線～菊水6条2丁目2号線間)ほか1線道路実施設計	16,804,557	29.09.01 ～ 30.01.28	一般
61	防災・安全交付金事業 丘珠空港線(日の丸東13丁目線～日の丸東12丁目線間)ほか2線道路実施設計	13,257,885	29.08.25 ～ 30.01.21	一般
62	防災・安全交付金事業 東札幌中の島線(白石中の島線～国道453号間)ほか1線道路実施設計	15,553,547	29.08.25 ～ 30.01.21	一般
63	防災・安全交付金事業 北13条線(西2丁目線～幌北線間)ほか1線道路実施設計	10,266,842	29.09.01 ～ 30.01.28	一般

番号	工 事 (業 務) 名	契約金額(円)	工 期	契約方法
64	防災・安全交付金事業 菊郷橋ほか1橋補修実施設計	19,447,560	29.09.15 ～ 30.03.13	一般
65	防災・安全交付金事業 米里十二号橋ほか1橋補修実施設計	20,483,395	29.09.15 ～ 30.03.13	一般
66	防災・安全交付金事業 3・4・15福住・桑園通 (南4・5条中通線～南6条線間) 電線共同溝実施設計	17,444,160	29.05.12 ～ 30.03.07	一般
67	防災・安全交付金事業 3・3・31南1条通(札幌 駅前通～西5丁目線間) 電線共同溝実施設計	8,813,352	29.04.28 ～ 30.03.23	一般
68	防災・安全交付金事業 ミュンヘン大橋耐震補強実施設計	16,169,760	29.06.02 ～ 30.03.23	一般
69	大倉山ジャンプ競技場ランディングバーン改修実施設計	9,288,000	29.07.07 ～ 30.02.01	一般
70	防災・安全交付金事業 星置こ線橋補修実施設計	9,549,360	29.09.15 ～ 30.03.23	一般
71	社会資本整備総合交付金事業 3・3・6西5丁目・樽川通(北22条中通線～宮の森・北24条通間ほか) 電線共同溝実施設計	9,050,945	29.06.30 ～ 30.02.24	一般
72	3・2・616屯田・茨戸通(茨戸7号線交差点ほか) 道路実施設計	4,102,461	29.07.28 ～ 30.01.23	一般
73	防災・安全交付金事業 3・3・7西7丁目通(南6条線～菊水・旭山公園通間) 電線共同溝実施設計	14,407,832	29.06.09 ～ 30.03.09	一般
74	防災・安全交付金事業 八軒橋ほか2橋補修実施設計	24,364,800	29.09.15 ～ 30.03.13	一般
75	社会資本整備総合交付金事業 3・2・10環状通 (西13丁目線～西7丁目線間) 電線共同溝実施設計	25,952,400	29.06.09 ～ 30.03.23	一般
76	防災・安全交付金事業 屯田橋ほか1橋補修実施設計	17,950,406	29.09.25 ～ 30.03.23	一般
77	3・4・54宮の森・北24条通(雁来川横断部) 道路 構造物修正設計	4,358,424	29.12.08 ～ 30.03.23	一般
78	ひばりが丘12号線(国道12号～下野幌幹線間) 舗装 路面改良工事	43,749,720	30.03.27 ～ 30.07.14	一般
79	道道大麻東雁来線(森林公園駅西通線～官林北線 間) 舗装路面改良工事	32,235,840	30.04.09 ～ 30.08.06	一般

番号	工 事 (業 務) 名	契約金額(円)	工 期	契約方法
80	防災・安全交付金事業 鉄道添線(富丘通線～西宮の沢区画整理18号線間) 歩道バリアフリー工事	33,922,158	30.05.28 ～ 30.10.31	一般
81	東月寒83号線(東月寒92号線～東月寒5号線間) 舗装路面改良工事	44,780,040	30.04.16 ～ 30.09.11	一般
82	道道札幌環状線(平岸定鉄跡線～国道453号間) 舗装路面改良工事	39,638,160	30.04.02 ～ 30.07.30	一般
83	社会資本整備総合交付金事業 道道真駒内御料札幌線(有明140番地先～有明191番地先間) 道路改良工事	158,299,920	29.06.26 ～ 30.05.31	一般
84	防災・安全交付金事業 上白石橋ほか1橋補修工事	142,819,200	29.08.21 ～ 30.08.30	一般
85	新川支線(八軒第8号線～道道琴似停車場新琴似線間) 舗装路面改良工事	51,768,720	30.04.06 ～ 30.08.01	一般
86	石山線(石山橋～国道230号線間) 舗装路面改良工事	37,669,320	30.04.23 ～ 30.08.20	一般
87	防災・安全交付金事業 北3条線(東4丁目線～真駒内篠路線間) 道路改良工事	75,164,760	30.04.16 ～ 30.10.02	一般
88	北2条線(西6丁目線～西10丁目線間) 舗装路面改良工事	38,923,200	30.04.02 ～ 30.07.30	一般
89	新琴似3番通ほか3線道路予定地整備工事	2,071,440	30.04.16 ～ 30.10.02	随契
90	札幌夕張線(大谷地線～本通21丁目南1号線間) 舗装路面改良工事	21,611,880	30.03.19 ～ 30.06.29	一般
91	羊ヶ丘線(真栄団地47号線～真栄108号線間) 舗装路面改良工事	52,225,560	30.03.27 ～ 30.06.26	一般
92	防災・安全交付金事業 3・4・8北8条通(西2丁目線～国道5号間) 道路改良工事	160,584,120	29.09.26 ～ 30.04.27	一般
93	北郷1丁目線(国道12号～白石中央3条3号線間) 舗装路面改良工事	47,190,600	30.04.10 ～ 30.08.23	一般
94	曙線(手稲山口区画整理1号線～稲山線) 舗装路面改良工事	19,526,400	30.03.19 ～ 30.07.06	一般

(設備工事)

番号	工 事 (業 務) 名	契約金額(円)	工 期	契約方法
1	No. 1 凍結防止剤散布車	33,580,910	29.05.17 ～ 29.10.11	一般

都市局 建築部

(土木工事)

番号	工 事 (業 務) 名	契約金額(円)	工 期	契約方法
1	(仮称) 札苗緑小学校区多世代交流施設駐車場整備 工事	10,260,000	29.09.19 ～ 29.11.27	一般
2	豊平区土木センターます設置工事	1,900,800	29.07.28 ～ 29.09.14	随契
3	北1東15自転車保管場所ます設置工事	1,393,200	29.08.10 ～ 29.09.27	随契
4	市営住宅光星団地2号棟ます設置工事	1,836,000	29.08.04 ～ 29.09.21	随契
5	(仮称) 札苗緑小学校区多世代交流施設駐車場整備 工事实施設計	810,000	29.05.12 ～ 29.06.30	随契
6	市営住宅(二十四軒団地)仮設駐車場整備工事	15,951,600	30.09.03 ～ 30.12.03	一般
7	公営住宅(月寒団地F-3・4号棟)外構整備工事	12,117,600	30.09.03 ～ 30.12.05	一般
8	市営住宅二十四軒団地仮設駐車場実施設計	1,745,106	30.04.20 ～ 30.06.18	一般

(建築工事)

番号	工 事 (業 務) 名	契約金額(円)	工 期	契約方法
1	月寒屋外競技場弓道場防矢ネット設置工事	41,959,080	29.12.04 ～ 30.03.20	一般
2	円山動物園(仮称)ホッキョクグマ・アザラシ館新 築工事(主体工事)	1,413,232,383	27.10.05 ～ 29.10.20	一般
3	札幌市民ホール大ホール持込音響設備転倒防止対策 工事	1,188,000	29.12.28 ～ 30.03.07	随契
4	発寒清掃工場煙突改修工事	146,984,760	29.03.21 ～ 29.12.15	一般
5	上篠路中学校ほか2校プレハブ型備蓄庫設置工事	28,168,560	29.09.19 ～ 30.01.12	一般

番号	工 事 (業 務) 名	契約金額(円)	工 期	契約方法
6	豊平区土木センター新築ほか工事	275,352,480	29.05.29 ～ 30.03.27	一般
7	農試公園屋内広場防水改修工事实施設計	3,008,880	29.09.25 ～ 30.02.28	一般
8	札幌ドーム野球用ラバーフェンス改修工事实施設計	1,455,796	29.05.26 ～ 29.09.15	随契
9	円山動物園新類人猿館新築ほか工事基本・実施設計	15,342,480	28.06.03 ～ 29.05.31	一般
10	上篠路中学校ほか2校プレハブ型備蓄庫設置工事監理	699,840	29.09.14 ～ 30.01.22	随契
11	北区役所改修工事	40,826,160	29.06.12 ～ 30.02.28	一般
12	(仮称) 丘珠縄文遺跡公園ガイダンス施設新築工事	182,475,720	29.06.12 ～ 30.01.31	一般
13	区役所窓改修工事	2,376,000	29.12.01 ～ 30.01.31	随契
14	旧永山武四郎邸及び旧三菱鉱業寮保存活用等改修工事	196,488,720	28.10.31 ～ 30.03.09	一般
15	篠路コミュニティセンター天井ほか改修工事	79,959,960	29.05.22 ～ 29.10.06	一般
16	大通バスセンター照明改修ほか工事修正設計	399,600	29.05.26 ～ 29.07.28	随契
17	山鼻まちづくりセンター・山鼻会館新築工事基本・実施設計	8,117,823	29.05.26 ～ 30.03.13	一般
18	重要文化財旧札幌農学校演武場(時計台)外部改修工事实施設計	2,775,308	29.06.02 ～ 29.12.04	一般
19	北区役所改修工事監理	928,800	29.06.08 ～ 30.03.12	随契
20	(仮称) 丘珠縄文遺跡公園ガイダンス施設新築工事監理	4,644,000	29.06.07 ～ 30.02.13	随契
21	山鼻まちづくりセンター・山鼻会館新築工事地質調査	2,946,240	29.07.14 ～ 29.09.29	一般

番号	工 事 (業 務) 名	契約金額(円)	工 期	契約方法
22	中の島小学校改築工事 (主体工事)	1,764,363,979	28.06.16 ～ 29.08.04	一般
23	簾舞小学校便所改修ほか工事	53,084,160	29.05.22 ～ 29.11.17	一般
24	澄川小学校解体工事	293,703,840	29.07.10 ～ 30.03.09	一般
25	定山溪小学校仮設物置新築工事	2,322,000	29.11.02 ～ 30.01.31	随契
26	苗穂小学校ほか4校煙突改修工事	53,275,320	29.12.18 ～ 30.03.09	一般
27	本郷小学校ほか3校煙突改修工事	36,133,560	29.12.25 ～ 30.03.16	一般
28	盤溪小学校便所改修ほか工事実施設計	648,000	28.12.22 ～ 29.04.14	随契
29	上篠路中学校格技場新築工事実施設計	2,500,025	29.07.07 ～ 30.03.16	一般
30	栄小学校ほか3校煙突改修工事実施設計	1,909,315	29.12.08 ～ 30.03.09	一般
31	中央小学校屋内運動場棟改築工事監理	9,953,280	29.06.19 ～ 30.03.26	随契
32	澄川小学校解体工事監理	3,650,400	29.07.07 ～ 30.03.15	随契
33	本郷小学校ほか3校煙突改修工事監理	1,010,880	29.12.22 ～ 30.03.20	随契
34	発寒西小学校地質調査	7,584,840	29.05.26 ～ 29.08.31	一般
35	北海道札幌藻岩高等学校外部改修工事	102,387,240	29.08.21 ～ 30.01.15	一般
36	定山溪中学校外部改修工事	33,137,640	29.05.29 ～ 29.09.29	一般
37	西岡北中学校ほか1校外部改修工事	224,983,440	29.05.22 ～ 29.12.08	一般

番号	工 事 (業 務) 名	契約金額(円)	工 期	契約方法
38	旭小学校ほか1校外部改修工事	138,031,560	29.05.29 ～ 29.10.31	一般
39	平和小学校屋内運動場床改修工事	24,008,400	29.12.04 ～ 30.02.28	一般
40	篠路小学校屋内運動場外壁改修工事实施設計	1,097,277	29.02.17 ～ 29.04.28	一般
41	西岡小学校給食室等改修工事实施設計	864,000	29.03.03 ～ 29.05.02	随契
42	北海道札幌藻岩高等学校外部改修工事監理	2,640,600	29.08.18 ～ 30.01.29	随契
43	定山溪中学校外部改修工事監理	1,161,000	29.05.26 ～ 29.10.05	随契
44	西岡北中学校ほか1校外部改修工事監理	5,675,400	29.05.22 ～ 29.12.21	随契
45	旭小学校ほか1校外部改修工事監理	3,732,480	29.05.26 ～ 29.11.13	随契
46	平和小学校屋内運動場床改修工事監理	928,800	29.11.30 ～ 30.03.06	随契
47	公営住宅（月寒団地F4・5号棟・旧集会所）解体工事	119,894,040	29.05.29 ～ 29.12.28	一般
48	高層市営住宅転落防止柵設置工事	11,124,000	29.09.04 ～ 29.11.30	一般
49	公営住宅（東雁来団地3号棟）建具工事	36,474,840	29.04.03 ～ 29.10.31	一般
50	市営住宅光星団地2号棟（改良住宅）耐震改修・全面的改善工事	1,507,837,680	28.10.03 ～ 30.02.20	一般
51	市営住宅（伏古団地建替1～3号棟）新築工事实施設計	26,174,880	29.06.09 ～ 30.02.28	一般
52	市営住宅（里塚団地14号棟）高断熱改修工事实施設計	2,562,791	29.07.24 ～ 30.02.28	一般
53	公営住宅（月寒団地F4・5号棟・旧集会所）解体工事監理	1,166,400	29.05.26 ～ 30.01.11	随契

番号	工 事 (業 務) 名	契約金額(円)	工 期	契約方法
54	高層市営住宅転落防止柵設置工事監理	466,560	29.08.31 ～ 29.12.05	随契
55	市営住宅（伏古団地建替1～3号棟）地質調査	10,744,714	29.06.30 ～ 29.10.31	一般
56	中央図書館・埋蔵文化財センター内部ほか改修工事	368,292,960	29.06.05 ～ 30.05.31	一般
57	札幌市天文台外部改修工事	11,405,880	30.03.12 ～ 30.07.06	一般
58	社会資本整備総合交付金事業 ひのまる公園便所改築工事	17,525,160	30.04.16 ～ 30.09.10	一般
59	豊平区土木センタープレハブ車庫増築ほか工事实施設計	2,345,760	30.05.18 ～ 30.09.18	一般
60	社会資本整備総合交付金事業 西野昭和公園便所改築工事	11,664,000	30.04.16 ～ 30.08.31	一般
61	川下公園リラクソプラザ屋外木部ほか改修工事实施設計	1,750,509	30.04.13 ～ 30.07.13	一般
62	本通小学校内部改修ほか工事	49,348,440	30.04.23 ～ 30.08.03	一般
63	定山溪小学校付属舎改築ほか工事修正設計	489,240	30.06.01 ～ 30.09.11	随契
64	栄西まちづくりセンター・地区会館物置新設工事实施設計	399,600	30.07.27 ～ 30.08.31	随契
65	本通小学校内部改修ほか工事監理	1,112,400	30.04.19 ～ 30.08.10	随契
66	稲積中学校外部改修工事实施設計	3,380,213	30.02.19 ～ 30.05.01	一般
67	幌南小学校外部改修工事实施設計	2,895,480	30.02.19 ～ 30.05.01	一般
68	澄川南小学校ほか1校屋内運動場外部改修ほか工事实施設計	2,891,160	30.02.23 ～ 30.05.07	一般
69	市営住宅（発寒団地14～17号棟）天井囲い込み工事实施設計	777,600	30.04.06 ～ 30.08.24	随契

番号	工 事 (業 務) 名	契約金額(円)	工 期	契約方法
70	市営住宅（美香保団地7号棟）地質調査	5,541,264	30.06.01 ～ 30.09.12	一般

(設備工事)

番号	工 事 (業 務) 名	契約金額(円)	工 期	契約方法
1	藻岩中学校リニューアル改修電気設備工事	66,088,440	29.07.03 ～ 30.03.16	一般
2	西野中学校リニューアル改修電気設備工事	91,137,960	29.07.10 ～ 30.03.12	一般
3	新琴似中学校格技場新築ほか電気設備工事	11,540,880	29.07.31 ～ 30.03.16	一般
4	栄南中学校リニューアル改修電気設備工事	56,482,920	29.08.07 ～ 30.03.19	一般
5	本通小学校改築ほか電気設備工事	10,093,680	29.08.07 ～ 30.02.28	一般
6	中の島小学校改築強電設備工事	248,398,920	28.08.01 ～ 29.08.25	一般
7	中央中学校改築強電設備工事	215,464,320	28.08.01 ～ 29.08.10	一般
8	東区民センターホール改修電気設備工事	46,809,360	29.04.17 ～ 29.09.11	一般
9	菊水分庁舎データセンター化ほか強電設備改修工事	108,694,440	29.05.22 ～ 30.03.16	一般
10	篠路コミュニティセンター改修電気設備工事	89,621,640	29.05.29 ～ 29.12.19	一般
11	東月寒まちづくりセンターリニューアルほか改修電気設備工事	5,222,880	29.07.10 ～ 29.11.10	一般
12	中央中学校改築設備工事監理	13,327,200	28.07.29 ～ 29.08.25	随契
13	円山動物園（仮称）ホッキョクグマ・アザラシ館新築電気設備工事	184,782,600	27.09.24 ～ 29.10.20	一般
14	市営住宅光星団地2号棟（改良住宅）耐震改修・全面的改善電気設備工事	207,820,080	28.10.18 ～ 30.02.20	一般

番号	工 事 (業 務) 名	契約金額(円)	工 期	契約方法
15	中央図書館・埋蔵文化財センター改修電気設備工事	357,032,880	29.05.01 ～ 30.03.26	一般
16	平岡公園照明灯改修工事	20,698,200	29.05.22 ～ 29.10.18	一般
17	社会資本整備総合交付金事業 厚別山本公園造成電気設備工事	54,811,080	29.06.05 ～ 29.12.14	一般
18	白石区体育館改修電気設備工事	106,411,320	29.06.26 ～ 29.12.11	一般
19	新琴似図書館照明改修工事	9,730,800	29.07.10 ～ 29.10.31	一般
20	澄川図書館照明改修工事	11,438,280	29.07.10 ～ 29.10.31	一般
21	社会資本整備総合交付金事業 発寒西公園便所改築電気設備工事	1,598,400	29.07.21 ～ 29.12.20	随契
22	元町北小学校電気設備改修工事	9,898,200	29.08.28 ～ 30.02.28	一般
23	社会資本整備総合交付金事業 清田南公園便所改築電気設備工事	1,620,000	29.09.22 ～ 30.02.28	随契
24	東雁来第2土地区画整理事業 照明設置工事	2,954,880	29.10.10 ～ 30.01.31	一般
25	市営住宅(伏古団地建替1～3号棟)新築設備工事 実施設計	14,466,803	29.06.09 ～ 30.02.28	一般
26	南区民センター・真駒内まちづくりセンターホール 改修電気設備工事	29,624,400	29.10.10 ～ 30.03.16	一般
27	豊明高等支援学校照明改修工事	46,742,400	29.09.04 ～ 30.02.09	一般
28	新琴似中学校ほか1校電気設備改修工事	31,104,000	29.09.04 ～ 30.03.02	随契
29	真駒内中学校ほか1校電気設備改修工事	35,696,160	29.09.11 ～ 30.02.28	一般
30	新琴似中学校ほか1校電気設備改修工事 実施設計	1,265,760	29.03.17 ～ 29.07.03	一般

番号	工 事 (業 務) 名	契約金額(円)	工 期	契約方法
31	中央中学校改築暖房設備工事	195,021,000	28.08.01 ～ 29.08.10	一般
32	新発寒小学校給食室増築ほか暖房衛生設備工事	156,590,280	29.04.24 ～ 29.12.15	一般
33	菊水分庁舎データセンター化ほか冷房設備改修工事	269,784,000	29.05.22 ～ 30.03.16	一般
34	厚別中学校給食ボイラー更新衛生設備工事	18,050,040	29.06.05 ～ 29.09.08	一般
35	星置地区センター・星置まちづくりセンター改修冷 暖房衛生設備工事	65,534,400	29.06.05 ～ 30.02.16	一般
36	豊平区土木センター新築冷暖房衛生設備工事	58,085,640	29.06.05 ～ 29.11.02	一般
37	札幌小学校便所改修衛生設備工事	57,775,680	29.06.12 ～ 29.11.10	一般
38	札幌留学生交流センターほか改修冷暖房衛生設備工 事	63,410,040	29.06.12 ～ 29.11.20	一般
39	藻岩中学校リニューアル改修暖房衛生設備工事	62,174,520	29.06.26 ～ 30.03.16	一般
40	藻岩中学校格技場新築暖房衛生設備工事	12,586,320	29.06.26 ～ 30.03.16	一般
41	中央小学校屋内運動場棟改築暖房衛生設備工事	54,375,840	29.06.26 ～ 30.03.15	一般
42	北都小学校リニューアル改修暖房衛生設備工事	67,649,040	29.06.26 ～ 30.02.28	一般
43	栄南中学校リニューアル改修暖房衛生設備工事	61,275,960	29.08.07 ～ 30.03.19	一般
44	新発寒小学校小荷物専用昇降機設備改修工事	324,000	29.09.22 ～ 29.12.15	随契
45	石山地区小学校新築ほか設備工事実施設計	12,484,800	28.05.13 ～ 29.06.02	随契
46	円山動物園（仮称）ホッキョクグマ・アザラシ館新 築冷暖房衛生設備工事	414,897,120	27.09.24 ～ 29.10.20	一般

番号	工 事 (業 務) 名	契約金額(円)	工 期	契約方法
47	市営住宅光星団地2号棟(改良住宅)耐震改修・全面的改善暖房設備工事	225,234,000	28.10.18 ～ 30.02.20	一般
48	公営住宅(東雁来団地3号棟)新築エレベーター設備工事	11,232,000	28.10.24 ～ 29.10.31	一般
49	公営住宅(東雁来団地3号棟)新築暖房衛生設備工事	157,686,480	28.10.24 ～ 29.10.31	一般
50	(仮称)札幌緑小学校区多世代交流施設新築冷暖房衛生設備工事	37,187,640	28.11.29 ～ 29.11.20	一般
51	中央図書館・埋蔵文化財センター改修衛生設備工事	181,298,520	29.05.01 ～ 30.03.26	一般
52	北1東15自転車保管場所増築衛生設備工事	25,130,520	29.05.15 ～ 29.12.20	随契
53	もみじの丘小学校給水改修衛生設備工事	93,725,640	29.06.05 ～ 29.11.10	一般
54	中央図書館・埋蔵文化財センター改修空調設備工事	302,160,240	29.06.12 ～ 30.03.26	一般
55	平岡中央中学校給水改修衛生設備工事	99,686,160	29.06.12 ～ 29.11.10	一般
56	(仮称)丘珠縄文遺跡公園ガイダンス施設新築暖房衛生設備工事	15,658,920	29.06.19 ～ 30.01.31	一般
57	前田小学校便所改修衛生設備工事	51,580,800	29.06.19 ～ 29.11.10	一般
58	川下公園リラックスマプラザ空調設備改修工事	13,159,800	29.07.03 ～ 30.01.12	一般
59	前田まちづくりセンターリニューアルほか改修暖房衛生設備工事	8,056,800	29.07.10 ～ 29.10.13	一般
60	公営住宅(山口団地17号棟ほか)給湯暖房設備改修工事	13,899,600	29.11.13 ～ 30.02.15	一般
61	札幌市博物館活動センター換気設備改修工事	1,069,200	29.11.24 ～ 30.01.24	随契
62	中の島小学校改築設備工事監理	13,251,600	28.07.28 ～ 29.08.30	随契

番号	工 事 (業 務) 名	契約金額(円)	工 期	契約方法
63	西2丁目地下歩道情報表示設備ほか設置工事	27,428,760	30.01.16 ～ 30.07.31	一般
64	鉄西まちづくりセンター・鉄西会館リニューアルほか改修電気設備工事	5,032,800	30.06.04 ～ 30.11.20	一般
65	幌西まちづくりセンター・幌西会館リニューアルほか改修電気設備工事	3,942,000	30.06.25 ～ 30.11.30	一般
66	上篠路中学校格技場新築電気設備工事	13,824,000	30.07.02 ～ 31.03.13	一般
67	社会資本整備総合交付金事業 ひのまる公園便所改築電気設備工事	1,533,600	30.04.20 ～ 30.09.10	随契
68	社会資本整備総合交付金事業 西野昭和公園便所改築電気設備工事	1,674,000	30.04.20 ～ 30.08.31	随契
69	産業振興センター構内交換設備改修工事	14,472,000	30.05.28 ～ 30.10.31	一般
70	もみじの丘小学校電気設備改修工事	29,808,000	30.06.11 ～ 30.11.16	一般
71	札幌中学校電気設備改修工事	23,026,680	30.06.25 ～ 30.10.12	一般
72	米里小学校照明改修工事	25,196,400	30.07.24 ～ 30.11.30	一般
73	札幌市本庁舎西2丁目地下歩道接続エレベーター設備工事	13,824,000	29.06.12 ～ 30.07.31	一般
74	桑園小学校増築ほか暖房衛生設備工事	40,575,076	29.07.25 ～ 30.08.10	一般
75	あいの里西小学校小荷物専用昇降機設備改修工事	594,000	30.03.30 ～ 30.06.29	随契
76	社会資本整備総合交付金事業 西野昭和公園便所改築衛生設備工事	4,533,840	30.04.23 ～ 30.08.31	一般
77	社会資本整備総合交付金事業 ひのまる公園便所改築衛生設備工事	4,514,400	30.04.23 ～ 30.09.10	一般
78	円山動物園(仮称)ゾウ舎新築エレベーター設備工事	10,619,640	29.04.10 ～ 30.09.20	一般

番号	工 事 (業 務) 名	契約金額(円)	工 期	契約方法
79	札幌市中央卸売市場水産棟1期GHP室外機冷暖房設備改修工事	116,767,160	30.06.25 ～ 30.11.09	一般
80	社会資本整備総合交付金事業 篠路駅前西公園便所改築衛生設備工事	4,722,840	30.09.25 ～ 31.02.28	一般

中央区 土木部

(土木工事)

番号	工 事 (業 務) 名	契約金額(円)	工 期	契約方法
1	市債務負担行為 西23丁目線(大通北線～南6条線間)舗装路面改良工事	45,551,160	29.02.13 ～ 29.07.22	一般
2	中央区南地区道路区画線塗装工事	36,540,720	29.03.06 ～ 29.06.30	一般
3	南18条線(西14丁目線～西13丁目線間)道路整備工事	24,978,240	29.07.10 ～ 29.10.27	一般
4	競馬場線(桑園北13条中通線～道道下手稲札幌線間)ほか1線舗装路面改良工事	27,105,840	29.07.31 ～ 29.10.28	一般
5	南24条中央線(西13丁目線～西12丁目線間)ほか1線道路整備工事	33,713,280	29.07.25 ～ 29.11.21	一般
6	北5・6西18中通線(北6条線～北5条線間)ほか2線生活道路整備工事	34,689,600	29.08.07 ～ 29.12.25	一般
7	北3西29・30中通線(西30丁目線～北3西29中通線間)ほか3線生活道路整備工事	29,613,600	29.08.07 ～ 29.12.04	一般
8	幌平橋通線(公園東通線～市営住宅2号線間)舗装路面改良工事	12,174,840	29.07.31 ～ 29.10.28	一般
9	北1条中通線(道道札幌停車場線～西3丁目線間)道路改良工事	44,465,760	29.08.07 ～ 29.12.24	一般
10	宮の森ジャンプ競技場防護柵設置工事	6,270,430	29.09.04 ～ 29.12.12	一般
11	幌西西屯田通公園ほか2公園施設改修工事	7,614,000	29.10.02 ～ 30.01.09	一般
12	双子山1丁目1号線(双子山1丁目510番88地先～道道札幌環状線間)ほか1線路線測量	2,626,560	29.07.07 ～ 29.10.04	一般
13	西円山どんぐり公園実施設計	1,537,882	29.09.15 ～ 30.01.31	一般

番号	工 事 (業 務) 名	契約金額(円)	工 期	契約方法
14	市債務負担行為 南6・7条中通線(西18丁目線～西17丁目線間)ほか1線生活道路整備工事	24,126,120	30.02.13 ～ 30.08.11	一般
15	市債務負担行為 南1条西22中通線(西22丁目線～西23丁目線間)生活道路整備工事	10,919,880	30.02.26 ～ 30.07.25	一般
16	宮の森ジャンボ公園ほか1公園施設改修工事	8,844,120	30.04.16 ～ 30.07.14	一般
17	南26条中央線(西10丁目線～西9丁目線間)路線測量	1,204,077	30.06.29 ～ 30.09.06	一般
18	中央区中地区道路維持除雪業務	968,634,720	29.10.01 ～ 30.09.30	一般

西区 土木部

(土木工事)

番号	工 事 (業 務) 名	契約金額(円)	工 期	契約方法
1	市債務負担行為 広島線(西野10条中通線～西野11・12条8丁目線間)舗装路面改良工事	17,517,600	29.02.06 ～ 29.08.04	一般
2	西区道路区画線塗装工事	30,471,120	29.03.06 ～ 29.06.30	一般
3	発寒3条4丁目2号線(発寒第8号線～発寒3条4丁目線間)生活道路整備工事	16,200,000	29.04.24 ～ 29.08.21	一般
4	昭和1号線(右股線～道道西野真駒内清田線間)舗装路面改良工事	14,843,520	29.07.18 ～ 29.10.05	一般
5	西野6条2丁目1号線(西野東19号線～西野東12号線間)ほか1線道路補修工事	10,765,440	29.07.10 ～ 29.09.17	一般
6	発寒第12号線(北発寒第21号線～北発寒第20号線間)舗装改良工事	34,088,040	29.07.10 ～ 29.11.16	一般
7	発寒6条14丁目1号線(宮の沢22号線～宮の沢21号線間)生活道路整備工事	13,060,440	29.07.25 ～ 29.11.01	一般
8	八軒第2号線(八軒第3号線～琴似停車場新琴似線間)舗装路面改良工事	46,276,920	29.07.25 ～ 29.12.11	一般
9	西野東14号線(西野東10号線～学田三号線間)ほか1線生活道路整備工事	14,337,997	29.07.31 ～ 29.11.07	一般
10	茨木東線(国道5号～元市町界線間)道路補修工事	16,262,640	29.08.07 ～ 29.10.25	一般

番号	工 事 (業 務) 名	契約金額(円)	工 期	契約方法
11	発寒6条13丁目4号線(岡崎線～発寒6条13丁目線間)ほか2線道路補修工事	15,602,803	29.08.07 ～ 29.10.25	一般
12	西野11・12条8丁目線(広島線～広島3号線間)舗装路面改良工事	15,064,920	29.08.07 ～ 29.11.04	一般
13	八軒第1連絡線(八軒東12号線～札幌環状線間)舗装路面改良工事	10,464,120	29.08.07 ～ 29.11.04	一般
14	発寒5条3丁目5号線(北発寒線～発寒第1号線間)路線測量	1,213,844	29.08.21 ～ 29.10.29	一般
15	西区管内市設街路灯塗装工事その1	2,322,000	29.08.04 ～ 29.09.22	随契
16	西区管内市設街路灯塗装工事その2	2,160,000	29.09.12 ～ 29.10.31	随契
17	西野風の子公園整備工事	4,027,320	29.09.12 ～ 29.10.31	一般
18	西野北公園施設改修工事	37,528,920	29.06.05 ～ 29.09.02	一般
19	西野第一公園ほか1公園再整備実施設計	3,539,944	29.07.03 ～ 29.11.29	一般
20	市債務負担行為 発寒第87号線(稻荷線～東発寒6号線間)ほか1線生活道路整備工事	21,013,560	29.06.02 ～ 29.12.18	一般
21	琴似3条5丁目1号線(川添線～二十四軒手稲通線間)生活道路整備工事	16,994,880	30.02.13 ～ 30.08.11	一般
22	東発寒2号線(東発寒39号線～発寒10条1丁目2号線間)ほか1線路線測量	1,909,208	30.04.23 ～ 30.08.20	一般
23	鉄興公園施設改修実施設計	2,482,779	30.06.29 ～ 30.08.27	一般
24	西区北地区道路維持除雪業務	795,327,120	30.07.06 ～ 30.10.03	一般

手稲区 土木部

(土木工事)

番号	工 事 (業 務) 名	契約金額(円)	工 期	契約方法
1	手稲区道路区画線塗装工事	25,386,480	29.03.06 ～ 29.06.30	一般

番号	工 事 (業 務) 名	契約金額(円)	工 期	契約方法
2	市債務負担行為 稲穂鉄北線(曙3号南線～稲穂8号線間)舗装路面改良工事	23,114,160	29.02.27 ～ 29.07.26	一般
3	前田2号線(手稲前田583番地地先～前田3号線間)道路排水整備工事	45,139,680	29.07.03 ～ 29.11.29	一般
4	曙87号線(曙2号線～曙3号線間)ほか1号線生活道路整備工事	18,665,640	29.07.03 ～ 29.10.30	一般
5	稲積193号線(稲積196号線～稲積169号線間)生活道路整備工事	15,934,320	29.07.10 ～ 29.10.17	一般
6	緑園団地8号線(星置104号線～土功排水沿3号線間)生活道路整備工事	16,322,040	29.07.10 ～ 29.10.17	一般
7	曙5号線(曙7号線～曙4号線間)ほか1号線道路補修工事	17,847,000	29.08.28 ～ 29.11.25	一般
8	稲積23号線(稲積南3号線～道道下手稲札幌線間)道路補修工事	29,938,680	29.08.21 ～ 29.11.28	一般
9	曙8号線(前田町有地線～前田西12号線間)ほか2号線歩道補修工事	2,288,520	29.10.30 ～ 29.12.08	随契
10	(仮称)前田2条10丁目公園造成工事	6,383,464	29.05.29 ～ 29.08.26	一般
11	富丘東公園ほか5公園改修工事	32,052,240	29.08.07 ～ 29.10.25	一般
12	金山キャラバン公園ほか4公園改修工事	63,831,240	29.08.07 ～ 29.10.25	一般
13	手稲区管内市設街路灯塗装工事	1,566,000	29.10.04 ～ 29.11.17	随契
14	前田82号線(稲山5号線～手稲稲山連絡線間)ほか1号線路線測量	1,402,790	29.08.04 ～ 29.11.01	一般
15	稲穂ライラック公園ほか4公園改修実施設計	4,953,814	29.12.22 ～ 30.03.20	一般
16	市債務負担行為 曙43号線(曙39号線～稲山線間)ほか2号線舗装路面改良工事	21,480,120	30.02.05 ～ 30.08.03	一般
17	市債務負担行為 緑園団地1号線(星置104号線～土功排水沿3号線間)生活道路整備工事	16,106,800	30.03.19 ～ 30.08.25	一般

番号	工 事 (業 務) 名	契約金額(円)	工 期	契約方法
18	星置27号線（星置20号線～星置東線間）ほか1線道路補修工事	12,184,560	30.06.25 ～ 30.09.25	一般
19	手稲区南地区道路維持除雪業務	811,830,600	29.10.01 ～ 30.09.30	一般

注：本表における契約方法の標記については、下記のとおり省略している。

- ・一般競争入札 ⇒ 一般
- ・指名競争入札 ⇒ 指名
- ・随意契約 ⇒ 随契
