

# 水道工事事務発生状況


2026年2月27日  
札幌市水道局工事安全管理委員会

## 1. 労働災害

事故の型	年度別件数										
	H28	H29	H30	R元	R2	R3	R4	R5	R6	R7	計
墜落、転落		1					1	2	2	2	8
転倒	1			3							4
激突									1		1
飛来、落下								1	1		2
崩壊、倒壊											0
激突され					2						2
はさまれ、巻き込まれ	1	1	1	1	2	2	1			1	10
その他	1						1	2	2		6
合計	3	2	1	4	4	2	3	5	6	3	33

## 2. 公衆災害

事故の型・事故対象物	年度別件数										
	H28	H29	H30	R元	R2	R3	R4	R5	R6	R7	計
人身事故	墜落、転落						1				1
	転倒							1		1	2
	激突										0
	飛来、落下										0
	崩壊、倒壊										0
	激突され										0
	はさまれ、巻き込まれ										0
その他											0
小計	0	0	0	1	0	0	1	1	0	0	3
物損事故	一般車両の損傷	2	5	1			3	1		3	16
	その他一般所有物件の損傷		1				2			3	6
	水道管（地下埋設）の損傷	1	1		1	1	1	1	1	1	6
	水道以外の地下埋設物の損傷		2	3	7	5	6	10	5	5	47
	水道以外の地上公共物の損傷	1			5	2	1	1	2	1	3
	その他水道施設設備の損傷	1	1								1
	小計	5	10	4	13	8	13	13	8	14	14
合計	5	10	4	14	8	13	14	9	14	14	105

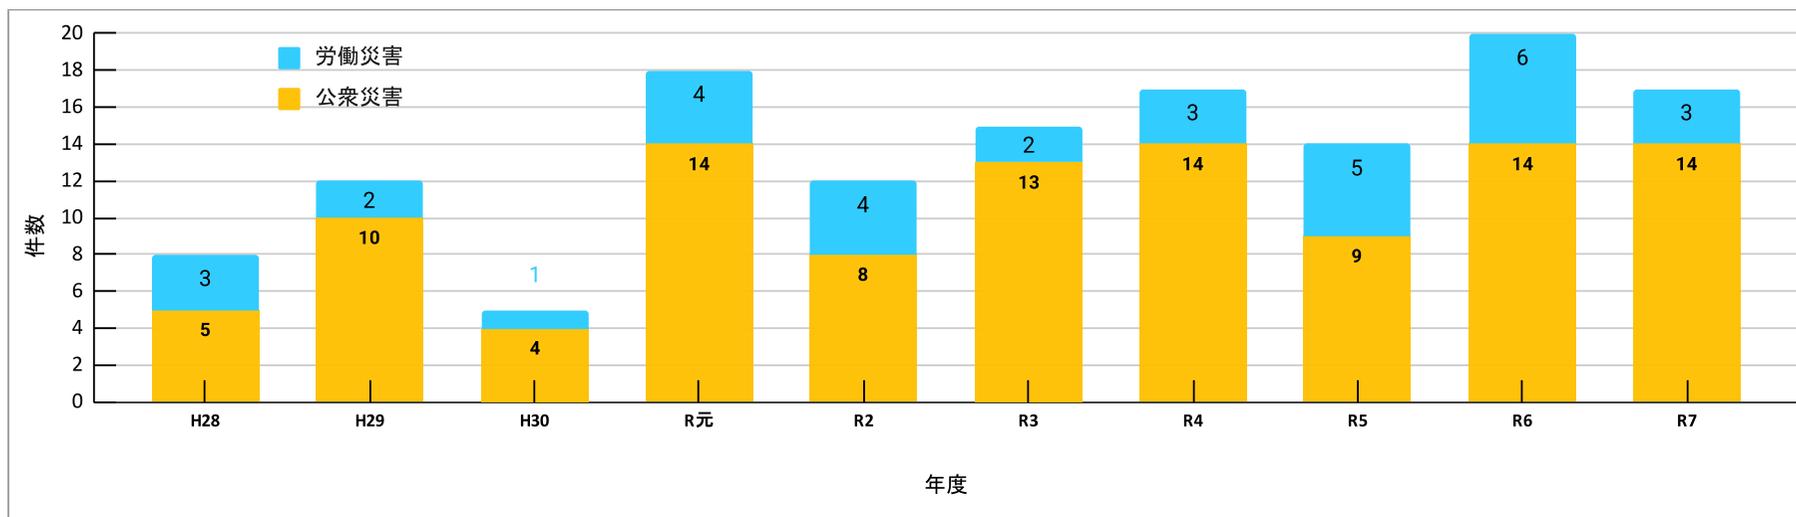

# 水道工事事故事例集

2026年2月27日

## 1. 労働災害（過去10年間の水道工事における事故内容）

札幌市水道局工事安全管理委員会

年度	No.	発生年月日	人身/物損	被災人数	事故の型	起因物	事故概要	災害発生概況
R7	1	2025年6月27日	人身事故	重症1名	墜落・転落	クレーン付きトラック	転落による人身事故	引込管とつながった消火栓をクレーン付きトラックに積込むため荷台の上で作業を行っていた被災者が、吊荷に押され荷台から転落し負傷した。
	2	2025年9月22日	人身事故	軽傷1名	墜落・転落	ダンプトラック	転落による人身事故	工事範囲内の法面崩壊箇所の補修のため、大型土嚢を油圧ショベルにて10tダンプトラックに積み込みしようとしていた際、荷台上で作業をしていた被災者がバランスを崩し、ダンプトラックから転落し、地上に設置していた単管バリケードに右肩後方を強打し負傷した。
	3	2025年11月25日	人身事故	重症1名	はさまれ・巻き込まれ	タイヤローラ	タイヤローラによる人身事故	舗装復旧の転圧作業中、後進したタイヤローラが、住民対応のため作業区域内に入ってしまった交通誘導警備員を轢過し、負傷した。
R6	4	2024年6月12日	人身事故	軽傷1名	その他	工具	工具の落下により下部の作業員が	立坑内にて人力掘削作業を行い、作業完了後に梯子で地上に上がる際、地上にいる作業員にスコップを手渡したところ、地上の作業員が誤ってスコップを落下させ、約70cm下の被災者の左肩に当たった。
	5	2024年6月21日	人身事故	軽傷3名	その他	-	立坑内作業による酸素欠乏	立坑内にてエンジンカッターを使用し、既設管の切断作業を作業員3名で行っていたところ、換気が不十分であったため、一酸化炭素濃度が高くなり、全員が体調不良を訴えた。うち1名が病院に救急搬送されたものの、全員、当日中に回復した。
	6	2024年7月4日	人身事故	軽傷1名	墜落・転落	-	不安定な足場上から転落し負傷	立坑内にてφ500の既設配水管に上り、ライナープレートの撤去補助作業を行っていたところ、管上から滑り落ち、着地時に右足首を負傷した。
	7	2024年11月8日	人身事故	重傷1名	はさまれ・巻き込まれ	-	吊り荷に指を挟まれ負傷	新設管布設のためクレーン付きトラックからφ100の鋳鉄管2本を同時に吊り降ろそうとしたところ、玉掛中の管がぐらつき、作業員の指が2本の管の間に挟まれ、負傷及び骨折した。
	8	2024年11月15日	人身事故	重傷1名	その他	エンジンカッター	管切断時に足を負傷	エンジンカッターによる既設配水管の切断作業を行っていたところ、カッターの刃が管の切り口に挟まり、刃先を取ろうとした際、反動で左足の甲に刃先が触れて負傷した。
	9	2025年3月21日	人身事故	軽傷1名	激突	吊り下げボルト	ケーブルラックの吊り下げボルト端部に頭をぶ	沈でん池排泥弁の試験作業中、ヘルメットがケーブルラックに繰り返し当たったため、ヘルメットを脱いで作業を続行したところ、頭上のケーブルラック吊り下げボルトに右側頭部ぶつけ負傷した。
R5	10	2023年5月19日	人身事故	軽傷1名	その他	-	段差降下時に膝を負傷	コンクリート養生状態確認のため、排泥池内部のピット下に降りる際に、約70cmの段差を足の屈伸運動のみで降下し、右膝を負傷した。
	11	2023年6月12日	人身事故	重傷1名	転倒	-	転倒により指を負傷	柵の蓋が開いていることを失念しており、付近を通過した際につまずき転倒し、右足中指・薬指を骨折した。

# 水道工事事故事例集

2026年2月27日

## 1. 労働災害（過去10年間の水道工事における事故内容）

札幌市水道局工事安全管理委員会

年度	No.	発生年月日	人身/物損	被災人数	事故の型	起因物	事故概要	災害発生概況
	12	2023年8月24日	人身事故	軽傷1名	その他	-	熱中症により転倒	作業員が立坑の上で管口閉塞作業の準備中、熱中症により意識が低下したことで転倒し、ライナープレートの天端に目蓋があたり負傷した。
	13	2023年9月13日	人身事故	軽傷1名	転倒	-	転倒により頭部を負傷	4tユニックからプラスチック敷板を荷下ろししていた際、吊荷が荷崩れし、周辺にいた被災者が手で押さえたが、耐え切れず後方に転倒し、頭部をアスファルトに打ち付け負傷した。
	14	2023年11月9日	人身事故	重傷1名	飛来・落下	溝形鋼	溝形鋼が落下し足を負傷	溝形鋼（約90kg）を作業員2人で持って移動する際に、片側の作業員の手がすべり被災者の足に落下し、負傷した。
R4	15	2022年10月12日	人身事故	重傷1名	転落	外壁の崩壊	転落により負傷	階段のコンクリートを打設中、先行して打設完了していた外壁が倒れ、作業員が外壁と一緒に倒れた方向に転落し負傷した。
	16	2022年11月14日	人身事故	軽傷1名	火傷	バーナー	バーナーにより負傷	既設舗装と新設舗装のジョイント部をコテ仕上げ作業を行っていたところ、バーナーの火が一瞬燃え上がり、作業員が負傷した。
	17	2022年11月21日	人身事故	軽傷1名	はさまれ・巻き込まれ	舗装片	落下物により手を負傷	作業員が、重機で撤去しきれない小さな舗装片を集めていたところ、誤って重機の作業半径内に進入し、バケットからこぼれた舗装片が作業員の右手に落下し、負傷した。
R3	18	2021年9月17日	人身事故	重傷1名	はさまれ・巻き込まれ	トラック	車両に挟まれ負傷	埋戻材を積んだ4tトラックがバックで搬入した際に、電柱に接近したため停止を指示したが気づかず、交通誘導員が電柱とダンプトラックの間に右腕を挟まれ負傷した。
	19	2022年1月31日	人身事故	重傷1名	はさまれ・巻き込まれ	トラック	車両に挟まれ負傷	インクラインにて移動中に、荷台からはみ出していたトラック後方部と坑口構台が接触し、トラックが転回、作業員がトラックと手摺に挟まれ負傷した。
R2	20	2020年5月25日	人身事故	軽傷1名	はさまれ・巻き込まれ	その他	舗装殻に指を挟み負傷	配水管布設後の縁石復旧・仮舗装のかけ直し作業中、バックホウで破碎した舗装殻を作業員が人力でバックホウのバケットに積み込む際に、左手中指を舗装殻とバケットとの間に挟んで骨折した。
	21	2020年6月11日	人身事故	死亡1名 軽傷1名	激突され／墜落・転落	掘削機	立坑に転落した機械の下敷きになり死亡	弁室設置に伴う立坑掘削のため、バックホウの後ろ側を立坑部に寄せて作業をしていた際、バックホウが前進しようとして前方のダンプに追突ようになり、ギアをニュートラルに入れようとしたが誤ってバックに入り、後ろの掘削穴に転落し、オペレーターの負傷とともに、立坑の中で床均し等をしていた作業員がバックホウの下敷きになった。
	22	2020年9月8日	人身事故	重傷1名	激突され	人力機械工具	エンジンカッターにより顎を負傷	翌日の作業準備のため、土場にて一人で鑄鉄管をエンジンカッターで切断作業中、カッターが跳ね上がって刃力バー部分が作業員の顎部に当たり負傷した。

# 水道工事事故事例集

2026年2月27日

## 1. 労働災害（過去10年間の水道工事における事故内容）

札幌市水道局工事安全管理委員会

年度	No.	発生年月日	人身/物損	被災人数	事故の型	起因物	事故概要	災害発生概況
	23	2020年10月8日	人身事故	重傷1名	はさまれ・巻き込まれ	掘削機	建設機械に足をひかれ負傷	配水管布設に伴う仮舗装作業のため待機していたバックホウの後方で歩行者の誘導を行っていた交通誘導警備員が、後退してきたバックホウに右足甲をひかれて負傷した。
R1	24	2019年4月10日	人身事故	重傷1名	転倒	その他	転倒により肩を負傷	導水路坑内（RCセグメント部・内径φ2200mm）において配線の撤去作業を行うため、作業員が坑内を2輪自転車で移動中、右側へ転倒して右肩腱板を断裂した。
	25	2019年5月29日	人身事故	重傷1名	転倒	コンクリート打設機	転倒により耳を負傷	取水口の底部コンクリート打設作業中、ホース内の生コンが詰まったため、作業員がホースを揺らしたところ、生コンが吐出し、ホースの荷振れにバランスを崩して転倒し、突出した鉄筋に左耳をぶつけて耳介不全断裂等を生じた。
	26	2019年6月1日	人身事故	重傷1名	はさまれ・巻き込まれ	掘削機	建設機械に足をひかれ負傷	配水管布設に伴い不要になった切管をミニバックホウにより移動式クレーン車へ積み込み作業中、バックホウが移動したため、切管を押さえていた作業員の右足の上にキャタピラが乗っかり負傷した。
	27	2019年11月16日	人身事故	重傷1名	転倒	その他	転倒により胸を負傷	配水池改修工事において、ブルーシートで養生していた屋根の除雪作業中に足を滑らせて転倒し、腰袋に胸部を強打して肋骨を骨折した。
H30	28	2018年9月18日	人身事故	重傷2名	はさまれ・巻き込まれ	掘削機	建設機械に挟まれ腰を負傷	下り勾配の車道においてバックホウで管布設の掘削作業をしていたところ、バックホウが下り方向に動き出し、掘削穴に作業員2名がいたため、1名がバックホウのバケットと掘削穴の間に挟まれ（骨盤骨折、出血性ショック等）、もう1名も作業員と衝突（肋骨骨折）した。
H29	29	2017年6月10日	人身事故	重傷1名	はさまれ・巻き込まれ	その他の一般動力機械	建設機械に挟まれ指を負傷	坑内切羽部セグメント組立作業中に、ローラー上に左手を添えていたが搬送していたセグメントピースに気付かず、搬送ローラーとセグメントピースの間に左手小指を挟まれ不全切断した。（全治3ヶ月）
	30	2017年11月25日	人身事故	重傷1名	墜落・転落	掘削機	転落により足を負傷	管布設作業中に、配管作業員がバックホウと深さ約1.8mの掘削箇所とのわずかな隙間を通行しようとした際に掘削床に転落し、左大腿骨を骨折した。
H28	31	2016年5月23日	人身事故	軽傷1名	転倒	掘削機	転倒により手首を負傷	工事区域内の車道部でバックホウにて舗装版をはぎとった後、そこにできた段差で作業員が足を踏み外し、転倒して左手首を骨折した。
	32	2016年6月16日	人身事故	重傷1名	はさまれ・巻き込まれ	その他の一般動力機械	建設機械に挟まれ胸を負傷	シールドトンネル内の泥水ポンプ増設に伴い、乾式トランス（重量約1.5t）の設置作業を行っていた時に、かさ上げ用のコマ材（H200）がずれたため、作業員が修正するため斜め吊りしたトランスとレールの間に不用意に立ち入り、その際レバーブロックのフックが外れてトランスとレールの間に上半身が挟まれ肋骨を骨折した。
	33	2016年8月3日	人身事故	軽傷1名	その他	その他	体調の異変	休憩直前に体調の異変を本人が感じたが、休憩までわずかだったので、そのまま作業を続け、休憩時間に休憩所にて発症した。

# 水道工事事故事例集

2026年2月27日

## 2. 公衆災害（過去10年間の水道工事における事故内容）

札幌市水道局工事安全管理委員会

年度	No.	発生年月日	人身/物損	被災人数	事故の型	起因物	事故概要	災害発生概況
R7	1	2025年5月13日	物損事故	-	その他	掘削機	分水栓折損	新設配水管布設のため重機で掘削作業中、玉石（直径50cm）を掘り起こす際に玉石が既設分水栓に接触し、分水栓が破損した。事故により、破損個所の住宅1軒が断水となった。
	2	2025年5月14日	物損事故	-	その他	掘削機	給水管折損	新設管布設箇所の試験掘削作業中、バックホウ（0.1m3級）のバケットが水道給水管（Peφ20）に接触し破損した。事故により、破損個所の住宅1軒が断水となった。
	3	2025年5月15日	物損事故	-	その他	掘削機	ガス引込管折損	試験作業中に手掘りにてガス本管（φ50）（土被り約1.2m）を確認したため、ガス引き込み管も同じ深さに埋設されていると予想し、また、土質も玉石が多く発生していたことから、手掘りではなく重機を使い発生土を除去したところ、ガス引込管
	4	2025年5月19日	物損事故	-	その他	掘削機	ガス引込管折損	配水管φ100を布設するため、車道内を掘削作業中に、ガス引込管（残置管）を破損した。
	5	2025年5月21日	物損事故	-	その他	掘削機	ガス引込管折損	配水管φ100を布設するため、車道内を掘削作業中に、ガス引込管（φ25）を破損した。
	6	2025年6月11日	物損事故	-	その他	ダンプトラック	NTT柱折損	ダンプトラックが転回のため後進中、NTT柱に接触し折損した。
	7	2025年8月22日	物損事故	-	その他	塗装用ローラー	一般車両及び塀の損傷	消火栓塗装工事にて上塗り作業中に塗料が飛散し、地先の一般車両及び塀に塗料が付着し損傷した。
	8	2025年8月28日	物損事故	-	その他	掘削機	配水補助管折損	配水補助管PeHφ50の布設のため重機で掘削作業中、切替予定箇所の既設配水補助管Peφ50にバケットが接触し破損した。事故により、戸建て住宅7軒が断水となった。
	9	2025年9月1日	物損事故	-	その他	掘削機	ガス引込管折損	給水管の継替をするため、宅地内の掘削作業中に、ガス引込管（φ25、予定栓）を破損した。
	10	2025年9月2日	物損事故	-	その他	掘削機	配水管折損	配水管φ300布設のため重機で掘削作業中、既設配水管φ350にバケットが接触し破損した。事故による濁水・断水は無し。
	11	2025年9月3日	物損事故	-	その他	スコップ	給水管折損	人力による試験作業中、スコップにて給水管（Peφ25）を破損した。事故により、破損個所の住宅1軒が断水となった。
	12	2025年9月3日	物損事故	-	その他	掘削機	北電架空線	立坑埋戻し作業中、バックホウを回転させた際に北電架空線（宅内への引込線）に接触し切断した。

# 水道工事事故事例集

2026年2月27日

## 2. 公衆災害（過去10年間の水道工事における事故内容）

札幌市水道局工事安全管理委員会

年度	No.	発生年月日	人身/物損	被災人数	事故の型	起因物	事故概要	災害発生概況
	13	2025年9月12日	物損事故	-	その他	掘削機	配水補助管折損	重機による管路掘削作業中、既設配水補助管にバケットが接触し破損した。事故により、24栓が断水となった。
	14	2026年1月14日	物損事故	-	その他	ダンプトラック	NTT柱折損	残土仮置場に残土を降ろした後、荷台を下げるのを失念し、そのまま仮置場から公道に出た際、NTT架空線に接触した。その後、荷台に架空線が引っ掛かったことに気付かず走行したため、架空線及びその先のNTT柱がトラックに引っ張られ、NTT柱を損傷した。
R6	15	2024年4月12日	物損事故	-	その他	掘削機	下水道管の折損	過去に実施した工事において、φ100新設配水管布設のため掘削したところ、当該下水道汚水取付管を折損させた。
	16	2024年5月29日	物損事故	-	その他	-	一般車両の損傷	覆工板の段差により、走行している車両が衝撃を受け右前タイヤが破損した。
	17	2024年6月11日	物損事故	-	その他	掘削機	街路灯の損傷	歩道上の街路灯に近接した箇所で、バックホウによる管路掘削を行っていたところ、バックホウを旋回した際に、バケットが街路灯に接触し、街路灯のアーム及び照明器具を損傷させた。
	18	2024年6月13日	物損事故	-	その他	掘削機	NTT架線の損傷	バックホウによる舗装撤去を行っていたところ、バケットがNTT架線に接触し、架線を損傷（架線のたるみ）させた。
	19	2024年6月19日	物損事故	-	その他	推進機	配水管の折損	φ350の新設配水管を推進工法にて布設していたところ、推進機がφ200の既設配水管を折損し、工事沿線住戸等において断濁水及び出水不良を発生させた。
	20	2024年7月11日	物損事故	-	その他	舗装カッター	RHの切断	歩道上の通信装置盤更新に伴う既設舗装版を切断していたところ、歩道前面の民間事業者が所有するロードヒーティング設備を切断した。
	21	2024年7月17日	物損事故	-	その他	掘削機	ガス管の折損	バックホウによる掘削作業を行っていたところ、バケットがφ50ガス管の閉止キャップ部に接触し、1 cm程度の亀裂を生じさせた。
	22	2024年7月26日	物損事故	-	その他	掘削機	NTT柱の損傷	バックホウによる舗装版撤去作業を行っていたところ、後退した際に排土板の端部がNTT柱に接触し、損傷させた。
	23	2024年8月2日	物損事故	-	その他	2tトラック	一般車両の損傷	工事規制内に移動しようとしたトラック(作業車)が、進路を誤ったため後退したところ、後ろから来た一般車両と接触し、損傷させた。

# 水道工事事故事例集

2026年2月27日

## 2. 公衆災害（過去10年間の水道工事における事故内容）

札幌市水道局工事安全管理委員会

年度	No.	発生年月日	人身/物損	被災人数	事故の型	起因物	事故概要	災害発生概況	
	24	2024年9月12日	物損事故	-	その他	掘削機	ガス管の折損	バックホウによる掘削作業を行っていたところ、バケットが想定と異なる位置に布設されていたφ75のガス管に接触し、折損させた。	
	25	2024年9月30日	物損事故	-	その他	削孔機	電気ケーブルの損傷	ケミカルアンカー設置のためドリルによる既設躯体の削孔作業を行っていたところ、躯体内に布設されていた電気ケーブルを損傷させた。	
	26	2024年10月18日	物損事故	-	その他	掘削機	NTTケーブルの損傷	バックホウによる既設配水管撤去の掘削作業を行っていたところ、バケットが配水管に近接して布設されていたVPφ50のNTTケーブルに接触し、外装管及びケーブル被覆を損傷させた。	
	27	2024年10月30日	物損事故	-	その他	掘削機	ガス管の折損	バックホウによる給水管布設の掘削作業を行っていたところ、バケットがφ30のガス管に接触し、損傷させた。	
	28	2024年11月12日	物損事故	-	その他	-	一般車両の損傷	交通開放後の仮舗装にわだちが生じ、一般車両の前方バンパーに接触し、損傷させた。	
	R5	29	2023年7月10日	物損事故	-	-	樹木	NTTケーブルの切断	伐開作業中に架空線のない山側に倒木した際、枝木が折れバウンドし、架空線（NTTケーブル）を切断した。
	30	2023年7月11日	物損事故	-	-	掘削機	ガス管の折損	既設水道管閉塞のため車道を掘削中、φ50ガス管にバケットが接触し破損させた。	
	31	2023年7月26日	物損事故	-	-	掘削機	ガス管の折損	φ200既設水道管を撤去作業中、人力掘削をしていたが、バケットに土砂を積込み、ダンプに積込みを行おうとしたところ、未掘削部分にバケットのツメが刺さり、地中のガス管を損傷した	
32	2023年9月20日	物損事故	-	-	掘削機	NTTケーブルの切断	撤去管堀上のための掘削作業中、配水管上（離隔約8cm）に埋設されたNTTケーブルをバックホウで損傷した。		
33	2023年9月27日	物損事故	-	-	アスファルトフィニッシャー	電柱、消火栓、標識の損傷	工事現場での舗装作業を終了後、アスファルトフィニッシャーを機械置場へ回送する際、運転操作を誤ったことにより、進行方向左側歩道部に設置されていた北電柱を破損し、また消火栓・消火栓標識柱を倒壊させた。		
34	2023年9月29日	物損事故	-	-	アスファルトカッター	RHの切断	舗装切断時、民地内のロードヒーティングを破損させた。		
35	2023年10月12日	物損事故	-	-	掘削機	給水管の折損	切替箇所付近をバックホウで掘削していたところ、管理図には記載の無い給水分岐があり、φ50給水管を折損させた。		

# 水道工事事故事例集

2026年2月27日

## 2. 公衆災害（過去10年間の水道工事における事故内容）

札幌市水道局工事安全管理委員会

年度	No.	発生年月日	人身/物損	被災人数	事故の型	起因物	事故概要	災害発生概況
	36	2023年10月13日	物損事故	-	-	ダンプトラック	電柱の損傷	現場付近の生活道路において4 tダンプがUターンする際、ギアの操作を誤り（1速にしたつもりがバックにしてしまった）電柱に衝突し破損させた。
	37	2023年11月15日	人身事故	軽傷1名	転倒	その他	転落による人身事故	仮設歩行者通路を自転車が走行した際に、コーンバーからはみ出していた資材にペダルが当たってしまい、バランスを崩し転倒した。
R4	38	2022年6月8日	物損事故	-	-	掘削機	ガス管の折損	人力掘削を主体とし、発生土をガス管付近に配置したバケットに積み込みしていたが、バケットを上げた際バックホウのアームと看板が接触しそうになり、回避しようとした際にガス管付近の確認を怠り、破損させた。
	39	2022年6月14日	物損事故	-	-	掘削機	ガス管の折損	給水管布設のため、歩道をバックホウで掘削中、φ30ガス管が想定していない位置に埋設されていたため接触し、破損させた。
	40	2022年7月4日	物損事故	-	-	掘削機	ガス管の折損	配水管布設のため、車道をバックホウで掘削中、φ150ガス管の上面突起物とバケットが接触し、破損させた。
	41	2022年7月5日	物損事故	-	-	掘削機	電線の切断	既設給水管撤去のため、歩道部をバックホウで掘削中、北電電線管を持ち上げてしまい、切断した。
	42	2022年7月18日	人身事故	軽傷1名	転落	掘削開口部	転落による人身事故	自転車で乗った被災者が工事区域内に侵入し、路床掘削前の開口部（幅80cm×長さ2m×深さ35cm）に誤って転落し、負傷した。
	43	2022年7月19日	物損事故	-	-	トラック	擁壁の損傷	トレーラーが後進にて進入時、進路を変更しようとして切り替えした際、トレーラーの荷台側面再度バンパーが、侵入防止チェーン取付ポール、チェーン収納カゴ及び擁壁に接触し、破損させた。
	44	2022年7月20日	物損事故	-	-	掘削機	ガス管の折損	配水補助管の切替作業を行うため、車道部をバックホウで掘削作業中、図面と異なる位置に埋設されていたφ50ガス管に接触し、破損させた。
	45	2022年7月28日	物損事故	-	-	掘削機	仕切弁の損傷	合図者が不在中にバックホウで埋戻しを行い、誤って既設の水道仕切弁のスピンドル部に接触し破損させた。
	46	2022年9月6日	物損事故	-	-	その他	一般車両の損傷	歩道上に設置されていたセーフティーコーンが突風により車道に移動し、走行車両に接触、バンパーを破損させた。
	47	2022年9月7日	物損事故	-	-	掘削機	ガス管の折損	廃止水道管の撤去のため、歩道をバックホウにて掘削中、φ25ガス管が車道部よりも浅い位置に埋設されていたため接触し、破損させた。

# 水道工事事故事例集

2026年2月27日

## 2. 公衆災害（過去10年間の水道工事における事故内容）

札幌市水道局工事安全管理委員会

年度	No.	発生年月日	人身/物損	被災人数	事故の型	起因物	事故概要	災害発生概況
	48	2022年9月27日	物損事故	-	-	その他	NTTケーブルの折損	給水管の継替工を貫孔にて施工した際、刃先が目標より下方向だったため、NTTケーブルのさや管（塩ビ）に接触し破損させた。
	49	2022年10月13日	物損事故	-	-	クローラ クレーン	高圧電線に接触	クレーンにて資材を施設内に搬入中、計画と逆方向に回転したことで高圧電線に接触し漏電、一部の地域で停電が発生した。
	50	2022年10月14日	物損事故	-	-	掘削機	ガス管の折損	配水管布設のため、北ガスによるマーキング位置の周辺を人力掘削したが確認できず、引き続き慎重に機械掘削を行ったところ、想定よりも浅い位置に埋設されていたため接触し、破損させた。
	51	2022年12月9日	物損事故	-	-	掘削機	ガス管の折損	配水管敷設のため、車道部をバックホウにて掘削中、ガス管が想定よりも浅い位置に埋設されていたため接触し、破損させた。
R3	52	2021年4月15日	物損事故	-	-	掘削機	街路灯用地中埋設ケーブルの切断	建柱作業のため建柱車により掘削作業を行っていたところ、街路灯用ケーブルが地中に埋設されていることに気づかず誤って切断した。
	53	2021年4月22日	物損事故	-	-	掘削機	ガス管の折損	配水管布設のため車道を掘削中、φ150ガス管が試掘により想定していた位置と異なる位置に埋設されていたため、バックホウにより破損させた。
	54	2021年5月16日	物損事故	-	-	仮復旧	一般車両の損傷	施工後、仮復旧と既舗装に5cm程度の段差が生じたため、通行した車両のホイールとタイヤが破損した。
	55	2021年5月19日	物損事故	-	-	掘削機	駐車場看板の破損	舗装復旧のため歩道部の舗装を撤去していたところ、回転時にバックホウの右側後方にあった駐車場看板と接触して破損させた。
	56	2021年7月20日	物損事故	-	-	掘削機	ガス管の折損	配水管布設のため車道をバックホウで掘削中、バケットの先端が、想定より浅い位置(0.7m)に埋設されていたガス供給管に接触し、破損させた。
	57	2021年7月28日	物損事故	-	-	掘削機	国道排水管の凍結防止ケーブル切断	舗装復旧時にダンプトラックから舗装合材をバックホウにて投入する作業中、回転時に誤って架空ケーブルに接触し切断した。
	58	2021年8月27日	物損事故	-	-	掘削機	ガス管の折損	給水管継替工のため歩道を掘削中、バケットの先端が、想定より浅い位置(0.8m)に埋設されていたガス供給管に接触し、破損させた。
	59	2021年9月7日	物損事故	-	-	その他	一般車両の損傷	洗管作業時に排水先の雨水桝取付管から洗管水が漏水し、廻りの土砂を引き込んだことが原因で道路が約35cm陥没したため、通行した車両が一部損傷した。

# 水道工事事故事例集

2026年2月27日

## 2. 公衆災害（過去10年間の水道工事における事故内容）

札幌市水道局工事安全管理委員会

年度	No.	発生年月日	人身/物損	被災人数	事故の型	起因物	事故概要	災害発生概況
	60	2021年9月22日	物損事故	-	-	掘削機	水道管の折損	配水管布設のための掘削作業中、埋設シートが確認されたにもかかわらず、バックホウによる掘削を続けた結果、φ50既設管を損傷した。
	61	2021年10月1日	物損事故	-	-	掘削機	ガス管の折損	PeHの切替作業のため手掘作業中、スコップの先端がガス管（φ50鋳鉄管）のクランプ部に接触し、ズレが生じたためガス漏れが発生した。
	62	2021年11月4日	物損事故	-	-	掘削機	ガス管の折損	既設管撤去のため掘削作業中、図面に記載されていたφ25ガス管が埋設されていることを失念したため注意が疎かとなり、バックホウにより破損させた。
	63	2021年11月9日	物損事故	-	-	その他	一般車両の損傷	一般車両が敷地内に入るため施工区域内を横切ろうとしたところ、交通誘導員の指示に気づかず侵入したため、管路埋戻中の開口部に左前輪が脱輪し、タイヤとホイールが破損した。
	64	2021年12月1日	物損事故	-	-	トラック	門扉フェンスの損傷	撤去品の搬出作業のため敷地内に4t ユニク車で入場したところ、別途工事により受枠まで露出していた弁室マンホール蓋に気を取られ周囲への注意が疎かとなり、車両後方部が門扉フェンスに接触し損傷した。
R2	65	2020年4月16日	物損事故	-	-	掘削機	通信ケーブル架空線の損傷	取水堰新設に伴う右岸下流の工事用斜路整形作業中、バックホウのブームを上げた際に警報通信ケーブルの架空線に接触し切断させた。
	66	2020年8月26日	物損事故	-	-	掘削機	ガス管の折損	既設水道管の自然漏水を修繕するため、当初掘削予定のない箇所をバックホウにて掘削作業中、バケットがφ50ガス管に接触し損傷させた。
	67	2020年9月3日	物損事故	-	-	掘削機	歩行者信号機の損傷	配水管布設に伴う仮復旧用の舗装材をバックホウで路盤上に運ぶ際、バックホウのアームが横断歩道の歩行者信号機に接触し、ケーブルがショートして交差点内の歩車道信号機の機能を停止させた。
	68	2020年9月9日	物損事故	-	-	掘削機	ガス管の折損	既設配水管の撤去のためバックホウにて掘削作業中、バケットがφ30ガス管に接触し変形させた。
	69	2020年9月23日	物損事故	-	-	掘削機	街路灯ケーブルの損傷	夜間作業による国道での配水管布設作業中、バックホウのバケットで街路灯ケーブルの入った電線管を引っ張り、近傍箇所のケーブルが断線して街路灯6基を消灯させた。
	70	2020年10月21日	物損事故	-	-	掘削機	ガス管の折損	配水管布設のため車道を掘削中、付近の埋設引込管に比べて浅く埋設されていたガス引込管にバックホウのバケットが接触し損傷させた。
	71	2020年11月5日	物損事故	-	-	掘削機	水道管の折損	通信装置盤基礎部の撤去・新設のためバックホウによる歩道の掘削を行っていたところ、公園のφ20水道引込管をバケットで破損し漏水させた。

# 水道工事事故事例集

2026年2月27日

## 2. 公衆災害（過去10年間の水道工事における事故内容）

札幌市水道局工事安全管理委員会

年度	No.	発生年月日	人身/物損	被災人数	事故の型	起因物	事故概要	災害発生概況
	72	2020年11月18日	物損事故	-	-	掘削機	ガス管の折損	配水管布設に伴う既設消火栓部の撤去作業中、バックホウのバケットと消火栓及び消火栓ポールとの接触防止に意識が集中し、バケットがφ50ガス管に接触し損傷させた。
R1	73	2019年5月15日	物損事故	-	-	掘削機	水道管の折損	配水管布設時に、既設管理設深までバックホウにより掘削を行ったため、φ50ポリエチレン管を切断した。
	74	2019年6月4日	物損事故	-	-	トラック	信号柱の損傷	配水管布設に伴う掘削土の運搬のため、ダンプトラックが規制帯から走行車線に入ろうと後退した際、誤って信号柱に接触し、信号柱を損傷させた。
	75	2019年6月12日	物損事故	-	-	貫孔機	ガス引込管の損傷	配水管布設に伴う給水管継替において宅地内を貫孔作業中、貫孔機がガス引込管に接触し損傷させた。
	76	2019年6月12日	物損事故	-	-	掘削機	規制標識の損傷	配水管布設後の埋戻作業中、バックホウのアームが電柱添架の規制標識に接触し、標識を損傷させた。
	77	2019年6月20日	物損事故	-	-	掘削機	街路灯ケーブルの損傷	配水管布設のための掘削作業中、街路灯ケーブルの埋設シートを確認したが、掘削位置と異なることからそのまま掘削したところ、ケーブルが曲がって埋設されており、バックホウのバケットでケーブルを切断させた。
	78	2019年6月25日	人身事故	軽傷1名	転倒	その他	転倒により頭部および膝を負傷	横断歩道部での配水管布設後の仮復旧箇所が沈下して1cm程の段差が生じ、通行人がつまずいて転倒し、頭部および膝を負傷した。
	79	2019年7月2日	物損事故	-	-	掘削機	NTT架空線の損傷	配水管布設に伴う舗装版撤去・積込作業時、バックホウのアームがNTT架空線に接触し、架空線を切断させた。
	80	2019年10月11日	物損事故	-	-	貫孔機	ガス管の折損	配水管布設に伴う給水管継替において宅地内を貫孔作業中、貫孔機がガス引込管φ25に接触し損傷させた。
	81	2019年10月16日	物損事故	-	-	掘削機	ガス管の折損	配水管布設に伴う給水管継替において掘削作業中、バックホウのバケットがガス管φ25の取出し部に接触し、損傷させた。
	82	2019年10月16日	物損事故	-	-	掘削機	ガス管の折損	配水管切替部の掘削作業中、バックホウのバケットでφ50ガス管を破損させた。
83	2019年10月28日	物損事故	-	-	掘削機	ガス管の折損	配水管布設のための掘削作業中、バックホウのバケットがφ25ガス管の取出し部に接触し、損傷させた。	

# 水道工事事故事例集

2026年2月27日

## 2. 公衆災害（過去10年間の水道工事における事故内容）

札幌市水道局工事安全管理委員会

年度	No.	発生年月日	人身/物損	被災人数	事故の型	起因物	事故概要	災害発生概況
	84	2019年10月29日	物損事故	-	-	掘削機	NTT架空線の損傷	水道施設外柵整備のための歩道路盤掘削時に、北電柱に共架しているNTTの光ケーブルの支線ワイヤーにバックホウのバケットが接触し、ワイヤーを切断させた。
	85	2019年11月8日	物損事故	-	-	掘削機	ガス管の折損	給水管布設のための掘削作業中、バックホウのバケットでφ50ガス管を破損させた。
	86	2019年11月21日	物損事故	-	-	掘削機	光回線架空線の損傷	管路布設作業中に、バックホウのアームが道路を横断している光回線引込架空線に接触し、回線を切断させた。
H30	87	2018年6月4日	物損事故	-	-	仮設柵蓋	一般車両の損傷	車道走行車線に設置していた仮設の柵蓋が軽いなどの原因により、一般車両が通過した際に蓋が浮き上がり、車両の後方バンパーに接触して損傷させた。
	88	2018年10月4日	物損事故	-	-	掘削機	電気ケーブルの損傷	集水柵設置のため浄水場内において掘削中、1.15mの深さに埋設されていた電線鞘管1条をバックホウのバケットで引っ掛け、中に入っていたケーブル5本のうち3本（火災報知器掲示板ケーブル・火災報知器基盤ケーブル・音声ケーブル）の被覆を損傷
	89	2018年10月6日	物損事故	-	-	掘削機	NTTケーブルの損傷	L型擁壁撤去のためバックホウで掘削中、埋設されていた電線管5条の内2条（内1条は予備管）に接触し破損させ、中にあったNTT通信用ケーブル1本を損傷させた。
	90	2018年11月16日	物損事故	-	-	舗装切断機	RH配管の損傷	通信装置盤の電源線及び管路の更新に伴う歩道部の舗装切断時に、ロードヒーティングの調査を見落としていたため、その配管4本を切断した。
H29	91	2017年5月16日	物損事故	-	-	その他の一般動力機械	一般所有物件の損傷	給水管継替工事に係る宅地内舗装復旧中に、ミニタイヤショベルがカーポート支柱に接触して損傷させた。
	92	2017年5月19日	物損事故	-	-	覆工板・敷鉄板	一般車両の損傷	地先マンション住民が駐車場から車両にて外出する際、車両前部バンパー下と駐車場出口部の歩道に敷いていた敷鉄板が接触し、バンパーが損傷した。
	93	2017年6月30日	物損事故	-	-	その他	一般車両の損傷	給水管布設完了後、交通誘導員が工事車両等の誘導中に一般車両が工事区域内に進入し、開口部に落下して脱輪してフロントバンパーを損傷した。
	94	2017年7月26日	物損事故	-	-	トラック	一般車両の損傷	PeH管布設時、搬入トラックが規制内に停車し助手席のドアを開けたところ、隣に停車中の一般車両のサイドミラーに接触し損傷させた。
	95	2017年8月3日	物損事故	-	-	掘削機	ガス管の折損	新設管埋設のための掘削中、再生骨材 I 型の層のすぐ下（土被り0.5m）に埋設されていたガス引込管φ25をバックホウにて折損した。

# 水道工事事故事例集

2026年2月27日

## 2. 公衆災害（過去10年間の水道工事における事故内容）

札幌市水道局工事安全管理委員会

年度	No.	発生年月日	人身/物損	被災人数	事故の型	起因物	事故概要	災害発生概況
	96	2017年8月10日	物損事故	-	-	掘削機	水道管の折損	試掘調査時に、既設管埋設深までバックホウにより掘削を行ったため、φ50ポリエチレン管を切断した。
	97	2017年8月31日	物損事故	-	-	覆工板・敷鉄板	一般車両の損傷	立坑を路面覆工で交通解放中、路面覆工の舗装擦り付け部が陥没し、少なくとも2台の一般車両が通過の際にタイヤ及びホイールなどが破損した。
	98	2017年8月31日	物損事故	-	-	その他の一般動力機械	一般車両の損傷	庁舎の改修工事でコンクリートを研った際、飛散したコンクリート粉塵が隣の駐車場に駐車中の一般車両（新車）のボディー面に付着し、トランク部分が損傷した。
	99	2017年9月29日	物損事故	-	-	鋼矢板	電力ケーブルの損傷	割T字管及び不断水式仕切弁設置のため、配水池場内を掘削し軽量鋼矢板での土留作業を行っていたところ、鋼矢板により高圧電力ケーブルを損傷させた。
	100	2017年11月21日	物損事故	-	-	その他の一般動力機械	水道施設設備の損傷	現場事務所前の坂道において車両を後退させたところ、積雪によりスリップし、後方フェンスに衝突してフェンスを損傷させた。
H28	101	2016年4月19日	物損事故	-	-	掘削機	水道施設設備の損傷	既設構造物撤去のため、バックホウで躯体を持ち上げた際、地下に埋設されていた平岸配水池のテレメーターケーブルに接触、切断した。これにより水位計の監視が不可となった。
	102	2016年5月31日	物損事故	-	-	仮復旧	一般車両の損傷	試掘作業を終えて舗装で仮復旧を行い交通を解放したが、当該箇所を通行した際に道路が陥没し、車両のタイヤが陥没箇所に落ちてタイヤがパンクしたとともに車両が損傷した。
	103	2016年8月19日	物損事故	-	-	掘削機	水道管の折損	コンクリート塀の新設のため基礎工事の根堀中に庁舎内へ給水する給水管 P e (50) を折損した。
	104	2016年11月7日	物損事故	-	-	その他	一般車両の損傷	被害者が交通規制区域内のアパート駐車場に進入する際に交通誘導員が保安施設を外して車両を誘導していたところ、その車両が大きく膨らんで曲がり、掘削箇所に脱輪し、バンパーを損傷した。
	105	2016年12月24日	物損事故	-	-	掘削機	NTT引込線の切断	現場内にてバックホー（0.45m3クレーン）の移動中（自走）に、市道上を横断しているNTTの架空線にブーム上部を引っかけて引込み線を切断した。
