


豊平川中継ポンプ場

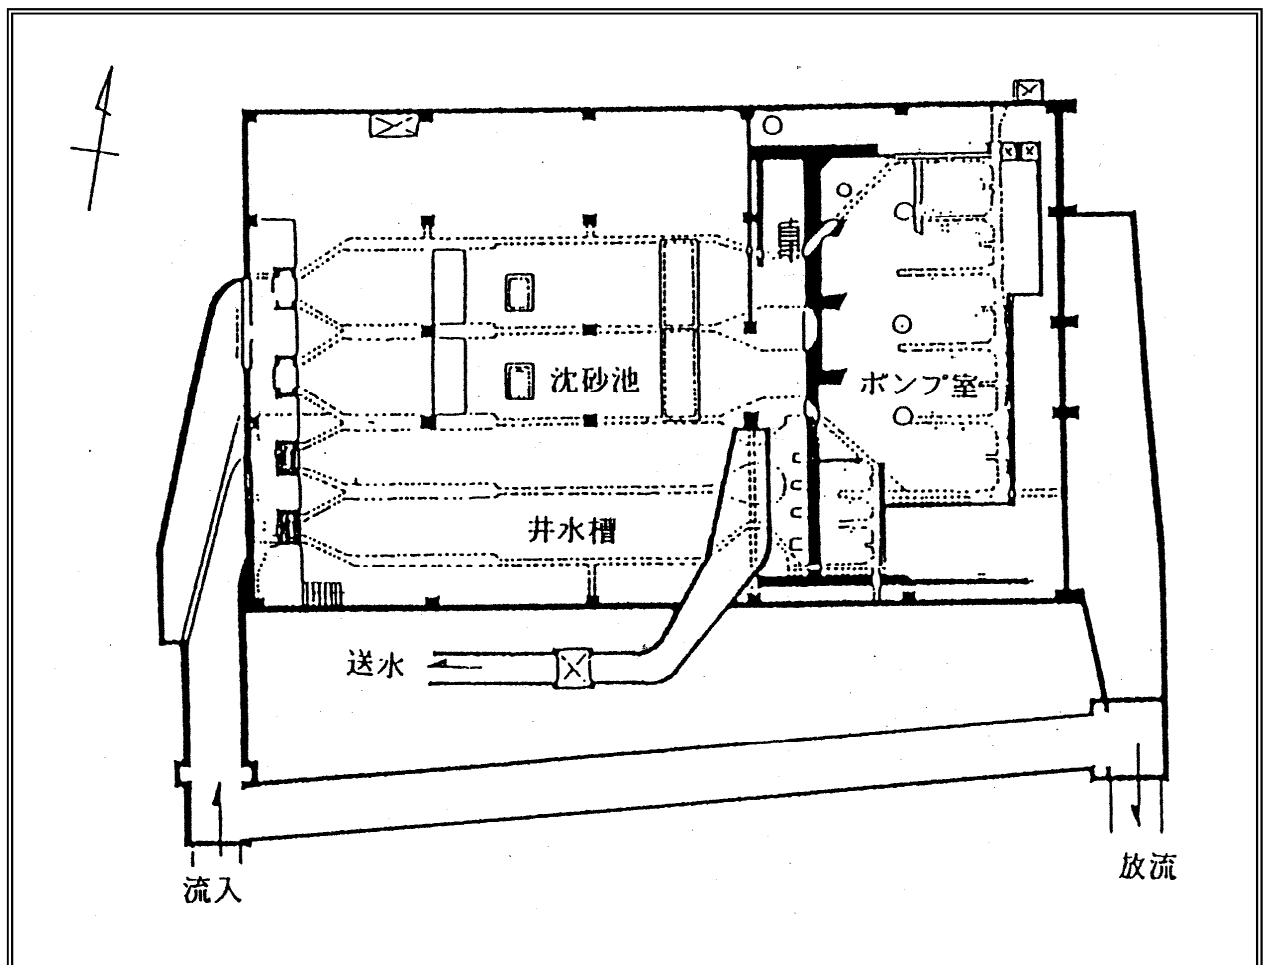

1 運 転 実 績 調

(1) 揚 水 量 等

月	降水量	総 揚 水 量		雨水放水量(雨水ポンプ)			送 水 量	
	mm/月	月量(m ³)	日量(m ³)	日数	月量(m ³)	日量(m ³)	月量(m ³)	日量(m ³)
4	37.0	14,010	470	2	10,000	330	4,010	140
5	38.0	21,270	690	2	19,300	620	1,970	70
6	36.0	41,470	1,380	2	39,100	1,300	2,370	80
7	125.0	235,010	7,580	2	230,800	7,450	4,210	130
8	117.0	170,100	5,490	6	160,200	5,170	9,900	320
9	73.0	138,150	4,610	2	135,100	4,500	3,050	110
10	143.0	172,280	5,560	7	161,300	5,200	10,980	360
11	126.0	29,260	980	4	22,100	740	7,160	240
12	54.0	620	20	0	0	0	620	20
1	68.5	620	20	0	0	0	620	20
2	118.0	600	20	0	0	0	600	20
3	94.5	11,270	360	1	8,400	270	2,870	90
合 計	1,030.0	834,660	—	28	786,300	—	48,360	—
平 均	85.8	69,560	2,290	2	65,530	2,160	4,030	130
最 大	7/28 67.5	—	7/28 153,660	—	—	7/28 152,400	—	8/13 2,410
最 小	—	—	—	—	—	—	—	—

月	動力別揚水量 (m ³)			沈砂・スクリーンかす量(m ³)		
	電動機のかす量	エンジンの揚水量	計	沈砂	スクリーンかす	計
4	11,410	2,600	14,010	0.0	0.0	0.0
5	12,470	8,800	21,270	0.0	0.0	0.0
6	15,070	26,400	41,470	0.0	0.0	0.0
7	62,610	172,400	235,010	0.0	0.0	0.0
8	66,800	103,300	170,100	0.0	0.0	0.0
9	28,250	109,900	138,150	0.0	0.0	0.0
10	89,880	82,400	172,280	0.0	0.0	0.0
11	24,460	4,800	29,260	0.0	0.0	0.0
12	620	0	620	0.0	0.0	0.0
1	620	0	620	0.0	0.0	0.0
2	600	0	600	0.0	0.0	0.0
3	6,470	4,800	11,270	2.5	0.2	2.7
合 計	319,260	515,400	834,660	2.5	0.2	2.7
平 均	26,610	42,950	69,560	0.2	0.0	0.2
最 大	8/27 34,110	7/28 122,800	—	—	—	—
最 小	—	—	—	—	—	—

(2) 運 転 時 間

月	送水ポンプ運転時間(h)			雨水ポンプ運転時間(h)			
	雨水ポンプ井 排水ポンプ 1.5 m ³ /分	電動 φ 400 29 m ³ /分	計	電動 φ 700 60 m ³ /分		エンジンNo. 1 φ 1, 200 204 m ³ /分	
				実運転	試運転	実運転	試運転
4	16.9	1.3	18.2	1.9	0.0	0.0	0.5
5	10.9	0.4	11.3	2.7	0.0	0.0	0.5
6	10.7	1.0	11.7	3.0	0.0	0.0	0.5
7	24.6	1.0	25.6	14.2	0.0	4.3	0.5
8	44.6	2.8	47.4	13.7	0.0	0.0	0.5
9	19.4	0.9	20.3	5.8	0.0	3.1	0.5
10	56.5	2.7	59.2	19.2	0.0	0.0	0.6
11	31.6	2.0	33.6	4.3	0.0	0.0	0.5
12	2.4	0.3	2.7	0.0	0.0	0.0	0.5
1	2.5	0.2	2.7	0.0	0.0	0.0	0.5
2	2.2	0.2	2.4	0.0	0.0	0.0	0.5
3	18.5	0.7	19.2	0.9	0.0	0.0	0.5
合計	240.8	13.5	254.3	65.7	0.0	7.4	6.1
平均	20.1	1.1	21.2	5.5	0.0	0.6	0.5
最大	56.5	2.8	59.2	19.2	0.0	4.3	0.6
最小	2.2	0.2	2.4	0.0	0.0	0.0	0.5

月	雨水ポンプ運転時間(h)						自家発電機 運転時間(h) 625 kVA	
	エンジンNo. 2 φ 1, 200 204 m³/分		エンジンNo. 3 φ 1, 200 204 m³/分		計			
	実運転	試運転	実運転	試運転	実運転	試運転	実運転	試運転
4	1.0	0.5	0.0	0.5	2.9	1.5	0.0	0.5
5	2.1	0.5	0.0	0.5	4.8	1.5	0.0	0.5
6	3.0	0.5	0.4	0.5	6.4	1.5	0.0	0.5
7	12.9	0.5	2.3	0.5	33.7	1.5	0.0	0.5
8	11.1	0.5	2.6	0.5	27.4	1.5	0.0	0.5
9	5.6	0.5	0.8	0.5	15.3	1.5	0.0	0.5
10	13.7	0.5	0.5	0.5	33.4	1.6	0.0	0.5
11	2.3	0.5	0.0	0.5	6.6	1.5	0.0	0.7
12	0.0	0.5	0.0	0.5	0.0	1.5	0.0	0.6
1	0.0	0.5	0.0	0.5	0.0	1.5	0.0	0.5
2	0.0	0.5	0.0	0.5	0.0	1.5	0.0	0.5
3	0.8	0.5	0.0	0.5	1.7	1.5	0.0	0.5
合計	52.5	6.0	6.6	6.0	132.2	18.1	0.0	6.3
平均	4.4	0.5	0.6	0.5	11.0	1.5	0.0	0.5
最大	13.7	0.5	2.6	0.5	33.7	1.6	0.0	0.7
最小	0.0	0.5	0.0	0.5	0.0	1.5	0.0	0.5

(3) 電 力 量

月	動 力							
	水 処 理							
	揚 水							
	送 水 ポ ン プ				雨 水 ポ ン プ			
	水 量 (m ³)	買 電 (kWh)	発 電 (kWh)	使用量 ／水量	水 量 (m ³)	買 電 (kWh)	発 電 (kWh)	使用量 ／水量
4	4,010	201	0	0.0501	7,400	216	0	0.0292
5	1,970	102	0	0.0518	10,500	279	0	0.0266
6	2,370	132	0	0.0557	12,700	308	0	0.0243
7	4,210	236	0	0.0561	58,400	1,439	0	0.0246
8	9,900	479	0	0.0484	56,900	1,415	0	0.0249
9	3,050	192	0	0.0630	25,200	594	0	0.0236
10	10,980	559	0	0.0509	78,900	1,915	0	0.0243
11	7,160	352	0	0.0492	17,300	495	0	0.0286
12	620	38	0	0.0613	0	0	0	—
1	620	29	0	0.0468	0	0	0	—
2	600	37	0	0.0617	0	0	0	—
3	2,870	181	0	0.0631	3,600	108	0	0.0300
合計	48,360	2,538	0	—	270,900	6,769	0	—
平均	4,030	212	0	0.0525	22,580	564	0	0.0250
最大	10,980	559	—	0.0631	78,900	1,915	—	0.0300
最小	600	29	—	0.0468	0	0	—	0.0236

月	水 処 理		光熱水費	合 計			
	そ の 他						
	買 電 (kWh)	発 電 (kWh)		買 電 (kWh)	買 電 (kWh)	発 電 (kWh)	使 用 量 (kWh)
4	7,295	0	2,570	10,282	0	10,282	0
5	7,031	0	1,700	9,112	0	9,112	0
6	7,253	0	1,680	9,373	0	9,373	0
7	8,581	0	1,650	11,906	0	11,906	0
8	8,577	0	1,710	12,181	0	12,181	0
9	7,588	0	1,600	9,974	0	9,974	0
10	7,583	0	1,810	11,867	0	11,867	0
11	6,534	0	3,620	11,001	0	11,001	0
12	8,790	0	4,400	13,228	0	13,228	0
1	10,068	0	4,750	14,847	0	14,847	0
2	9,394	0	4,250	13,681	0	13,681	0
3	9,469	0	5,100	14,858	0	14,858	0
合計	98,163	0	34,840	142,310	0	142,310	0
平均	8,180	0	2,903	11,859	0	11,859	0
最大	10,068	—	5,100	14,858	—	14,858	—
最小	6,534	—	1,600	9,112	—	9,112	—

(4) 灯油使用量・その他（用水）

月	灯 油							
	動				力			
	雨 水 ポ ン プ				自家発電機		合 計	
	水 量 (m^3)	燃料使用量(L)		使 用 量 ／ 水 量	燃料使用量(L)		使用量(L)	
		実運転	試運転		実運転	試運転	実運転	試運転
4	2,600	116	176	0.0446	0	84	116	260
5	8,800	285	178	0.0324	0	81	285	259
6	26,400	524	178	0.0198	0	86	524	264
7	172,400	3,303	178	0.0192	0	83	3,303	261
8	103,300	2,115	180	0.0205	0	85	2,115	265
9	109,900	1,736	176	0.0158	0	85	1,736	261
10	82,400	2,001	180	0.0243	0	84	2,001	264
11	4,800	282	176	0.0588	0	120	282	296
12	0	0	182	—	0	101	0	283
1	0	0	184	—	0	87	0	271
2	0	0	176	—	0	88	0	264
3	4,800	111	171	0.0231	0	91	111	262
合計	515,400	10,473	2,135	—	0	1,075	10,473	3,210
平均	42,950	873	178	0.0245	0	90	873	268
最大	172,400	3,303	184	0.0588	0	120	3,303	296
最小	0	0	171	0.0158	0	81	0	259

月	そ の 他	
	用 水	
	水 道 水	井 戸 水
	使 用 量 (m^3)	使 用 量 (m^3)
4	0	284
5	0	336
6	0	257
7	1	863
8	0	1,071
9	1	547
10	1	1,727
11	2	460
12	0	152
1	0	3
2	0	0
3	0	173
合計	5	5,873
平均	0	489
最大	2	1,727
最小	0	0

2 決 算 状 況 調

(1) 処理区分別決算内訳

(単位 円)

項 目	管 理 費	水 処 理 費	計	比 率
職 員 数	0 人	0 人	0 人	-
給 料	0	0	0	0.0%
手 当 等	0	0	0	0.0%
法 定 福 利 費	0	0	0	0.0%
人 件 費 計	0	0	0	0.0%
被 服 費	0	0	0	0.0%
備 消 耗 品 費	0	0	0	0.0%
光 熱 水 費	0	0	0	0.0%
印 刷 製 本 費	0	0	0	0.0%
通 信 運 搬 費	0	-	0	0.0%
賃 借 料	0	0	0	0.0%
手 数 料	0	-	0	0.0%
委 託 料	0	0	0	0.0%
修 繕 費	0	94,565,922	94,565,922	93.1%
動 力 費	0	6,968,344	6,968,344	6.9%
薬 品 費	0	0	0	0.0%
損 害 保 険 料	0	0	0	0.0%
負 担 金	0	0	0	0.0%
自 動 車 重 量 税	0	0	0	0.0%
経 費 計	0	101,534,266	101,534,266	100.0%
合 計	0	101,534,266	101,534,266	100.0%
比 率	0.0%	100.0%	100.0%	-

(2) 修繕工事内訳

直 接 修 繕

場所	区分	修 繕 件 名	金額 (千円)	工 期	修 繕 内 容
		なし			
計			0		

区 分 別 集 計	A	0 件	0 千円	建物
	B	0 件	0 千円	構築物
	C	0 件	0 千円	機械及び装置
	D	0 件	0 千円	車両運搬具
	E	0 件	0 千円	工具及び備品

請 負 修 繕

場所	区分	修 繕 件 名	金額 (千円)	工 期	修 繕 内 容
沈砂池・ポンプ	A	豊平川中継ポンプ場ホッパー室シャッター修理	30	2025 3/25 ~ 2025 3/27	シャッター箱パネル改修
	C	豊平川中継ポンプ場ホッパー排水受樋修繕工事	2,086	2025 2/4 ~ 2025 3/21	排水受樋の交換
その他	A	豊平川中継ポンプ場ほか外部改修工事	71,934	2024 6/10 ~ 2025 1/29	屋上防水・外部改修
	C	創成川水再生プラザ受配電施設コンデンサ盤ほか修繕工事	20,031	2024 8/26 ~ 2025 3/12	コンデンサ等交換
計			94,081		

区 分 別 集 計	A	2 件	71,964 千円	建物
	B	0 件	0 千円	構築物
	C	2 件	22,117 千円	機械及び装置
	D	0 件	0 千円	車両運搬具
	E	0 件	0 千円	工具及び備品
