



改修範囲：1,130㎡
内訳：立上り面40㎡、平面1,090㎡

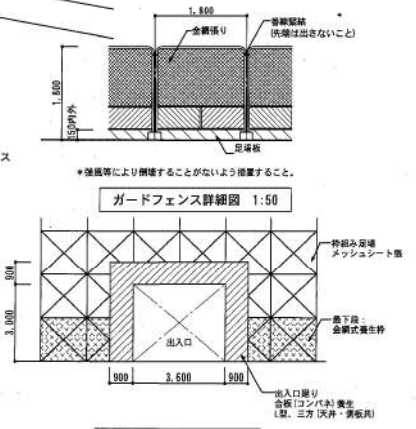

- 特記事項
- 神籠外部足場 (H=900)：手摺先行足場 頂部安全手摺 ネット状養生シート、金網式養生シート (H=1,800) 出入口戸建設付
 - 神籠外部足場 (H=900)：手摺先行足場 頂部安全手摺 (下地調整材7% 2ヶ箇所) 防炎シート (H=800)
 - 仮設敷き鉄板：1,524×6,096×t22 106枚 (工事完了内に撤去)
 - www クロスゲート：WS.0×H.8
 - ガードフェンス：H=1.8m L=455.8m + L=15.8m = L=472.7m
 - ▲ 出入口廻り合板養生
 - ▲ 敷地内出入口
 - ▲ 移動天文車出入口
 - ▲ 工事車両経路
 - ⊗ 交通監視員
1. 仮設足場計画は参考図とする。
 2. 工事資材搬入の使用、公園内の工事車両通行時には、随時交通安全員を配置し安全に努めること。
 3. 手摺先行足場 頂部安全手摺 2段 H=1,200とする。
 4. 資材等の取扱いに注意し、落下防止に努める事。
 5. 工事完了時は敷地内の作業ヤード車両通行等による公園内で破損した部分の現状復旧を行うこと。
 6. 防水の上に足場を設置する時は、防水層を傷つけないように適切に養生する事。
 7. 公園内歩道上敷鉄板について、防滑処理と段差解消を行う。
 8. 東西通行動線を使用して搬出入時等を行う場合は監督員と協議による



外部仮設平面図 1:300

工事名 青少年科学館改修工事	図面名 外部仮設計画図	縮尺 A1=1:300 A3=1:600	設計年月日 令和4年3月	担当	株式会社 アリス設計 〒005-6801 札幌市南区川沿1条3丁目1番27号 TEL 011-871-1601 FAX 011-871-1688	一級建築士 第116427号 江野 紳	図面番号 A-71
-------------------	----------------	----------------------------	-----------------	----	--	------------------------	--------------
