


# 定山溪中継ポンプ場



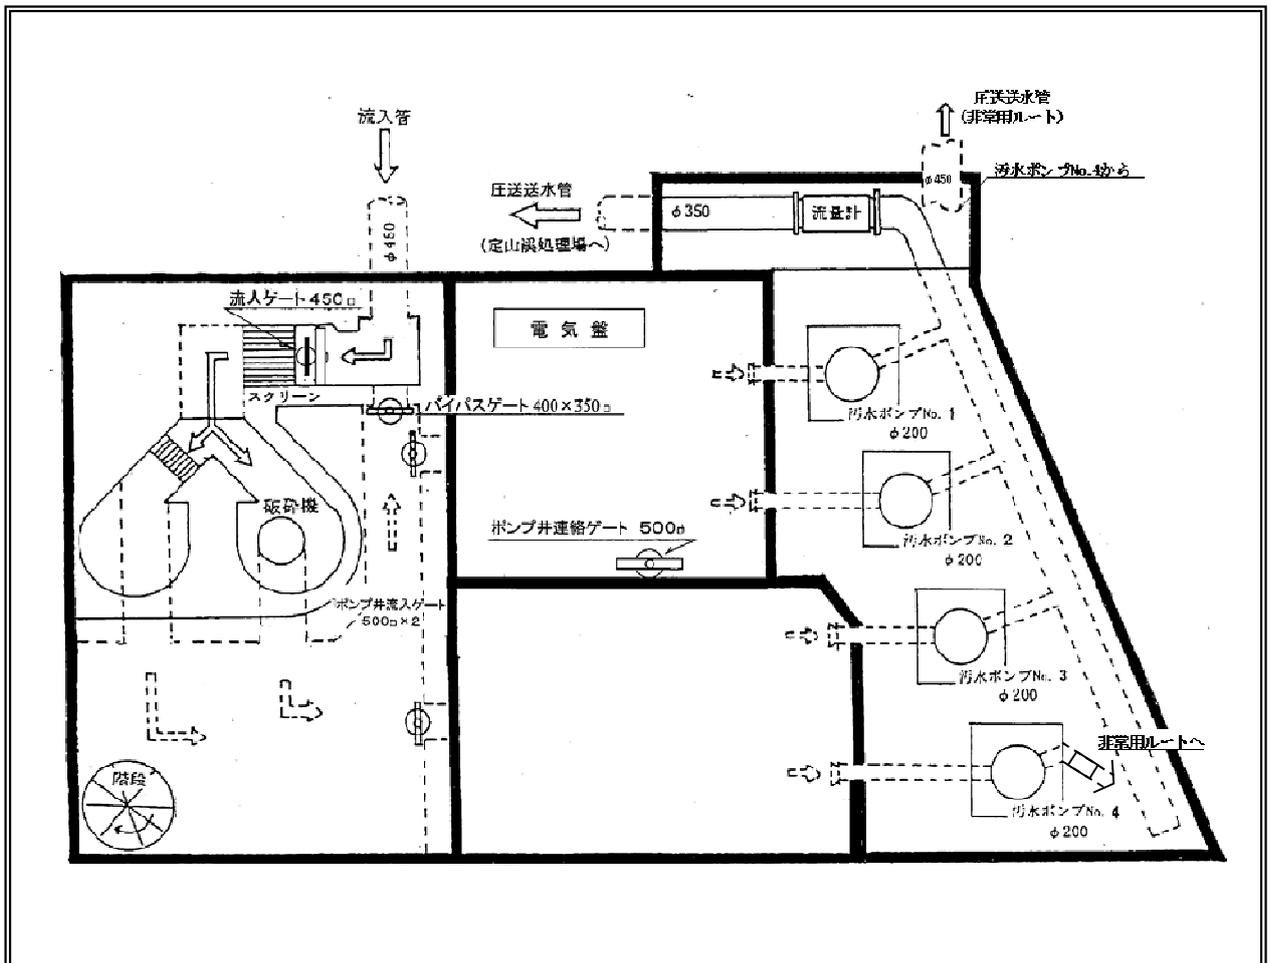

## 1 運 転 実 績 調

## (1) 揚水量等

| 月  | 降水量<br>(mm/月)  | 総揚水量 (送水量) |                | 晴天時汚水量    |               | 電動機<br>による<br>揚水量<br>( $m^3$ ) | 沈砂・スクリーンかす量     |                      |                |
|----|----------------|------------|----------------|-----------|---------------|--------------------------------|-----------------|----------------------|----------------|
|    |                | ( $m^3$ )  |                | ( $m^3$ ) |               |                                | 沈砂<br>( $m^3$ ) | スクリーンかす<br>( $m^3$ ) | 計<br>( $m^3$ ) |
|    |                | 月量         | 日量             | 月量        | 日量            |                                |                 |                      |                |
| 4  | 87.0           | 96,080     | 3,200          | 90,600    | 3,020         | 96,080                         | 0               | 0                    | 0              |
| 5  | 23.5           | 88,320     | 2,850          | 88,040    | 2,840         | 88,320                         | 0               | 0                    | 0              |
| 6  | 93.0           | 88,160     | 2,940          | 87,300    | 2,910         | 88,160                         | 0               | 0                    | 0              |
| 7  | 58.5           | 84,940     | 2,740          | 84,010    | 2,710         | 84,940                         | 0               | 0                    | 0              |
| 8  | 86.0           | 84,310     | 2,720          | 82,770    | 2,670         | 84,310                         | 0               | 0                    | 0              |
| 9  | 161.0          | 80,900     | 2,700          | 78,000    | 2,600         | 80,900                         | 0               | 0                    | 0              |
| 10 | 165.0          | 98,290     | 3,170          | 98,270    | 3,170         | 98,290                         | 0               | 0                    | 0              |
| 11 | 221.0          | 103,790    | 3,460          | 96,900    | 3,230         | 103,790                        | 0               | 0                    | 0              |
| 12 | 50.0           | 106,690    | 3,440          | 104,780   | 3,380         | 106,690                        | 0               | 0                    | 0              |
| 1  | 137.0          | 103,210    | 3,330          | 103,210   | 3,360         | 103,210                        | 0               | 0                    | 0              |
| 2  | 31.0           | 97,190     | 3,350          | 93,670    | 3,230         | 97,190                         | 0               | 0                    | 0              |
| 3  | 59.0           | 102,600    | 3,310          | 100,130   | 3,230         | 102,600                        | 0               | 0                    | 0              |
| 合計 | 1,172.0        | 1,134,480  | —              | 1,107,680 | —             | 1,134,480                      | 0               | 0                    | 0              |
| 平均 | 97.7           | 94,540     | 3,100          | 92,310    | 3,030         | 94,540                         | 0               | 0                    | 0              |
| 最大 | 11/17<br>106.0 | —          | 11/17<br>5,380 | —         | 1/2<br>3,560  | 11/17<br>5,380                 | —               | —                    | —              |
| 最小 | —              | —          | 5/8<br>2,320   | —         | 9/11<br>2,470 | 5/8<br>2,320                   | —               | —                    | —              |

## (2) 運転時間

| 月  | 汚水ポンプ運転時間 (h)<br>4.33 $m^3$ /分×4台 |         |         |       |         | 自家用発電機<br>運転時間(h)<br>500 kVA |     |     |
|----|-----------------------------------|---------|---------|-------|---------|------------------------------|-----|-----|
|    | No. 1                             | No. 2   | No. 3   | No. 4 | 計       | 実運転                          | 試運転 | 計   |
|    | 4                                 | 291.6   | 0.0     | 39.2  | 275.7   | 606.5                        | 0.0 | 0.3 |
| 5  | 6.8                               | 203.4   | 357.5   | 0.4   | 568.1   | 0.0                          | 0.5 | 0.5 |
| 6  | 334.9                             | 296.8   | 7.4     | 0.0   | 639.1   | 0.0                          | 0.7 | 0.7 |
| 7  | 326.5                             | 42.6    | 318.1   | 0.2   | 687.4   | 0.0                          | 0.2 | 0.2 |
| 8  | 9.6                               | 250.7   | 352.4   | 0.0   | 612.7   | 0.0                          | 0.6 | 0.6 |
| 9  | 336.1                             | 277.9   | 7.0     | 0.6   | 621.6   | 0.0                          | 0.1 | 0.1 |
| 10 | 374.9                             | 23.4    | 317.9   | 0.0   | 716.2   | 0.0                          | 0.3 | 0.3 |
| 11 | 9.8                               | 284.4   | 368.8   | 0.1   | 663.1   | 0.0                          | 2.3 | 2.3 |
| 12 | 334.5                             | 367.7   | 8.1     | 0.0   | 710.3   | 0.0                          | 0.2 | 0.2 |
| 1  | 0.3                               | 78.9    | 263.4   | 333.0 | 675.6   | 0.0                          | 0.4 | 0.4 |
| 2  | 298.6                             | 269.0   | 0.0     | 5.8   | 573.4   | 0.0                          | 0.2 | 0.2 |
| 3  | 0.3                               | 5.1     | 239.6   | 355.7 | 600.7   | 0.0                          | 0.2 | 0.2 |
| 合計 | 2,323.9                           | 2,099.9 | 2,279.4 | 971.5 | 7,674.7 | 0.0                          | 6.0 | 6.0 |
| 平均 | 138.6                             | 175.0   | 190.0   | 81.0  | 639.6   | 0.0                          | 0.5 | 0.5 |
| 最大 | 369.7                             | 367.7   | 368.8   | 355.7 | 716.2   | 0.0                          | 2.3 | 2.3 |
| 最小 | 0.3                               | 0.0     | 0.0     | 0.0   | 568.1   | 0.0                          | 0.1 | 0.1 |

## (3) 電力使用量等

| 月  | 電 力 量        |              |            |              |              |              |              |               |
|----|--------------|--------------|------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|
|    | 動 力 費        |              |            |              |              |              |              |               |
|    | 汚 水 ポ ン プ    |              |            | そ の 他        |              | 合 計          |              |               |
|    | 買 電<br>(kWh) | 発 電<br>(kWh) | 使用量<br>/水量 | 買 電<br>(kWh) | 発 電<br>(kWh) | 買 電<br>(kWh) | 発 電<br>(kWh) | 使用量計<br>(kWh) |
| 4  | 15,740       | 0            | 0.1638     | 5,144        | 0            | 20,884       | 0            | 20,884        |
| 5  | 15,970       | 0            | 0.1808     | 5,814        | 0            | 21,784       | 0            | 21,784        |
| 6  | 16,170       | 0            | 0.1834     | 6,247        | 0            | 22,417       | 0            | 22,417        |
| 7  | 17,060       | 0            | 0.2008     | 7,490        | 0            | 24,550       | 0            | 24,550        |
| 8  | 15,899       | 21           | 0.1888     | 8,224        | 0            | 24,123       | 21           | 24,144        |
| 9  | 15,360       | 0            | 0.1899     | 6,868        | 0            | 22,228       | 0            | 22,228        |
| 10 | 18,960       | 0            | 0.1929     | 5,856        | 0            | 24,816       | 0            | 24,816        |
| 11 | 18,479       | 71           | 0.1787     | 5,197        | 0            | 23,676       | 71           | 23,747        |
| 12 | 19,540       | 0            | 0.1831     | 5,360        | 0            | 24,900       | 0            | 24,900        |
| 1  | 18,570       | 0            | 0.1799     | 5,278        | 0            | 23,848       | 0            | 23,848        |
| 2  | 15,760       | 0            | 0.1622     | 4,935        | 0            | 20,695       | 0            | 20,695        |
| 3  | 16,800       | 0            | 0.1637     | 5,391        | 0            | 22,191       | 0            | 22,191        |
| 合計 | 204,308      | 92           | —          | 71,804       | 0            | 276,112      | 92           | 276,204       |
| 平均 | 17,026       | 8            | 0.1802     | 5,984        | 0            | 23,009       | 8            | 23,017        |
| 最大 | 19,540       | 71           | 0.2008     | 8,224        | 0            | 24,900       | 71           | 24,900        |
| 最小 | 15,360       | 0            | 0.1622     | 4,935        | 0            | 20,695       | 0            | 20,695        |

| 月  | 電 力 量        |               |              |               |                                | 灯 油 使 用 量   |            |            | その他                      |
|----|--------------|---------------|--------------|---------------|--------------------------------|-------------|------------|------------|--------------------------|
|    | 光熱水費         | 電 力 使 用 量 合 計 |              |               |                                | 自 家 用 発 電 機 |            |            | 用 水 水 道                  |
|    | 買 電<br>(kWh) | 買 電<br>(kWh)  | 発 電<br>(kWh) | 使用量計<br>(kWh) | 発電使用量の<br>うち試運転分<br>(再掲) (kWh) | 実運転<br>(L)  | 試運転<br>(L) | 合 計<br>(L) | 使用量<br>(m <sup>3</sup> ) |
| 4  | 340          | 21,224        | 0            | 21,224        | 0                              | 0           | 78         | 78         | 0                        |
| 5  | 340          | 22,124        | 0            | 22,124        | 0                              | 0           | 31         | 31         | 0                        |
| 6  | 340          | 22,757        | 0            | 22,757        | 0                              | 0           | 109        | 109        | 0                        |
| 7  | 340          | 24,890        | 0            | 24,890        | 0                              | 0           | 31         | 31         | 1                        |
| 8  | 340          | 24,463        | 21           | 24,484        | 21                             | 0           | 41         | 41         | 0                        |
| 9  | 340          | 22,568        | 0            | 22,568        | 0                              | 0           | 28         | 28         | 0                        |
| 10 | 340          | 25,156        | 0            | 25,156        | 0                              | 0           | 33         | 33         | 1                        |
| 11 | 340          | 24,016        | 71           | 24,087        | 71                             | 0           | 365        | 365        | 0                        |
| 12 | 340          | 25,240        | 0            | 25,240        | 0                              | 0           | 31         | 31         | 0                        |
| 1  | 340          | 24,188        | 0            | 24,188        | 0                              | 0           | 53         | 53         | 0                        |
| 2  | 340          | 21,035        | 0            | 21,035        | 0                              | 0           | 35         | 35         | 0                        |
| 3  | 340          | 22,531        | 0            | 22,531        | 0                              | 0           | 34         | 34         | 0                        |
| 合計 | 4,080        | 280,192       | 92           | 280,284       | 92                             | 0           | 869        | 869        | 2                        |
| 平均 | 340          | 23,349        | 8            | 23,357        | 8                              | 0           | 72         | 72         | 0                        |
| 最大 | 340          | 25,240        | 71           | 25,240        | 71                             | 0           | 365        | 365        | 1                        |
| 最小 | 340          | 21,035        | 0            | 21,035        | 0                              | 0           | 28         | 28         | 0                        |

## 2 決算状況調

## (1) 処理区分別決算内訳

(単位 円)

| 項目     | 管理費  | 水処理費      | 計         | 比率     |
|--------|------|-----------|-----------|--------|
| 職員数    | 0人   | 0人        | 0人        | -      |
| 給料     | 0    | 0         | 0         | 0.0%   |
| 手当等    | 0    | 0         | 0         | 0.0%   |
| 法定福利費  | 0    | 0         | 0         | 0.0%   |
| 人件費計   | 0    | 0         | 0         | 0.0%   |
| 被服費    | 0    | 0         | 0         | 0.0%   |
| 備消耗品費  | 0    | 0         | 0         | 0.0%   |
| 光熱水費   | 0    | 0         | 0         | 0.0%   |
| 印刷製本費  | 0    | 0         | 0         | 0.0%   |
| 通信運搬費  | 0    | -         | 0         | 0.0%   |
| 賃借料    | 0    | 0         | 0         | 0.0%   |
| 手数料    | 0    | -         | 0         | 0.0%   |
| 委託料    | 0    | 0         | 0         | 0.0%   |
| 修繕費    | 0    | 0         | 0         | 0.0%   |
| 動力費    | 0    | 8,847,881 | 8,847,881 | 100.0% |
| 薬品費    | 0    | 0         | 0         | 0.0%   |
| 損害保険料  | 0    | 0         | 0         | 0.0%   |
| 負担金    | 0    | 0         | 0         | 0.0%   |
| 自動車重量税 | 0    | 0         | 0         | 0.0%   |
| 経費計    | 0    | 8,847,881 | 8,847,881 | 100.0% |
| 合計     | 0    | 8,847,881 | 8,847,881 | 100.0% |
| 比率     | 0.0% | 100.0%    | 100.0%    | -      |

## (2) 修繕工事内訳

## 直接修繕

| 場所 | 区分 | 修繕件名 | 金額<br>(千円) | 工期 | 修繕内容 |
|----|----|------|------------|----|------|
|    |    | なし   |            |    |      |
| 計  |    |      | 0          |    |      |

|                       |   |     |      |        |
|-----------------------|---|-----|------|--------|
| 区<br>分<br>別<br>集<br>計 | A | 0 件 | 0 千円 | 建物     |
|                       | B | 0 件 | 0 千円 | 構築物    |
|                       | C | 0 件 | 0 千円 | 機械及び装置 |
|                       | D | 0 件 | 0 千円 | 車両運搬具  |
|                       | E | 0 件 | 0 千円 | 工具及び備品 |

## 請負修繕

(市発注分)

| 場所 | 区分 | 修繕件名 | 金額<br>(千円) | 工期 | 修繕内容 |
|----|----|------|------------|----|------|
|    |    | なし   |            |    |      |
| 計  |    |      | 0          |    |      |

|                       |   |     |      |        |
|-----------------------|---|-----|------|--------|
| 区<br>分<br>別<br>集<br>計 | A | 0 件 | 0 千円 | 建物     |
|                       | B | 0 件 | 0 千円 | 構築物    |
|                       | C | 0 件 | 0 千円 | 機械及び装置 |
|                       | D | 0 件 | 0 千円 | 車両運搬具  |
|                       | E | 0 件 | 0 千円 | 工具及び備品 |

(公社発注分)

| 場所 | 区分 | 修繕件名 | 金額<br>(千円) | 工期 | 修繕内容 |
|----|----|------|------------|----|------|
|    |    | なし   |            |    |      |

|                       |   |     |  |        |
|-----------------------|---|-----|--|--------|
| 区<br>分<br>別<br>集<br>計 | A | 0 件 |  | 建物     |
|                       | B | 0 件 |  | 構築物    |
|                       | C | 0 件 |  | 機械及び装置 |
|                       | D | 0 件 |  | 車両運搬具  |
|                       | E | 0 件 |  | 工具及び備品 |
