令和4年7月1日現在

北海道新幹線（新函館北斗・札幌間）工事進ちょく状況

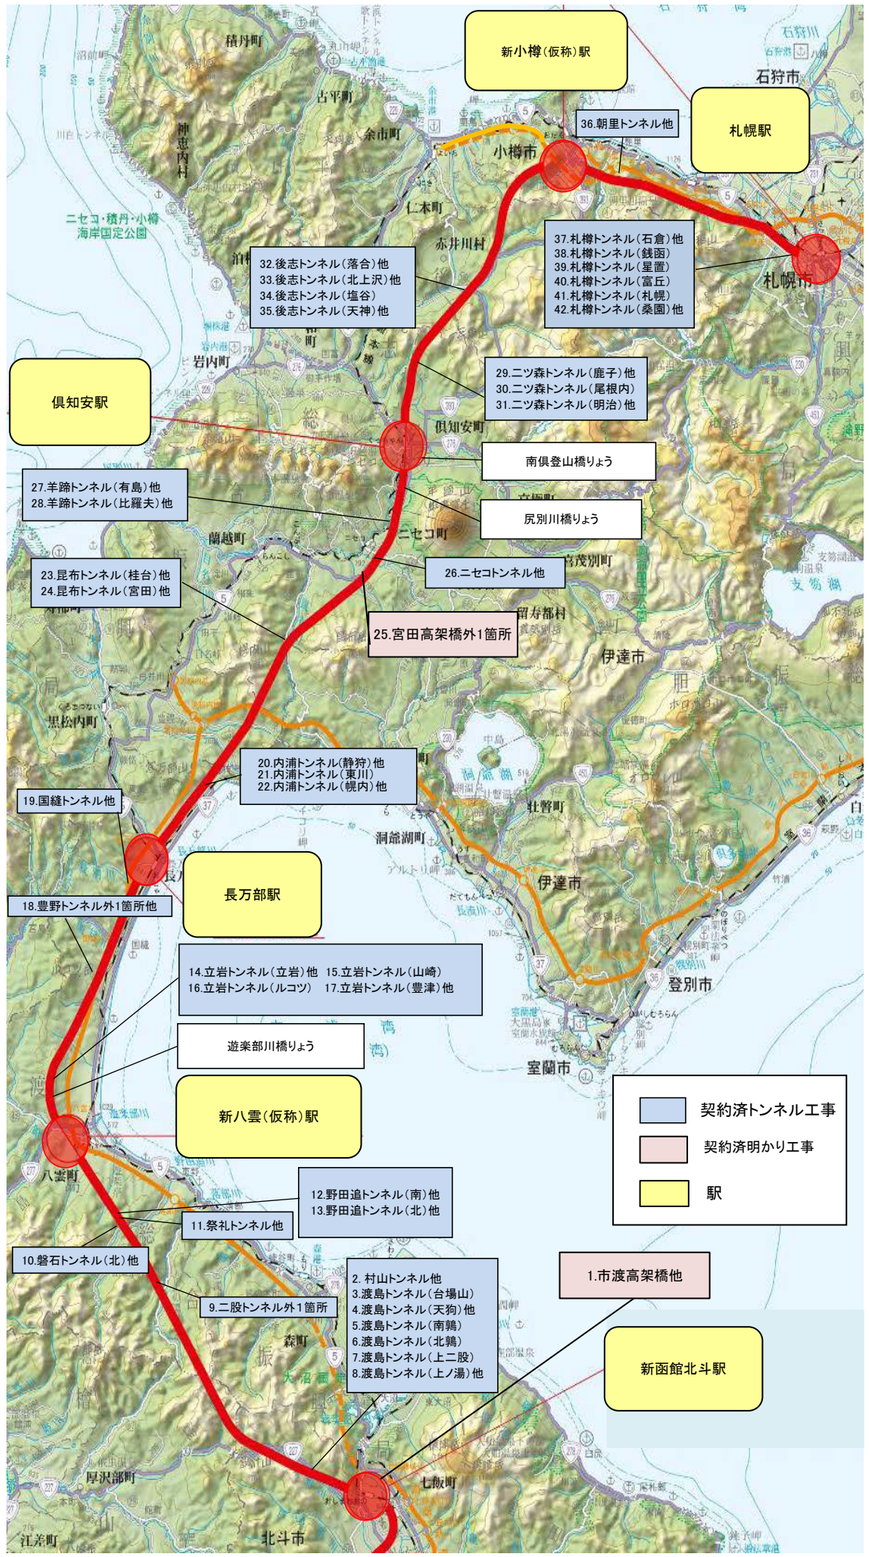

トンネル工事進ちょく状況

No	工区名	トンネル延長	掘削延長	掘削率	覆工	備考
2	村山トンネル他	5,365m	5,365m	100%	5,365m	計画変更により渡島トンネルと一本化
3	渡島トンネル（台場山）	3,500m	1,008m	29%	0m	
4	渡島トンネル（天狗）他	4,600m	2,333m	51%	1,386m	
5	渡島トンネル（南鶉）	4,400m	584m	13%	0m	
6	渡島トンネル（北鶉）	5,000m	3,626m	73%	2,257m	
7	渡島トンネル（上二股）	4,540m	959m	21%	0m	
8	渡島トンネル（上ノ湯）他	5,265m	2,356m	45%	1,178m	
9	二股トンネル外1箇所	3,115m	1,629m	52%	861m	磐石トンネル（南）を含む
10	磐石トンネル（北）他	3,150m	1,177m	37%	0m	
11	祭礼トンネル他	1,980m	1,967m	99%	1,079m	磐石トンネルと一本化 ※3
12	野田追トンネル（南）他	3,675m	3,293m	90%	2,003m	
13	野田追トンネル（北）他	4,490m	3,992m	89%	2,898m	
14	立岩トンネル（立岩）他	5,015m	5,015m	100%	4,292m	
15	立岩トンネル（山崎）	4,960m	2,318m	47%	1,103m	
16	立岩トンネル（ルコツ）	5,000m	4,103m	82%	3,196m	
17	立岩トンネル（豊津）他	2,065m	1,144m	55%	0m	
18	豊野トンネル外1箇所他	2,105m	1,137m	54%	361m	幌内トンネルを含む
19	国縫トンネル他	1,340m	965m	72%	0m	
20	内浦トンネル（静狩）他	5,570m	2,644m	47%	1,584m	
21	内浦トンネル（東川）	5,000m	1,227m	25%	24m	
22	内浦トンネル（幌内）他	5,000m	3,940m	79%	2,517m	
23	昆布トンネル（桂台）他	4,800m	4,800m	100%	4,769m	
24	昆布トンネル（宮田）他	5,710m	5,710m	100%	5,642m	宮田トンネルを含む
26	ニセコトンネル他	2,270m	2,250m	99%	1,509m	※3
27	羊蹄トンネル（有島）他	4,181m	195m	5%	0m	
28	羊蹄トンネル（比羅夫）他	5,569m	3,404m	61%	2,135m	
29	二ツ森トンネル（鹿子）他	4,780m	4,780m	100%	4,748m	
30	二ツ森トンネル（尾根内）	4,615m	2,703m	59%	1,560m	
31	二ツ森トンネル（明治）他	3,255m	26m	1%	0m	
32	後志トンネル（落合）他	4,865m	4,803m	99%	4,136m	
33	後志トンネル（北上沢）他	4,600m	4,600m	100%	4,168m	
34	後志トンネル（塩谷）	4,050m	1,256m	31%	288m	
35	後志トンネル（天神）他	4,460m	1,059m	24%	360m	
36	朝里トンネル他	4,325m	2,961m	68%	1,415m	
37	札樽トンネル（石倉）他	4,504m	702m	16%	0m	
38	札樽トンネル（銭函）	4,000m	0m	0%	0m	斜坑掘削中 24m/397m
39	札樽トンネル（星置）	4,400m	0m	0%	0m	斜坑掘削中 20m/570m
40	札樽トンネル（富丘）	4,500m	0m	0%	0m	斜坑掘削中 557m/900m
41	札樽トンネル（札幌）	8,412m	180m	2%	0m	
42	札樽トンネル（桑園）他	346m	0m	0%	0m	
合　計		168,777m	90,211m	－	60,830m	※1

明かり工事進ちょく状況

No	工区名	延長	備考
1	市渡高架橋他	461m	準備中
25	宮田高架橋外1箇所	1,136m	準備中

進ちょく率

路盤	延長	契約率	掘削率※2
	211.9km	81%	53%

●工事状況

本坑掘削完了	8工区
本坑掘削中	29工区
作業坑掘削中	3工区
準備中	2工区
計	42工区

※1: 単位未満四捨五入のため合計は必ずしも一致しない。
※2: 掘削率はトンネル実延長169,168mに対する掘削済延長の比率
※3: 掘削率が100%未達の理由は、明かり巻き未施工のため。地山部の掘削は完了。

2.村山トンネル他
坑内状況

16.立岩トンネル（ルコツ）
切羽状況

22.内浦トンネル（幌内）他
坑内状況

30.二ツ森トンネル（尾根内）
覆工施工状況

35.後志トンネル（天神）他
FILM状況
