北海道新幹線（新函館北斗・札幌間）工事進ちょく状況

令和5年10月1日現在

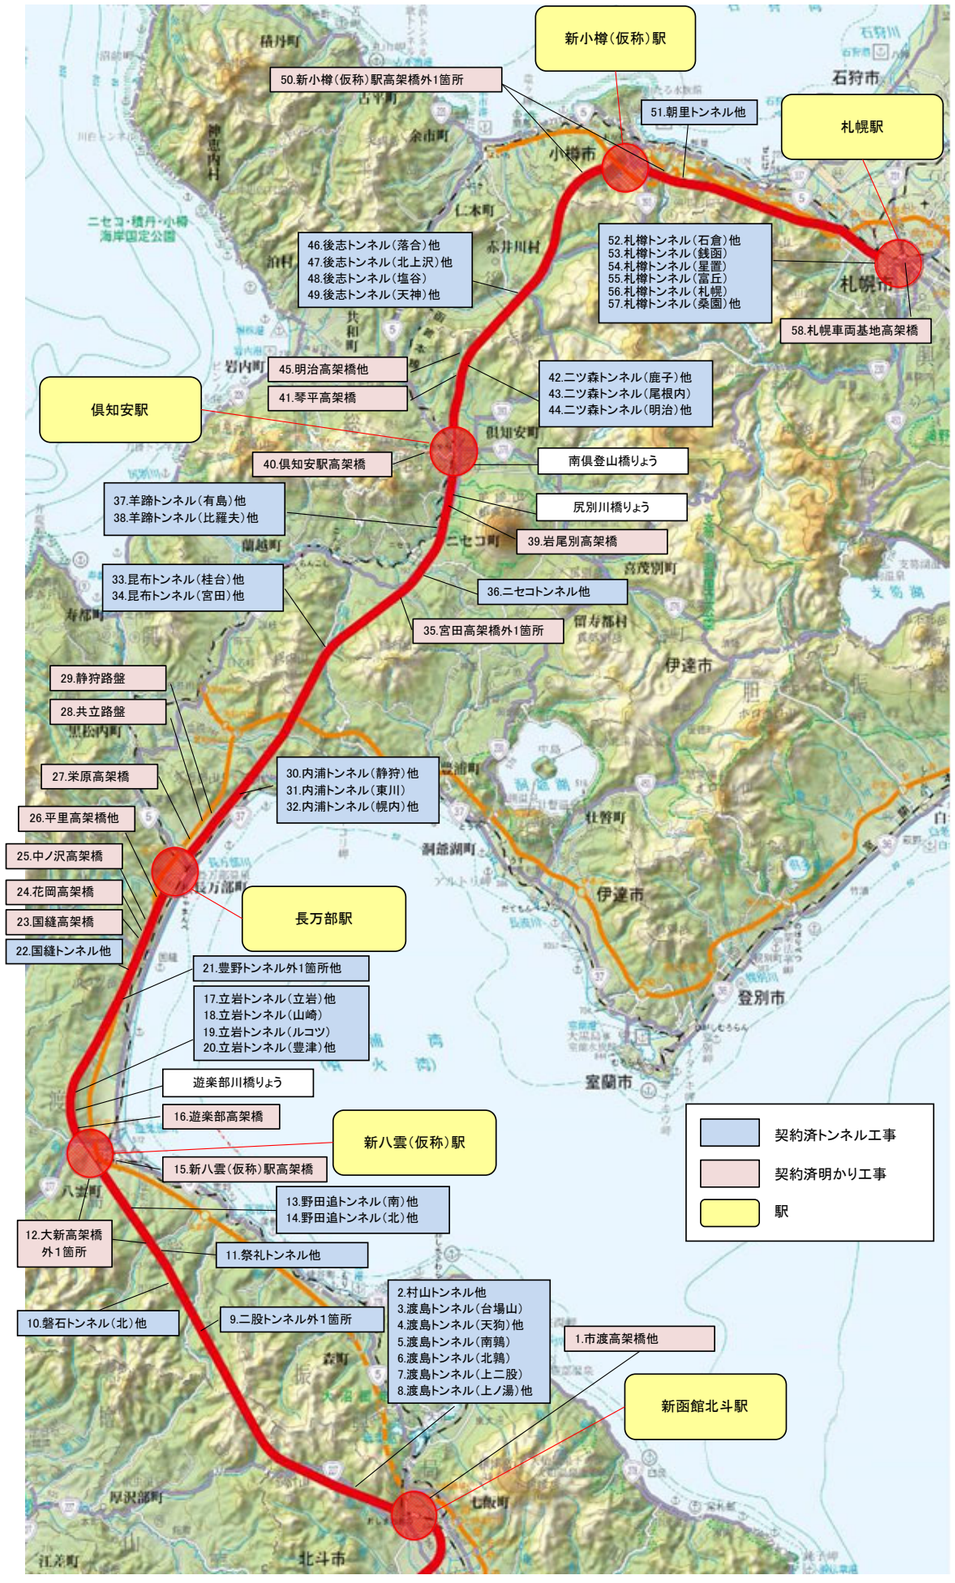

トンネル工事進ちょく状況

No	工区名	トンネル延長	掘削延長	掘削率	覆工	備考
2	村山トンネル他	5,365m	5,365m	100%	5,365m	計画変更により渡島トンネルと一本化
3	渡島トンネル（台場山）	3,500m	1,180m	34%	189m	
4	渡島トンネル（天狗）他	4,600m	3,169m	69%	1,670m	
5	渡島トンネル（南鵜）	4,400m	1,036m	24%	0m	
6	渡島トンネル（北鵜）	5,000m	4,588m	92%	3,385m	
7	渡島トンネル（上二股）	4,540m	2,972m	65%	0m	
8	渡島トンネル（上ノ湯）他	5,310m	3,244m	61%	2,571m	
9	二股トンネル外1箇所	3,100m	2,660m	86%	2,004m	磐石トンネル（南）を含む
10	磐石トンネル（北）他	3,150m	2,451m	78%	1,455m	
11	祭礼トンネル他	1,975m	1,975m	100%	1,836m	磐石トンネルと一本化　※3
13	野田追トンネル（南）他	3,775m	3,676m	97%	2,283m	
14	野田追トンネル（北）他	4,450m	4,067m	91%	3,371m	
17	立岩トンネル（立岩）他	5,015m	5,015m	100%	4,977m	
18	立岩トンネル（山崎）	4,960m	3,970m	80%	2,636m	
19	立岩トンネル（ルコツ）	5,000m	5,000m	100%	4,118m	
20	立岩トンネル（豊津）他	2,065m	1,912m	93%	1,103m	
21	豊野トンネル外1箇所他	2,165m	1,819m	84%	1,149m	幌内トンネルを含む
22	国縫トンネル他	1,340m	1,340m	100%	753m	
30	内浦トンネル（静狩）他	5,570m	3,882m	70%	2,811m	
31	内浦トンネル（東川）	5,000m	2,302m	46%	908m	
32	内浦トンネル（幌内）他	5,000m	5,000m	100%	4,112m	
33	昆布トンネル（桂台）他	4,800m	4,800m	100%	4,769m	
34	昆布トンネル（宮田）他	5,710m	5,710m	100%	5,742m	宮田トンネルを含む
36	ニセコトンネル他	2,250m	2,250m	100%	2,250m	
37	羊蹄トンネル（有島）他	4,166m	1,663m	40%	381m	
38	羊蹄トンネル（比羅夫）他	5,569m	3,404m	61%	2,540m	
42	ニツ森トンネル（鹿子）他	4,780m	4,780m	100%	4,748m	
43	ニツ森トンネル（尾根内）	4,615m	3,556m	77%	2,286m	
44	ニツ森トンネル（明治）他	3,255m	864m	27%	59m	
46	後志トンネル（落合）他	4,865m	4,865m	100%	4,641m	
47	後志トンネル（北上沢）他	4,600m	4,600m	100%	4,543m	
48	後志トンネル（塩谷）	4,050m	2,149m	53%	288m	
49	後志トンネル（天神）他	4,460m	1,997m	45%	1,298m	
51	朝里トンネル他	4,328m	3,746m	87%	2,348m	
52	札樽トンネル（石倉）他	4,506m	1,208m	27%	0m	
53	札樽トンネル（銭函）	4,000m	842m	21%	0m	
54	札樽トンネル（星置）	4,400m	420m	10%	0m	
55	札樽トンネル（富丘）	4,500m	957m	21%	0m	
56	札樽トンネル（札幌）	8,446m	1,429m	17%	0m	
57	札樽トンネル（桑園）他	346m	78m	23%	0m	進ちょく率から求めた換算値
合　計		168,926m	115,938m	－	82,583m	※1

明かり工事進ちょく状況

No	工区名	延長	備考
1	市渡高架橋他	461m	高架橋、橋脚工事中
12	大新高架橋外1箇所	2,883m	高架橋基礎工事中
15	新八雲（仮称）駅高架橋	1,178m	準備中
16	遊楽部高架橋	1,083m	準備中
23	国縫高架橋	2,138m	準備中
24	花岡高架橋	2,639m	準備中
25	中ノ沢高架橋	1,876m	準備中
26	平里高架橋他	1,838m	高架橋基礎工事中
27	栄原高架橋	2,534m	準備中
28	共立路盤	3,921m	準備中
29	静狩路盤	4,390m	準備中
35	宮田高架橋外1箇所	1,136m	高架橋基礎工事中
39	岩尾別高架橋	2,354m	高架橋基礎工事中
40	倶知安駅高架橋	3,160m	高架橋基礎工事中
41	琴平高架橋	3,395m	準備中
45	明治高架橋他	976m	橋脚基礎工事中
50	新小樽（仮称）駅高架橋外1箇所	360m	高架橋基礎工事中
57	札樽トンネル（桑園）他	659m	高架橋基礎工事中
58	札幌車両基地高架橋	1,344m	高架橋基礎工事中

進ちょく率

	延長	契約率	掘削率※2
路盤	211.9km	98%	69%

●工事状況

本坑掘削完了	12工区
本坑掘削中	28工区
明かり工事施工中	9工区
準備中	9工区
計	58工区

※1：単位未満四捨五入のため合計は必ずしも一致しない。
※2：掘削率はトンネル実延長168,926mに対する掘削済延長の比率

1.市渡高架橋他

橋脚工事状況

19.立岩トンネル（ルコツ）

防水工状況

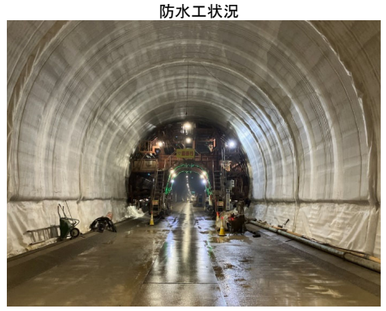

32.内浦トンネル（幌内）他

坑内状況

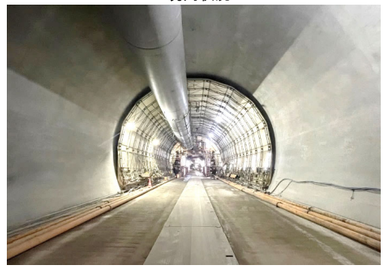

43.ニツ森トンネル（尾根内）

覆工状況

49.後志トンネル（天神）他

覆工状況
