電車事業所改良事業に伴う移設作業等業務 別紙1 移設計画図

2021

（2021.7　仮設工作室・仮設倉庫完成）

①工場先行解体部分から仮設工作室へ工作機械を移設（2021.8予定）
- 空制作業、部品洗浄、溶接作業、100tプレス機、部品折曲機等を移設
- 小型工作機械・資機材を移設

②車庫棟内倉庫等から仮設倉庫等へ資機材を移設（2021.9予定）
- 車庫内倉庫1・2、業務車庫2、倉庫1・2・3を仮設倉庫へ移設

2022

（2022.11　先行建屋完成）

（2022.11　車庫1、工場棟倉庫建屋部分完成）

③仮設工作室および工作機械室から先行建屋1Fへ工作機械等を移設（2022.12予定）
- 仮設工作室から空制作業、溶接作業、100tプレス機、部品折曲機等を移設
- 工作機械室から旋盤4台・フライス盤・直立ボール盤・折曲機等を移設
- 小型工作機械・資機材を移設

④電気作業室から仮設工作室へ工作機械等を移設（③の完了後）
- 電気作業室ボール盤移設、小型工作機械・資機材移設

⑤工場建屋および仮設倉庫から倉庫建屋、その後工場から仮設倉庫へ資機材移設（2022.12予定）
- 工場建屋1・2F倉庫　→　倉庫建屋1・2・3F
- 仮設倉庫　→　倉庫建屋1・2・3F
- 工場（北側・南側）　→　仮設倉庫

2023

（2023.5　既存変電室改修完了）

⑥工場建屋から既存変電室跡へ詰所移設（2023.6予定）
- 工場建屋1F車両保守員室　→　事務所棟1F旧変電室
- 工場建屋2F軌道保守員室・清掃員室・広告員室　→　事務所棟2F旧制御盤室

2024

（2024.11　工場・事務所棟　完成）

⑦仮設工作室から工場・事務所建屋1Fへ工作機械等を移設（2024.11予定）
- 部品洗浄室へ部品洗浄機移設、資機材移設
- 電気作業室へ電気作業室ボール盤移設、小型工作機械・資機材移設

⑧工場・事務所棟へ移設　（2024.12予定）
- 車両保守員室（事務所棟1F旧変電室）→　工場・事務所建屋２F
- 軌道保守員室・清掃員室・広告員室（事務所棟2Fの旧制御盤室）→ 工場・事務所建屋2F
- 仮設倉庫　→　工場
- 電設作業室（軌道作業場1F）→　工場・事務所建屋2Fへ

⑨架線車庫から仮設倉庫へ移設（2025.2予定）

2025

（2025.11　車庫2　完成）

⑩軌道作業棟・仮設倉庫から車庫2へ移設（2025.12予定）
- 軌道作業棟・仮設倉庫　資材　→　車庫2内倉庫
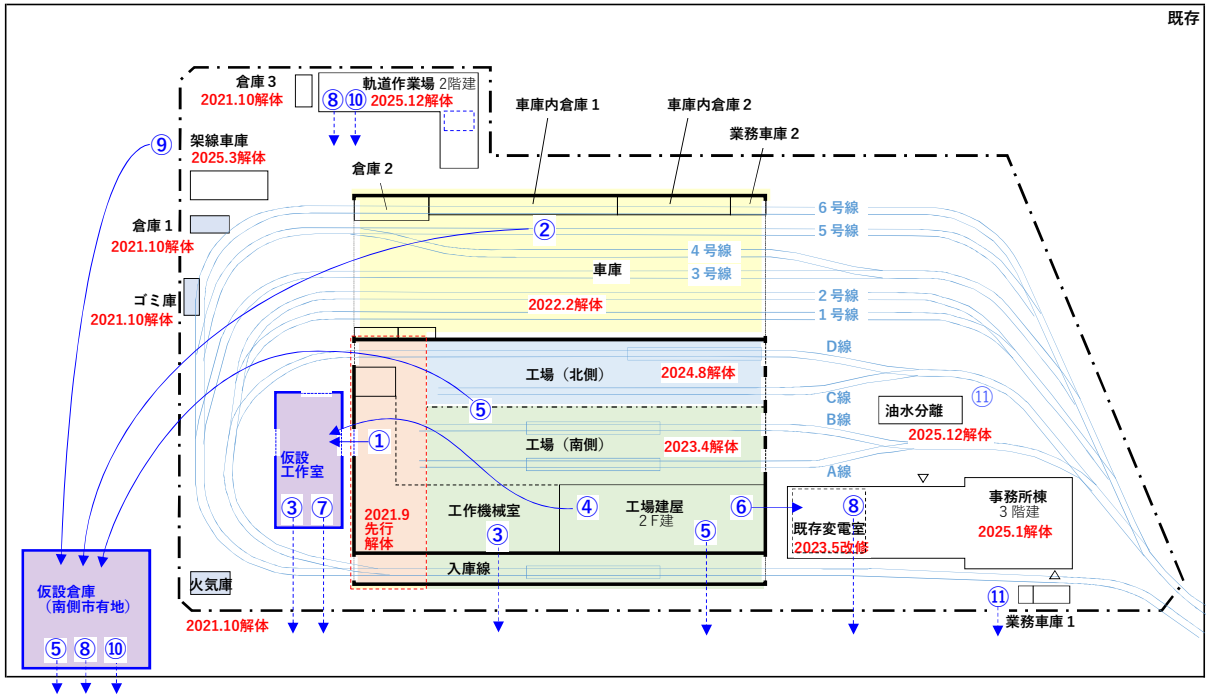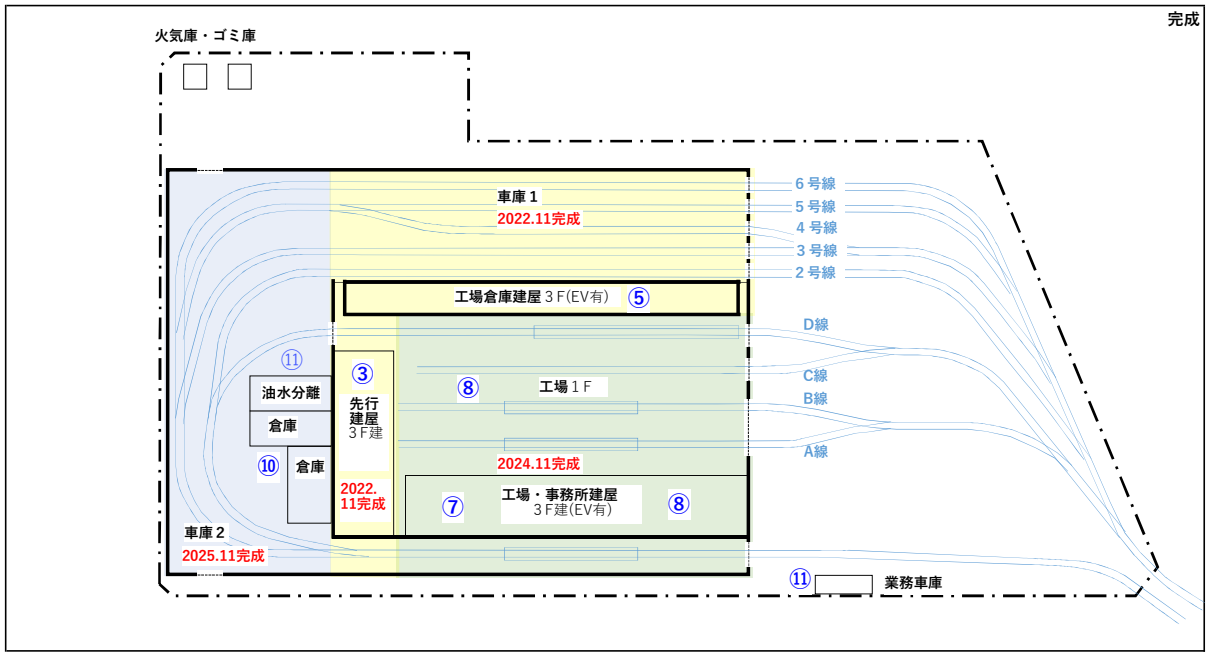
⑪業務車庫・油水分離室移設　（2025.12予定）
