

令和5年度 週休2日試行工事に関するアンケートの結果（協力会社）

- ・ 令和5年度にしゅん功した工事を対象
- ・ 協力会社 6社が回答



【基本情報】

貴社の就業規則で定めている休日について、該当するものを次の中から選択して下さい。		計
1. 完全週休 2 日制		2
2. 4 週 8 休制		1
3. 4 週 6 休制		0
4. 4 週 4 休制		1
5. その他		2
・ 土日祝、創立記念日、年末年始。年間就労カレンダーを作成し取り組んでいる。		


項目	割合
1. 完全週休 2 日制	33%
2. 4 週 8 休制	17%
4. 4 週 4 休制	17%
5. その他	33%


Q1. 元請会社が施工を行った工事はどのような工事でしたか。			
1. 舗装路面改良工事	-	7. 水道工事	-
2. 道路改良工事	-	8. 河川工事	2
3. 載荷盛土工事	-	9. 建築工事	-
4. 橋梁新設工事	1	10. 機械工事	-
5. 橋梁補修工事	-	11. 電気工事	1
6. 下水道工事	1	12. その他（電気通信設備工事）	1

項目	割合
8. 河川工事	33%
4. 橋梁新設工事	16%
6. 下水道工事	17%
11. 電気工事	17%
12. その他	17%

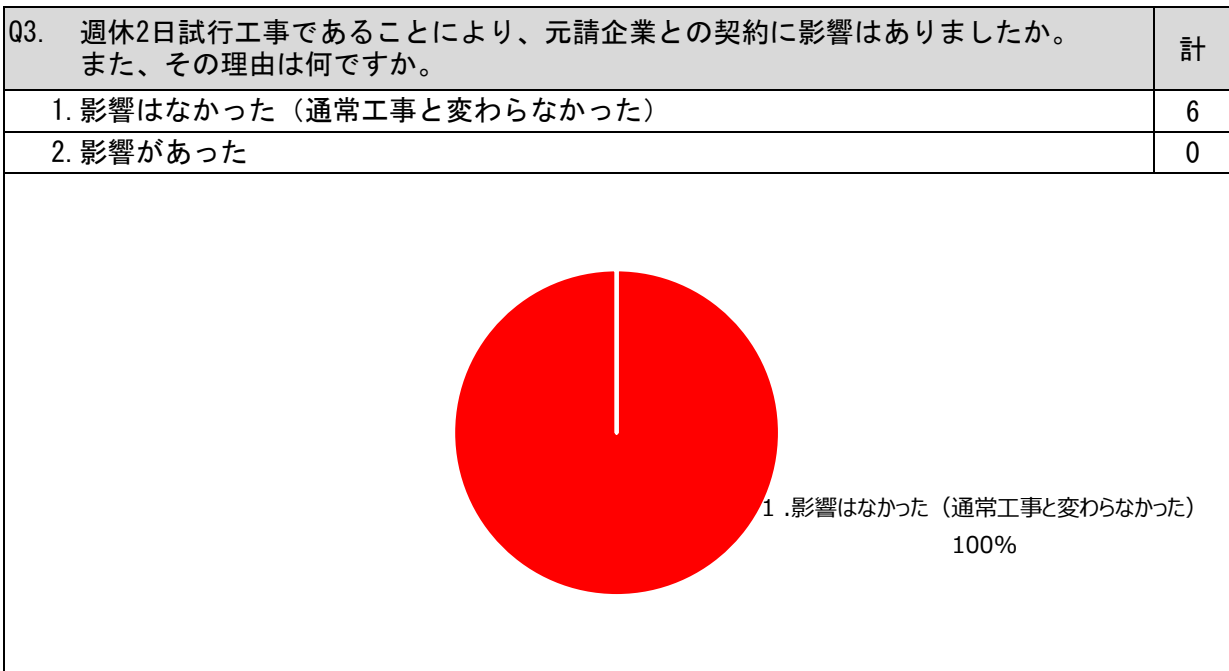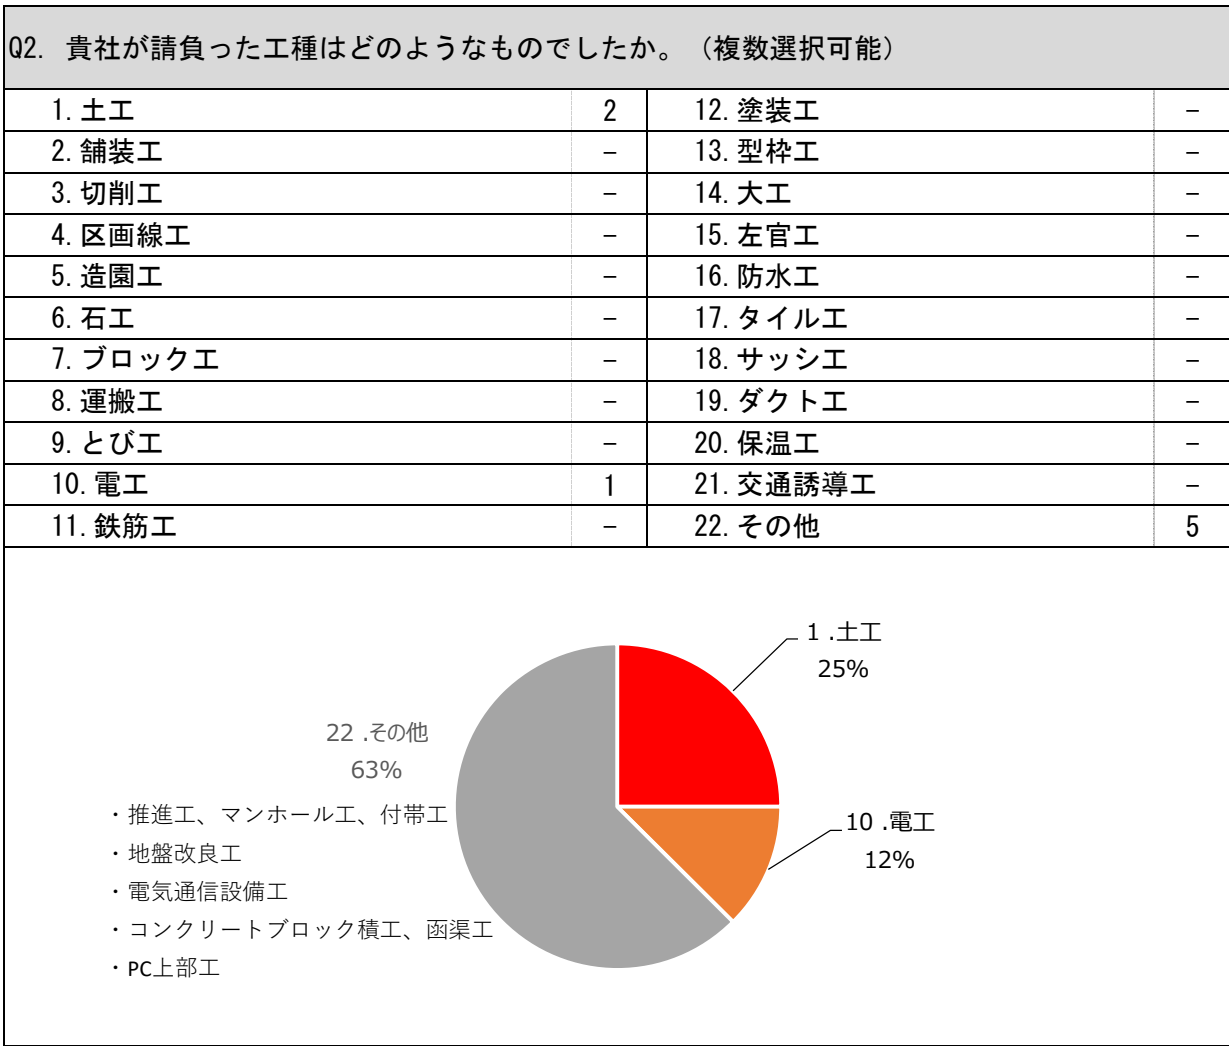

Q4. 週休2日試行工事で4週8休を達成した場合は、元請会社に対し設計変更により請負金額の増額（土木工事の場合：労務費5%・機械経費（賃料）4%・共通仮設費4%・現場管理費5%、営繕工事の場合：労務費5%）を行っています。 昨年の調査では、下請会社から、週休2日で稼働日が減り、その分の収入が減少したとの意見がありましたが、本工事においてはいかがだったでしょうか。	計
1. 一般工事と同じ契約金額のため、休日が増えた分、収入は減った	0
2. 当初契約から週休2日を反映した金額であったため、収入の減少は無かった	3
3. 元請会社が収入減少分を、契約変更で補てんしてくれた	1
4. 元請会社からの補てんはあったが、不足だった	0
5. 従前より週休2日で作業しているため、影響は無かった	2
6. その他	-

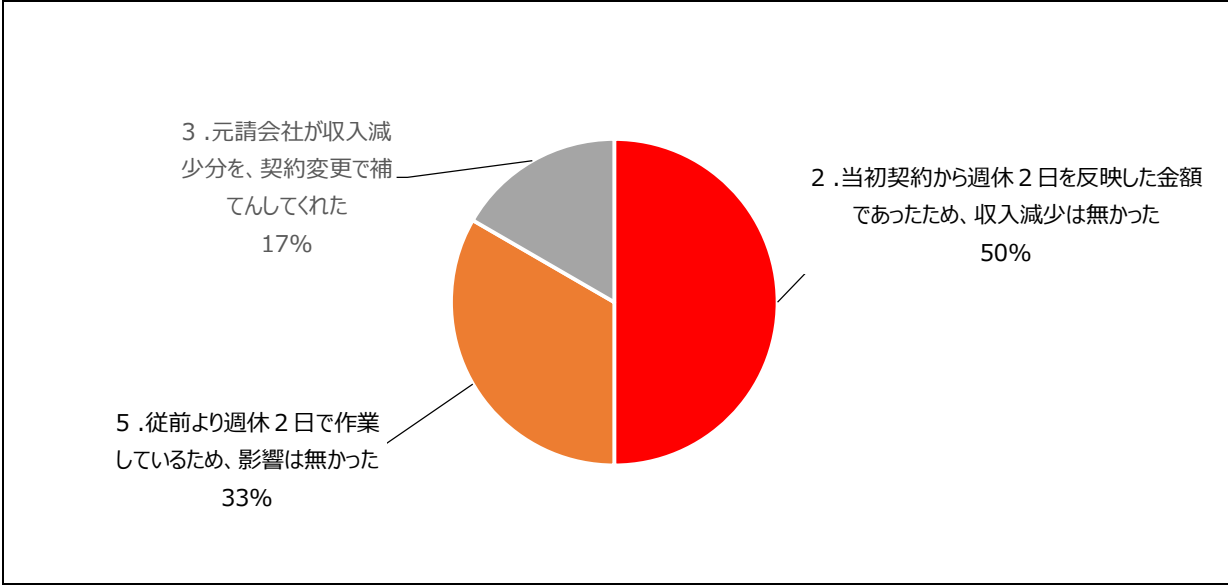

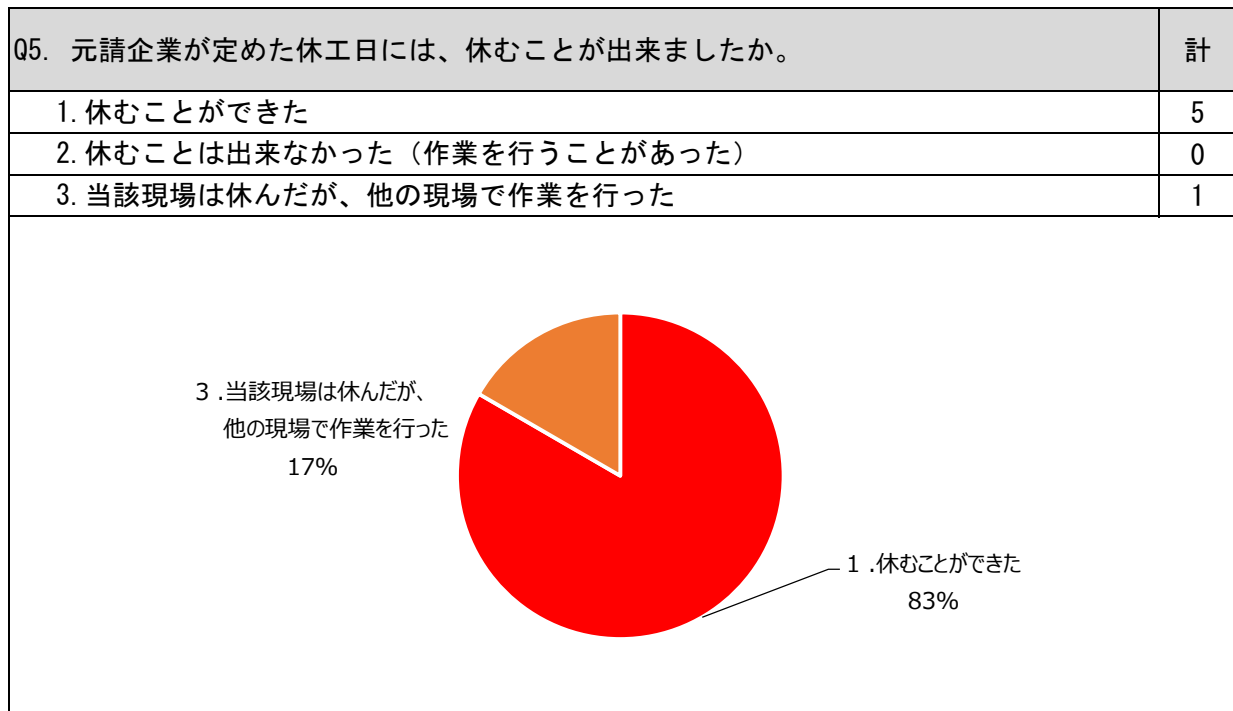

Q6. Q5の回答で「休むことは出来なかった」理由は何ですか。	計
1. 現場養生時の軽微な作業が必要であった	－
2. 現場の保安確認が必要であった	－
3. 休工中の交通誘導が必要であった	－
4. 緊急対応が必要となった	－
5. 引き渡し期限が迫っていた	－
6. その他	－
※ 回答なし	

Q7. 休工予定日に作業を行った日は何日ほどありましたか。
※ 回答なし

Q8. Q5の回答で「当該現場は休んだが、他の現場で作業を行った」理由は何ですか。	計
・ 繁忙期には他現場の施工も行うため（進捗具合にもよる）	1

Q9. 今後どのような工事が試行工事として発注されると、週休2日による施工に取り組みやすい（又は、取り組みにくい）と思いますか。ご意見等があれば記入して下さい。	
■ 取り組みやすい	計
・ 発注時期が早く、工期に余裕がある工事は取り組みやすい	2
・ 工期の終わりが冬期間にかからない工事は取組やすい	1

■ 取り組みにくい	計
・ 土工が多い工事が天候に左右されるため取り組みにくい	3
・ 発注時期の遅い工事は取り組みにくい	1
・ 推進工で距離が長い工事は、推力の問題があるので取り組みにくい	1

Q10. 建設現場に週休2日を導入するうえで、ご意見やご要望等があれば記入して下さい。	計
・ 雨天、降雪の影響がある場合は、余裕のある工期設定して欲しい。	1
・ 他工事（建築）が絡む場合は、その影響（配管・配線に要する時間）を考慮した工期設定をして欲しい。	1
・ 条件変更時は、柔軟な工期変更に対応して欲しい。	1
・ 現在の労務費補正では週休二日時の補填に不足しているため、労務単価等の更なる見直しが必要。	1
