

令和2年(2020年)8月5日付け札幌市告示第4419号の内容に係る訂正について、下記のとおり告示する。

令和2年(2020年)8月21日

札幌市長 秋元克広



記

1 訂正する内容

札幌市告示第4419号別表の工事番号「20(緑)第0045号」工事名「社会資本整備総合交付金事業 平岡公園施設改修工事」にかかる設計図書の一部を下記のとおり訂正し、入札日等を別表のとおり変更する。

2 設計図書の訂正箇所

別紙のとおり

3 担当部局

〒060-8611

札幌市中央区北1条西2丁目

札幌市財政局管財部契約管理課工事契約係

電話011-211-2442

電子入札

0	調達案件番号	2007004511	
1	工事（業務）番号	20（緑）第 0045 号	
2	工事（業務）概要	工事（業務）名	社会資本整備総合交付金事業 平岡公園施設改修工事
		工期（履行期間）	着手の日から令和3年01月21日まで
3		落札結果通知予定日	令和2年09月09日
4	入札及び開札の日 時・場所等	電子入札案件区分	電子入札
		入札期間（年月日）	令和2年08月31日（08時00分～20時00分） 令和2年09月01日（08時00分～17時00分）
		開札予定日時	令和2年09月02日 09時30分
		場所	札幌市中央区北1条西2丁目 札幌市役所本庁舎14階財政局入札室
		提出方法	電子入札システムによること。
5	施行担当課及び 電話番号	施行担当課	建）みどりの推進課
		電話番号	011-211-2525

工事説明書

1. 工事の概要

施工面積 平岡公園 (272m²/663,200m²)

基盤整備 - 敷地造成工 一式、植栽基盤工 一式、構造物撤去工 一式、公園施設等撤去・移設工 一式

植栽 - 植栽工 一式

施設整備 - 給水設備工 一式、雨水排水設備工 一式、汚水排水設備工 一式、電気設備工 一式、園路広場整備工 一

式、サービス施設整備工 一式、管理施設整備工 一式、建築施設組立設置工 一式、仮設工 一式

※建設リサイクル法対象工事

2. 施工場所 清田区平岡4条7丁目ほか

誤

3. 工事の期間 契約書に示す着手の日から令和 3年 1月14日までとする。

4. 図面 別紙のとおり(設計図面25枚)

5. 工事仕様書 ・札幌市造園工事標準図 ・札幌市土木工事共通仕様書 ・札幌市土木工事標準設計図集
・札幌市土木工事積算基準

6. 特記仕様書 別添のとおり。

工事説明書

1. 工事の概要

施工面積 平岡公園 (272m²/663,200m²)

基盤整備 - 敷地造成工 一式、植栽基盤工 一式、構造物撤去工 一式、公園施設等撤去・移設工 一式

植栽 - 植栽工 一式

施設整備 - 給水設備工 一式、雨水排水設備工 一式、汚水排水設備工 一式、電気設備工 一式、園路広場整備工 一

式、サービス施設整備工 一式、管理施設整備工 一式、建築施設組立設置工 一式、仮設工 一式

※建設リサイクル法対象工事

2. 施工場所 清田区平岡4条7丁目ほか

正

3. 工事の期間 契約書に示す着手の日から令和 3年 1月21日までとする。

4. 図面 別紙のとおり(設計図面25枚)

5. 工事仕様書 ・札幌市造園工事標準図 ・札幌市土木工事共通仕様書 ・札幌市土木工事標準設計図集
・札幌市土木工事積算基準

6. 特記仕様書 別添のとおり。

誤

○

16) 工期設定について

工期: 令和2年9月7日から令和3年1月14日まで

工期には施工に必要な実日数(実働日数)以外に、以下の事項を見込んでいる。

○	①準備期間	30日間
○	②後片付け期間	20日間
○	③雨休率(実働工期日数に休日と悪天候により作業ができない日数を見込むための係数 実働日数×係数)	0.7
○	年末年始(12/29~1/3)	6日間


※工期には、雨天・休日等を見込んでいる。なお、休日には、日曜日・祝祭日のほか、作業期間の全土曜日を含んでいる。

□

17) 施工箇所が点在する工事の積算

- (1) 本工事は施工箇所が点在する工事であり、○○地区、△△地区、××地区のように、対象地区(施工箇所)毎に共通仮設費及び現場管理費を算出する工事である。
- (2) 本工事における共通仮設費の金額は、対象地区(施工箇所)毎に算出した共通仮設費を合計した金額とする。また、現場管理費の金額も同様に、対象地区(施工箇所)毎に算出した現場管理費を合計した金額とする。なお、工種区分については、対象地区(施工箇所)毎ではなく工事全体で判断し、対象地区(施工箇所)毎に工種区分を変更しない。
- (3) 共通仮設費率及び現場環境改善費率、現場管理費率の補正(施工地域等)については、対象地区(施工箇所)毎に算出する。

間接費計算の考え方の概要図(対象地区が3箇所の場合)

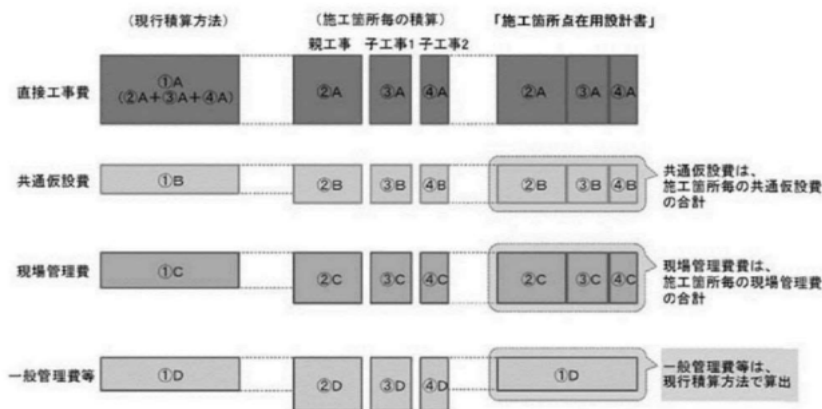

○

18) 1日未満で完了する作業の積算

- (1) 「1日未満で完了する作業の積算」(以下、「1日未満積算基準」と言う。)は、変更積算のみに適用する。
- (2) 受注者は、当初発注時の通常の施工パッケージ型積算基準及び土木工事標準単価(区画線工)と乖離があった場合に、「1日未満積算基準の適用について協議の発議を行うことができる。
- (3) 同一作業員の作業が他工種・細別の作業と組み合わせで1日作業となる場合には、1日未満積算基準は適用しない。
- (4) 受注者は、協議に当たって、1日未満積算基準に該当することを示す書面その他協議に必要な根拠資料(日報、実際の費用がわかる資料等)を監督員に提出すること。実際の費用を示す資料(契約書、請求書等)により、当初発注時の通常の施工パッケージ型積算基準及び土木工事標準単価(区画線工)の積算との乖離が確認できない場合には、「1日未満積算基準」は適用しない。
- (5) 通年の維持管理業務等、人工精算を前提として積算する場合や、通常の積算方法によることが適当と判断される場合には、「1日未満積算基準」を適用しない。

○

16) 工期設定について

工期:令和2年9月14日から令和3年1月21日まで

工期には施工に必要な実日数(実働日数)以外に、以下の事項を見込んでいる。

○	①準備期間	30日間
○	②後片付け期間	20日間
○	③雨休率(実働工期日数に休日と悪天候により作業ができない日数を見込むための係数 実働日数×係数)	0.7
○	年末年始(12/29～1/3)	6日間


※工期には、雨天・休日等を見込んでいる。なお、休日には、日曜日・祝祭日のほか、作業期間の全土曜日を含んでいる。

□

17) 施工箇所が点在する工事の積算

- (1) 本工事は施工箇所が点在する工事であり、○○地区、△△地区、××地区のように、対象地区(施工箇所)毎に共通仮設費及び現場管理費を算出する工事である。
- (2) 本工事における共通仮設費の金額は、対象地区(施工箇所)毎に算出した共通仮設費を合計した金額とする。また、現場管理費の金額も同様に、対象地区(施工箇所)毎に算出した現場管理費を合計した金額とする。なお、工種区分については、対象地区(施工箇所)毎ではなく工事全体で判断し、対象地区(施工箇所)毎に工種区分を変更しない。
- (3) 共通仮設費率及び現場環境改善費率、現場管理費率の補正(施工地域等)については、対象地区(施工箇所)毎に算出する。

間接費計算の考え方の概要図(対象地区が3箇所の場合)

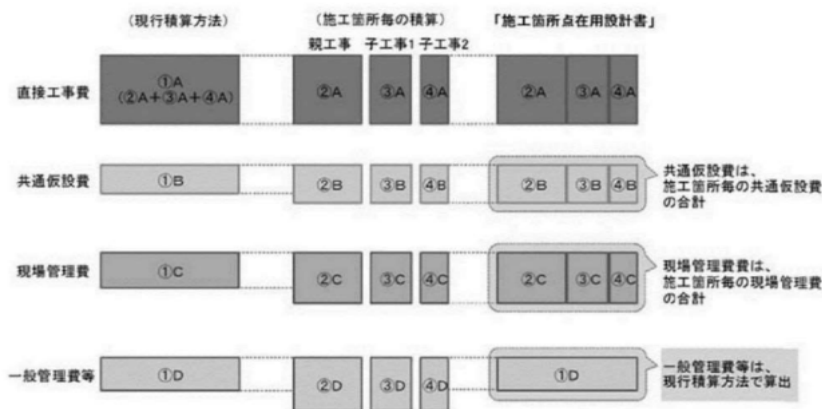

※親工事:施工規模(直接工事費)が最も大きい対象地区(施工箇所)の工事

※子工事:上記以外の対象地区(施工箇所)の工事

※一般管理費等を算出する際の間接工事費率の補正・現場環境改善費等は親工事に準じる。

○

18) 1日未満で完了する作業の積算

- (1) 「1日未満で完了する作業の積算」(以下、「1日未満積算基準」と言う。)は、変更積算のみに適用する。
- (2) 受注者は、当初発注時の通常の施工パッケージ型積算基準及び土木工事標準単価(区画線工)と乖離があった場合に、「1日未満積算基準の適用について協議の発議を行うことができる。
- (3) 同一作業員の作業が他工種・細別の作業と組み合わせで1日作業となる場合には、1日未満積算基準は適用しない。
- (4) 受注者は、協議に当たって、1日未満積算基準に該当することを示す書面その他協議に必要な根拠資料(日報、実際の費用がわかる資料等)を監督員に提出すること。実際の費用を示す資料(契約書、請求書等)により、当初発注時の通常の施工パッケージ型積算基準及び土木工事標準単価(区画線工)の積算との乖離が確認できない場合には、「1日未満積算基準」は適用しない。
- (5) 通年の維持管理業務等、人工精算を前提として積算する場合や、通常の積算方法によることが適当と判断される場合には、「1日未満積算基準」を適用しない。

設計総括表（金抜き）

工事番号	2011110204	工事名	社会資本整備総合交付金事業 平岡公園施設改修工事	当 初	事業区分	公園緑地整備・改修	
					工事区分	施設整備	
工事区分・工種・種別				単位	数量	数量増減	摘要
直接工事費	冬期屋外労務補正：補正なし			式	1		
共通仮設費				式	1		
共通仮設費（率計上）	工種区分：公園工事 施工地域区分：地方部 補正なし			式	1		
純工事費				式	1		誤
現場管理費	率の冬期補正：適用あり（2級地） 施工地域区分：市街地（D I D補正）（2）			式	1		
工事原価				式	1		
一般管理費等	前払金支出割合：保証なし又は3.5%超 契約保証補正：発注者が金銭の保証を必要とする場合			式	1		
工事価格				式	1		
消費税等相当額				式	1		
工事費計				式	1		

設計総括表（金抜き）

工事番号	2011110204	工事名	社会資本整備総合交付金事業 平岡公園施設改修工事	当 初	事業区分	公園緑地整備・改修	
工事区分・工種・種別				単 位	数 量	数 量 増 減	摘 要
直接工事費	冬期屋外労務補正：補正なし			式	1		
共通仮設費				式	1		
共通仮設費（率計上）	工種区分：公園工事 施工地域区分：地方部 補正なし			式	1		
純工事費				式	1		正
現場管理費	率の冬期補正：適用あり（2級地） 施工地域区分：地方部 補正なし			式	1		
工事原価				式	1		
一般管理費等	前払金支出割合：保証なし又は3.5%超 契約保証補正：発注者が金銭的保証を必要とする場合			式	1		
工事価格				式	1		
消費税等相当額				式	1		
工事費計				式	1		
